



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL**

Control Simultaneo en ejecución de obras públicas en la  
Provincia de Yauyos, 2018 - 2021.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Ingeniero Civil

**AUTOR:**

Flores De La Cruz, Russell Alejandro (ORCID: 0000-0003-1572-4178)

**ASESOR:**

Mg. Solar Jara, Miguel Ángel (ORCID: 0000-0002-8661-418x)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Diseño de Infraestructura Vial

LIMA – PERÚ

2021

## **DEDICATORIA**

A ti mi Dios, por siempre escuchar mis ruegos, a mis padres Russell y Mirtha por apostar y siempre creer en mí, a mis hermanas Aracelli y Mirtha por el cariño y el apoyo moral incondicional.

¡Muchas Gracias!

## **AGRADECIMIENTO**

A ti mi Dios, por sobre todas las cosas. A mis padres Russell y Mirtha por ser el pilar fundamental en mi desarrollo personal, a la Universidad César Vallejo por bríndame la oportunidad de mostrar la presente investigación y permitirme avanzar en mi proceso profesional.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Pág.
CARÁTULA	i
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
ÍNDICE DE CONTENIDOS	iv
ÍNDICE DE TABLAS	v
INDICE DE FIGURAS	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	1
<b>II. MARCO TEÓRICO</b>	4
<b>III. METODOLOGÍA</b>	7
3.1. Tipo y diseño de investigación	7
3.2. Variables y operacionalización	7
3.3. Población, criterios de selección, muestra, muestreo, unidad de análisis	7
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	8
3.5. Procedimientos	9
3.6. Métodos de análisis de datos	10
3.7. Aspectos éticos	10
<b>IV. RESULTADOS</b>	11
<b>V. DISCUSIÓN</b>	15
<b>VI. CONCLUSIONES</b>	19
<b>VII. RECOMENDACIONES</b>	20
REFERENCIAS	21
ANEXOS	26

## ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 01: Muestra	8
Tabla 02: Escala de Likert	9
Tabla 03: Porcentaje de Control Simultaneo	15
Tabla 04: Porcentaje resultante de Control Simultaneo	16
Tabla 05: Porcentaje de Control Concurrente	16
Tabla 06: Porcentaje resultante de Control Concurrente	16
Tabla 07: Porcentaje de Orientación de Oficio	17
Tabla 08: Porcentaje resultante de Orientación de Oficio	17
Tabla 09: Porcentaje de Análisis de resultado	17
Tabla 10: Porcentaje resultante del Análisis	18

## ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 01: Resultado General	11
Gráfico 01: Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Comprobar cuál es el impacto de <b>CONTROL SIMULTANEO</b> en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021”.	12
Gráfico 02: Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Identificar cuál es el impacto de <b>CONTROL CONCURRENTE</b> en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021”	13
Gráfico 03: Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Identificar cuál es el impacto de <b>ORIENTACIÓN DE OFICIO</b> en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021”.	14

## RESUMEN

El propósito de este trabajo de investigación es determinar: “Control Simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021”.

Para la aplicación de la presente investigación, se utilizó el estudio descriptivo – no experimental, ya que se trabajó con las variables planteadas en la investigación, empleando una población a seis (6) auditores que ejercen funciones en el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Yauyos, cabe señalar que, para la recolección de datos, se empleó el método de la encuesta y la herramienta del cuestionario.

El análisis dio como resultado, que el servicio de control simultáneo, alcanzó un efecto favorable, dado que las 20 interrogantes descritas en la encuesta, se obtuvo un promedio de 44.17 % de los integrantes del OCI – MPY, marco la alternativa “siempre”, por otro lado, un 50.83 % de los integrantes del OCI – MPY, prefiero la opción “a veces” y solo un 5.00 % de los integrantes del OCI - MPY, eligió la opción “nunca”. En cuanto a la modalidad de control concurrente se evidencio que, el 50.00 % de los integrantes del OCI – MPY, marco la alternativa “siempre”, por otro lado, el 41.30 % de los integrantes del OCI – MPY, marco la alternativa “a veces” y solo el 8.70 % de los integrantes del OCI - MPY, eligió la opción “nunca”. En la modalidad de orientación de oficio se obtuvo que, el 30.29 % de los integrantes del OCI – MPY, marco la alternativa “siempre”, por otro lado, el 62.02 % de los integrantes del OCI – MPY, marco la alternativa “a veces” y solo el 7.69 % de los integrantes del OCI – MPY, eligió la opción “nunca”. Dándonos a conocer el efecto positivo del control simultaneo en todas sus modalidades.

**Palabras Claves:** Control Simultáneo, Control Concurrente, Orientación de Oficio, INFObras.

## ABSTRACT

The purpose of this research work is to determine: "Simultaneous control in the execution of public works in the Province of Yauyos, 2018 - 2021".

For the application of this research, the descriptive study was used - not experimental, since we worked with the variables raised in the research, using a population of six (6) auditors who perform functions in the Institutional Control Body of the Municipality Provincial of Yauyos, it should be noted that, for data collection, the survey method and the questionnaire tool were used.

The analysis resulted in that the simultaneous control service reached a favorable effect, given that the 20 questions described in the survey, an average of 44.17% of the members of the OCI - MPY was obtained, marking the alternative "always", on the other hand, 50.83% of the members of the OCI - MPY preferred the option "sometimes" and only 5.00% of the members of the OCI - MPY chose the option "never". Regarding the concurrent control modality, it was evidenced that, 50.00% of the members of the OCI - MPY, marked the alternative "always", on the other hand, 41.30% of the members of the OCI - MPY, marked the alternative "to times "and only 8.70% of the members of the OCI - MPY chose the option " never ". In the modality of professional orientation, it was obtained that 30.29% of the members of the OCI - MPY, marked the alternative "always", on the other hand, 62.02% of the members of the OCI - MPY, marked the alternative "sometimes "And only 7.69% of the members of the OCI - MPY chose the option " never ". Letting us know the positive effect of simultaneous control in all its modalities.

**Keywords:** Simultaneous Control, Concurrent Control, Job Orientation, INFObras.



## **I. INTRODUCCIÓN**

La importancia de la presente investigación es que sus resultados nos darán a conocer el impacto del “Control Simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021”.

Actualmente, el Gobierno Nacional Peruano, en busca del crecimiento y desarrollo económico viene destinando grandes cantidades de inversión a la realización de obras públicas, con finalidad de beneficiar a la población.

Cabe señalar que, en el lapso de los años se ha podido evidenciar que, a través de los medios de comunicación se informa respecto a la mala elaboración y realización de las obras públicas, a nivel local, regional y nacional, razón suficiente para analizar la correcta ejecución de las obras en los diferentes distritos de la Provincia de Yauyos.

Razón, por lo que se analizará la efectividad del control simultaneo en la modalidad de control concurrente, a una (1) obra de diseño de infraestructura vial, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Yauyos.

En base a lo planteando en la realidad problemática descrita líneas arriba, se estableció como problema general y específico lo que se detalla a continuación:

### **Problema General**

1. ¿Cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021?

### **Problemas Específicos**

1. ¿Cuál es el impacto de Control concurrente en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021?

2. ¿Cuál es el impacto de orientación de oficio en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021?

Lo antes mencionado se justificó de la siguiente manera:

**Justificación. -**

La razón por la cual se lleva a cabo la presente investigación es para corroborar la efectividad del Control Simultaneo en la realización de obras públicas, ya que en la actualidad existe mucha deficiencia en temas técnicos, como se puede evidenciar en distintos medios de comunicación a nivel nacional.

Cabe señalar, que la correcta ejecución de las obras públicas, se debe cumplir con el debido proceso y el cumplimiento de las normas,

Para ello, se desea realizar un estudio que nos permita conocer el porqué de las deficiencias y atrasos en las obras publicas.

En tal sentido, el objetivo general de la investigación quedó enunciado de la siguiente manera:

1. Comprobar cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.

Siendo los objetivos específicos:

1. Identificar cuál es el impacto de Control Concurrente en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.
2. Identificar cuál es el impacto de Orientación de Oficio en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.

Asimismo, para la presente investigación se formuló las siguientes hipótesis:

### **Hipótesis General**

H<sub>1</sub>: A mayor control simultaneo, mayor ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.

### **Hipótesis Específicas**

H<sub>1</sub>: A mayor control concurrente, mayor ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.

H<sub>2</sub>: A mayor Orientación de Oficio, mayor en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.

## **II. MARCO TEÓRICO**

Para realizar esta investigación se analizaron anteriores tesis de investigación, los cuales fueron de mucha ayuda, dado que nos permitió identificar y comprender de manera panorámica nuestras variables planteadas. En ese sentido, se deja constancia de los siguientes trabajos previos:

### **ANTECEDENTES NACIONALES**

**(Huari, 2019), en su tesis “El Control Simultáneo en la ejecución de los proyectos de reconstrucción a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2018”.**

La tesis en mención, trabajo con una muestra total de 20 auditores del OCI - MVCS, operando para la recolección de datos un total de 20 preguntas, 12 preguntas respecto al control concurrente y 8 preguntas con relación a la orientación de oficio. Evidenciando un impacto favorable hacia el control simultáneo en el OCI - MVCS.

**(Ayca, 2018), en su tesis de maestría “El control simultáneo en obras de infraestructura de una Universidad en Lima, 2016”.**

La tesis en mención, comprobó que el control simultáneo es un instrumento importante dado que permite la comunicación de forma oportuna con el Titular de la Entidad, evitando así futuros perjuicios económicos y la correcta culminación de la ejecución de obras públicas.

**(Escudero, 2017), en su tesis de maestría “El Control Simultáneo como Nuevo Enfoque de la Auditoría Gubernamental, en la Gestión de Proyectos de Inversión Pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao”.**

La tesis de la referencia, comprobó que el control simultaneo es un instrumento importante dado que permite potenciar el desempeño de la correcta realización en obras públicas, en todas sus etapas del ciclo de Inversión.

## **ANTECEDENTES INTERNACIONALES**

**(González, 2017), en su tesis de maestría "Control de obra en PYMES de la industria de la construcción".**

La tesis en mención, determinó que el control de obra nos permite cumplir con las metas en los tiempos programadas, la eficiente calidad y cumplir con los requerimientos que fueron diseñados.

**(Valenzuela, 2016), en su tesis "Propuesta de sistema de control de gestión para la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas".**

A través de esta Tesis, se identificó que un adecuado control generaría mayores oportunidades de mejora para potenciar las fortalezas y minimizar debilidades, con relación a las obras a cargo de la DOH.

**(Bassó, 2017), en su tesis "Desarrollo de un Modelo Para el Seguimiento y Control Económico y Temporal Durante la Fase de Ejecución En La Obra Pública. Integration Of Information For Advanced Detection Of Cost Overruns-Imado".**

A través de esta Tesis, se puede afirmar que la aplicación de un control y seguimiento generaría mayor eficiencia para el logro de objetivos en obra pública.

A continuación, se define los conceptos relacionados con la investigación:

### **Definición del Control Simultáneo**

Modalidad de Control que comunica a través de Informes de Control, ya sea Orientaciones de Oficio y Controles concurrentes, las deficiencias que tiene el titular de la entidad respecto al correcto uso de los recursos públicos.

### **Definición del Control Concurrente**

Estas se ejecutan en un plazo máximo de 10 días hábiles, donde se hace de conocimiento al responsable de la entidad, respecto a las deficiencias contrastadas en cualquier fase y etapa del proceso de ejecución.

### **Definición de la Orientación de Oficio**

Estas se ejecutan en un plazo máximo de 5 a 10 días hábiles, donde se hace de conocimiento al responsable de la entidad, respecto a las deficiencias y riesgos verificadas in situ.

### **Definición del Aplicativo INFObras**

Herramienta que permite hacer el seguimiento en tiempo real a todas obras públicas a nivel nacional, regional y local.

### **Definición de Expediente Técnico**

Documento técnico que indica los procedimientos para la correcta realización de una obra.

### III.METODOLOGÍA

#### 3.1. Tipo y diseño de investigación

El análisis es **Tipo Descriptiva**, de acuerdo a: Hernández, Fernández y Batista (2010), señala que: “el análisis descriptivo busca puntualizar un impacto” (p.80). Cabe señalar que, en la presente investigación se utilizó datos de la muestra.

#### **M I**

Dónde:

M : Muestra de Estudio

I : Información que recogemos de la muestra

Por otro lado, cabe indicar que el **Diseño De Investigación** es no experimental, dado “que se efectuó sin manipular las variables” (Hernández, Fernández y Batista, 2010, p.149). Concluyendo que, para la presente investigación no se modificó la variable dependiente e independiente, simplemente se observó y se creó los objetivos y por ultimo las hipótesis.

#### 3.2. Variables de Operacionalización

- Control Simultáneo. (Variable independiente).
- Ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos. (Variable dependiente).

Matriz de Operacionalización de Variables adjunto al **(Anexo 1)**.

#### 3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis

**Población;** grupo de individuos u cosas del cual se pretende conocer algo en una indagación.

En esta investigación, la población la conforma seis (6) integrantes del OCI – MPY.

**Muestra;** señala Gómez (2006) “La muestra representa a la población” (p.111). La muestra estuvo conformada por seis (6) integrantes del OCI – MPY.

**Tabla 1: Muestra**

<b>MUESTRA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>%</b>
Jefe de Órgano de Control Institucional	1	17%
Especialista en Ingeniera I	1	17%
Asistente de Auditoria	2	33%
Técnico Auditor	2	37%
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración Propia

**Muestreo;** para Niño (2011, p.57), es una técnica que le permite al investigador seleccionar la muestra con la intención o de acuerdo al criterio establecido. En ese sentido, la muestra fue conformada por seis (6) integrantes que ejercen funciones en el OCI – MPY, con el fin de verificar cual es el impacto del control simultaneo en la modalidad de control concurrente y orientación de oficio.

**Unidad de análisis;** el grupo de estudio estuvo integrado por personas que laboran en el OCI-MPY, con las mismas características, seleccionados de la población para conformar la muestra.

### **3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

#### **La Técnica de la Encuesta**

Es el procedimiento que se utiliza a través de preguntas a un grupo (García, 2002, p.3). De la aplicación de esta técnica, se pudo tener acceso respecto a la realidad del Control Simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos.



### **El Instrumento de recolección de datos**

Se usó el método del cuestionario. Del cual, mediante las preguntas se pudo diagnosticar el impacto del control simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.

**Tabla 2: Escala de Likert**

<b>Siempre</b>	<b>Avecas</b>	<b>Nunca</b>
3	2	1

Fuente: Elaboración Propia

El método de medición empleado para la solución del cuestionario, corresponde a la escala Likert, donde el valor menor equivale a (3) “Nunca”, el valor medio (2) “A veces” y el valor mayor (1) “Siempre”.

### **3.5. Procedimientos**

1. Se procedió a la verificación de las obras, a través del aplicativo INFObras.
2. Se verifico los contratos de las obras, a través del aplicativo SEACE.
3. Se verifico el estado situacional y financiero de las obras.
4. Se verifico los Informes de Control Concurrente y Orientaciones de Oficio de las obras.
5. Se verifico las situaciones adversas que se comunicaron a las entidades Municipales.
6. Se procedió al estudio y elaboración del cuestionario.
7. Se hizo las coordinaciones para el llenado del cuestionario.
8. Se proceso los datos del cuestionario en el Excel y SPSS.
9. Se evaluó el impacto de variables.
10. Remisión del primer borrador de tesis.
11. Remisión de la Tesis.

### **3.6. Método de análisis de datos**

Esta investigación se realizó en tablas, en cuyo marco se revelaron los resultados utilizando la estadística descriptiva por medio del programa Excel.

Asimismo, se utilizó la media aritmética, que concede la elaboración del puntaje promedio de la muestra de estudio. De igual manera, se empleó la desviación estándar, la cual admite mostrar el nivel en que las referencias numéricas se crecen próximas al monto promedio. De la misma forma, el coeficiente de variabilidad se utilizó para corroborar la homogeneidad del grupo de estudio.

### **3.7. Aspectos éticos**

La investigación se desarrolló de modo transparente, logrando que los resultados obtenidos sean veraces y fiables. Asimismo, se empleó las normas APA y se respetó los derechos de los textos de los cuales se extrajo la información mediante citas bibliográficas.

#### IV. RESULTADOS

Nº	ITEMS	CRITERIOS						TOTAL
		SIEMPRE		A VECES		NUNCA		
		N	%	N	%	N	%	
1	¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones adversas que perjudiquen los objetivos previstos en los proyectos a ejecutar?	5	83.33%	1	16.67%	0	0.00%	100%
2	Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificados situaciones con hechos irreversibles?	0	0.00%	6	100.00%	0	0.00%	100%
3	En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores?	2	33.33%	2	33.33%	2	33.33%	100%
4	¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional?	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	100%
5	¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos?	3	50.00%	3	50.00%	0	0.00%	100%
6	¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes?	5	83.33%	1	16.67%	0	0.00%	100%
7	¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de información solicitados y en los plazos establecidos?	0	0.00%	5	83.33%	1	16.67%	100%
8	De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas señaladas?	0	0.00%	6	100.00%	0	0.00%	100%
9	En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto?	5	83.33%	1	16.67%	0	0.00%	100%
10	¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva?	0	0.00%	4	66.67%	2	33.33%	100%
11	¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos públicos?	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	100%
12	¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos?	3	50.00%	3	50.00%	0	0.00%	100%
13	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos establecidos por la entidad?	1	16.67%	5	83.33%	0	0.00%	100%
14	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos en las Entidades Municipales?	2	33.33%	4	66.67%	0	0.00%	100%
15	¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del presupuesto en los proyectos?	0	0.00%	5	83.33%	1	16.67%	100%
16	Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas?	3	50.00%	3	50.00%	0	0.00%	100%
17	¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al Titular de la entidad para la toma de decisiones?	5	83.33%	1	16.67%	0	0.00%	100%
18	¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la Entidad?	0	0.00%	6	100.00%	0	0.00%	100%
19	De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos?	1	16.67%	5	83.33%	0	0.00%	100%
20	De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han emitido durante el proceso en curso?	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	100%


Figura 01: Resultado General.

## 4.1. CONTROL SIMULTANEO

Del formulario aplicado a seis (6) integrantes del OCI de la Municipalidad Provincial de Yauyos, se ha logrado como resultado que los servicios de control simultaneo tienen un impacto efectivo en la ejecución de obras públicas, dado que de las 20 interrogantes realizados a través del cuestionario se logró un promedio total de 44.17% de los integrantes de la muestra selecciono la opción “siempre”, el 50.83% de los integrantes de la muestra opto por la alternativa “a veces” y solo el 5.00% de los integrantes de la muestra selecciono “nunca”.

Interpretando que el servicio de Control Simultaneo es eficiente.

**Gráfico 01:** Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Comprobar cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021”.

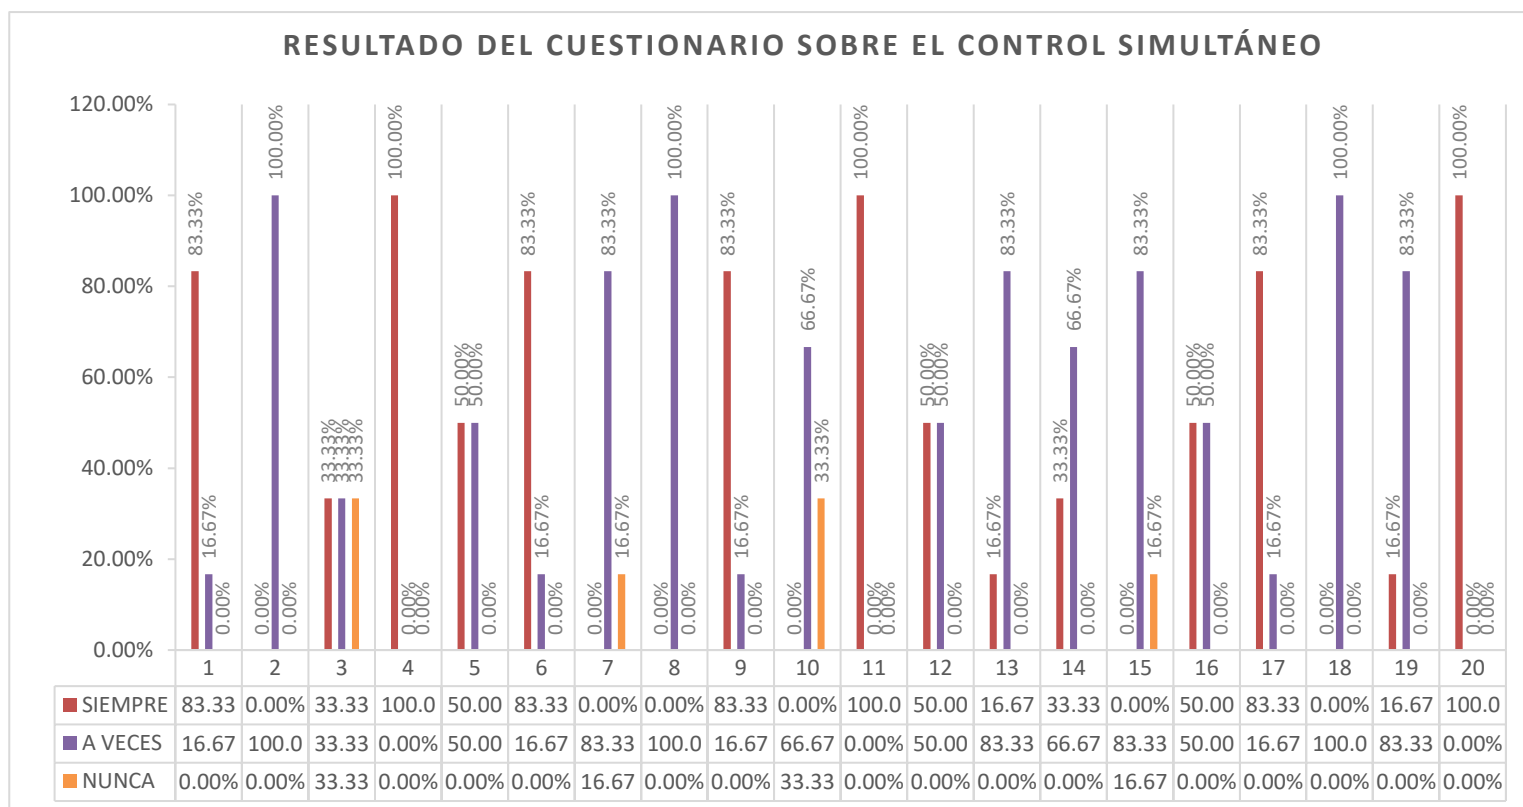


Fuente: Elaboración Propia

## 4.2. CONTROL CONCURRENTE

Del formulario aplicado a seis (6) integrantes del OCI de la Municipalidad Provincial de Yauyos, se ha logrado como resultado que el servicios de control concurrente tiene un impacto efectivo en la ejecución de obras públicas, dado que de las 12 interrogantes, seleccionadas en el cuestionario se logró un promedio total de 50.00% de los integrantes de la muestra selecciono la opción “siempre”, el 41.30% de los integrantes de la muestra opto por la alternativa “a veces” y solo el 8.70% de los integrantes de la muestra selecciono “nunca”.

Interpretando que el servicio de Control Concurrente es eficiente.

**Gráfico 02:** Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Identificar cuál es el impacto de Control Concurrente en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021”

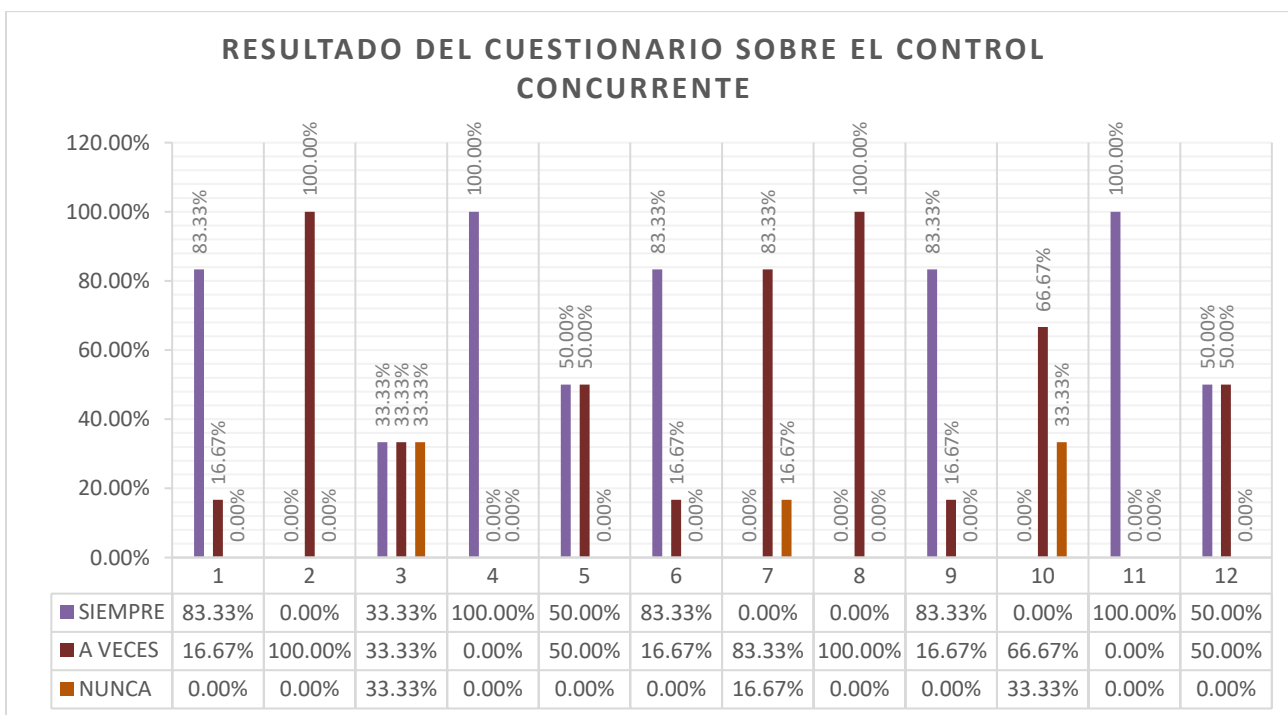


Fuente: Elaboración Propia

### 4.3. ORIENTACIÓN DE OFICIO

Del formulario aplicado a seis (6) integrantes del OCI de la Municipalidad Provincial de Yauyos, se ha logrado como resultado que la orientación de oficio tiene un impacto efectivo en la ejecución de obras públicas, dado que de las 8 interrogantes, seleccionadas en el cuestionario se logró un promedio total de 30.29% de los integrantes de la muestra selecciono la opción “siempre”, el 62.02% de los integrantes de la muestra opto por la alternativa “a veces” y solo el 7.69% de los integrantes de la muestra selecciono “nunca”.

Interpretando que el servicio de Control Concurrente es eficiente.

**Gráfico 03:** Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Identificar cuál es el impacto de Orientación de Oficio en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021”.

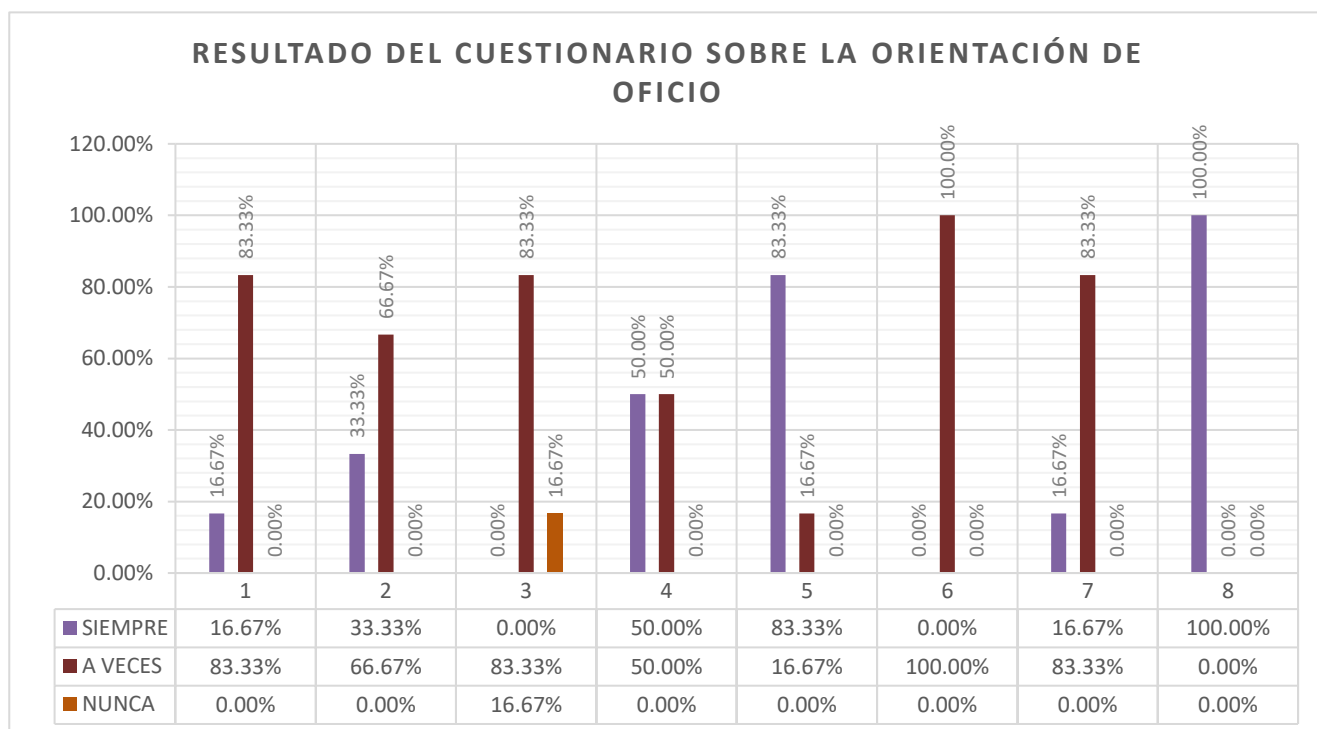

Fuente: Elaboración Propia

## V. DISCUSIÓN

Con la investigación realizada cuyo objetivo general fue comprobar cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021, del cual se realizó un estudio descriptivo – no experimental, asimismo, se utilizó una muestra de seis (6) integrantes del OCI, lo que permitió realizar una discusión de lo siguiente, de acuerdo a los resultados obtenidos e hipótesis planteadas:

### Hipótesis General

**H<sub>1</sub>: A mayor control simultaneo, mayor ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.**

En la investigación de (Huari, 2019), titulada: “El Control Simultáneo en la ejecución de los proyectos de reconstrucción a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2018”.

De acuerdo a sus resultados logrados.

Se concluye que, el Control Simultaneo, obtuvo un impacto favorable, dado que se logro como resultado, lo siguiente:

**Tabla 03: Porcentaje de Control Simultaneo**

% Control Simultaneo		
Siempre	Aveces	Nunca
34.00 %	56 .00%	10.00 %

De la presente investigacion de acuerdo a los resultados logrados se puede confirmar, que la correcta ejecucion del control simultaneo genera resultados eficientes.

**Tabla 04: Porcentaje resultante de Control Simultaneo**

<b>% Control Simultaneo</b>		
Siempre	Aveces	Nunca
44.17 %	50.83 %	5.00%

### **Hipótesis Específicas**

**H<sub>1</sub>: A mayor control concurrente, mayor ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.**

De acuerdo a sus resultados logrados. En la investigación de: **(Huari, 2019).**

Se concluye que, el Control Concurrente, obtuvo un impacto favorable, dado que se logro como resultado, lo siguiente:

**Tabla 05: Porcentaje de Control Concurrente**

<b>% Control Concurrente</b>		
Siempre	Aveces	Nunca
38.00 %	52.00 %	10.00 %

De la presente investigacion de acuerdo a los resultados logrados se puede confirmar, que la correcta ejecucion del control concurrente genera resultados eficientes.

**Tabla 06: Porcentaje resultante de Control Concurrente**

<b>% Control Concurrente</b>		
Siempre	Aveces	Nunca
50.00 %	41.30 %	8.70 %



**H2: A mayor Orientación de Oficio, mayor en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.**

De acuerdo a sus resultados logrados. En la investigación de: **(Huari, 2019).**

Se concluye que, la Orientación de Oficio, obtuvo un impacto favorable, dado que se logro como resultado, lo siguiente:

**Tabla 07: Porcentaje de Orientación de Oficio**

% Orientacion de Oficio		
Siempre	A veces	Nunca
28.00 %	63.00 %	9.00 %

De la presente investigacion de acuerdo a los resultados logrados se puede confirmar, que la correcta ejecucion la orientacion de oficio genera resultados eficientes.

**Tabla 08: Porcentaje resultante de Orientación de Oficio**

% Orientacion de Oficio		
Siempre	A veces	Nunca
30.29 %	62.02 %	7.69 %

Llegando a la conclusion que la investigación de: **(Huari, 2019)**, obtuvo los siguientes resultados:

**Tabla 09: Porcentaje de Análisis de resultado**

% Control Simultaneo			% Control Concurrente			% Orientacion de Oficio		
Siempre	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Nunca
34.00 %	56.00 %	10.00 %	38.00 %	52.00 %	10.00 %	28.00 %	63 .00%	9.00 %

Mientras que nuestra investigación nos arrojo como resultado lo siguientes resultados:

**Tabla 10: Porcentaje resultante del Análisis**

<b>% Control Simultaneo</b>			<b>% Control Concurrente</b>			<b>% Orientación de Oficio</b>		
Siempre	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Nunca	Siempre	A veces	Nunca
44.17 %	50.83 %	5.00 %	50.00 %	41.30 %	8.70 %	30.29 %	62.02 %	7.69 %

Donde se puede confirmar, que la correcta ejecución del Control Simultaneo, generaria mayor eficiencia en la correcta ejecución de obras publicas.

## **VI. CONCLUSIONES**

1. Que, el control simultaneo obtuvo un impacto positivo, dado que la aplicación de éste nos permitió determinar situaciones adversas en diferentes fases y etapas del proceso de ejecución. Asimismo, se logró tener un impacto favorable, ya que se comunica al titular de la entidad de modo pertinente los riesgos suscitados en la ejecución de las obras, con el objetivo de que estas se corrijan en su momento. También se identificó ciertas limitaciones con respecto a la contestación de los requerimientos de información de parte de las entidades, la falta de capacidad operativa que no permite la verificación total de todas las obras en ejecución y cierta demora para la implementación de las situaciones adversas comunicadas.
2. Que, el control concurrente obtuvo un impacto positivo, dado que la aplicación de éste nos permitió determinar situaciones adversas en diferentes fases y etapas del proceso de ejecución. Asimismo, se logró tener un impacto favorable, ya que se comunica al responsable de la entidad de modo pertinente los riesgos suscitados en la ejecución de las obras, con el objetivo de que estas se corrijan en su momento. Cabe señalar que muchas de las situaciones adversas comunicadas al Titular de la entidad son modificados y mejorados.
3. Que la orientación de oficio obtuvo un impacto positivo, dado que la aplicación de éste nos permitió determinar situaciones adversas en diferentes fases y etapas del proceso de ejecución. Asimismo, se logró tener un impacto favorable, ya que se comunica al titular de la entidad de manera oportuna los riesgos suscitados en la ejecución de las obras, con la finalidad de que estas se corrijan en su momento. Cabe señalar que muchas de las situaciones adversas comunicadas al Titular de la entidad, presentan demora para la implementación de las situaciones adversas comunicadas.

## **VII. RECOMENDACIONES**

1. Que, el alcalde en busca del acatamiento de la normativa vigente, designe a un responsable para el seguimiento y la preparación del Plan de Acción, con fines de cumplir las acciones correctivas y anticipadas emitidas en los Informes de Control Simultáneo en cualquiera de sus modalidades.
2. Aumentar el servicio de control concurrente y orientación de oficio, con la finalidad de evidenciar, el debido proceso en temas de contratación, ejecución, recepción y liquidación de las obras, con finalidad de lograr más obras de calidad y no más “elefantes blancos”, protegiendo así, el correcto uso de los fondos públicos.
3. Se recomienda a la Contraloría General de la República, fortalecer a sus Órganos de Control Institucional, con finalidad de poder recabar información en tiempos programados y atender con mayor dinamismo las denuncias arribadas por los ciudadanos.

## REFERENCIAS

- Ayca, H. U. (2018). *Control simultáneo en obras de infraestructura de una Universidad en Lima, 2016*. Tesis, Universidad Cesar Vallejo, Lima. Obtenido de [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/12694/Herrera\\_AHU.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/12694/Herrera_AHU.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Bassó, E. G. (2017). *Desarrollo de un modelo para el seguimiento y control económico y temporal durante la fase de ejecución en le obra pública, integration of information for advanced detection of cost overruns - imado*. Tesis. Obtenido de [https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/550975/tegb\\_20180305.pdf?sequence=5&isAllowed=y](https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/550975/tegb_20180305.pdf?sequence=5&isAllowed=y)
- Escudero, J. A. (2017). *“El Control Simultáneo como Nuevo Enfoque de la Auditoría Gubernamental, en la Gestión de Proyectos de Inversión Pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao”*. Tesis, Universidad Inca Garcilazo de la Vega, Lima. Obtenido de [http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1251/T\\_M\\_CONT\\_MEN\\_CION%20AUDITORIA\\_JAVIER%20AUGUSTO%20VIDAL%20ESCUDERO.pdf?sequence=2&isAllowed=y](http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1251/T_M_CONT_MEN_CION%20AUDITORIA_JAVIER%20AUGUSTO%20VIDAL%20ESCUDERO.pdf?sequence=2&isAllowed=y)
- González, D. (2017). *Control de obra en PYMES de la industria de la construcción*. Tesis , Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey Nuevo León. Obtenido de <https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/630024/TESIS%20-%20Control%20de%20obra%20en%20PYMES%20de%20la%20industria%20de%20la%20construcci%C3%B3n.pdf?sequence=1>
- Hernández, Fernànde , & Batista . (2010). *Asignatura de la Investigaciòn*. Obtenido de [https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI\\_Lectura/bachillerato/documentos/LEC7.2.pdf](https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/bachillerato/documentos/LEC7.2.pdf)
- Hernández, Fernànde , & Batista. (2010). *Asignatura de Investigaciòn*. Obtenido de [https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI\\_Lectura/bachillerato/documentos/LEC7.2.pdf](https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/bachillerato/documentos/LEC7.2.pdf)
- Huari, J. J. (2019). *“El Control Simultáneo en la ejecución de los proyectos de reconstrucción a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2018”*. Tesis , Universidad Tecnología del Perú, Lima. Obtenido de [https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/2425/Javier%20Perez\\_Tesis\\_Titulo%20Profesional\\_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/2425/Javier%20Perez_Tesis_Titulo%20Profesional_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y)

La Contraloría general de la República. (2017). *DIRECTIVA N° 005-2017-CG/DPROCAL*.  
Obtenido de [http://doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/RC\\_285\\_2006\\_CG.pdf](http://doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/RC_285_2006_CG.pdf)

La Contraloría general de la República. (2019). *Obras Públicas*. Lima. Obtenido de  
[https://doc.contraloria.gob.pe/PACK\\_anticorrupcion/documentos/7\\_OBRAS\\_PUBLICAS\\_2019.pdf](https://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/7_OBRAS_PUBLICAS_2019.pdf)

Mas, F. M. (s.f.). *La liquidación de la obra*. Obtenido de <https://vlex.es/vid/liquidacion-obra-190797>

Perù, L. c. (s.f.). *Control Gubernamental*. Obtenido de  
[https://doc.contraloria.gob.pe/PACK\\_anticorrupcion/documentos/2\\_SERVICIOS%20Y%20HERRAMIENTAS%20DEL%20CONTROL%20GUBERNAMENTAL\\_2019.pdf](https://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/2_SERVICIOS%20Y%20HERRAMIENTAS%20DEL%20CONTROL%20GUBERNAMENTAL_2019.pdf)

Perù, L. c. (s.f.). *Control Gubernamental*. Obtenido de  
[https://doc.contraloria.gob.pe/PACK\\_anticorrupcion/documentos/2\\_SERVICIOS%20Y%20HERRAMIENTAS%20DEL%20CONTROL%20GUBERNAMENTAL\\_2019.pdf](https://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/2_SERVICIOS%20Y%20HERRAMIENTAS%20DEL%20CONTROL%20GUBERNAMENTAL_2019.pdf)

Peruano, D. O. (31 de mayo de 2019). Obtenido de  
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-las-normas-generales-de-control-gubernamental-y-ap-resolucion-no-115-2019-cg-1755413-1/>

Peruano, D. O. (2021). *Modifican la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG*. Lima.  
Obtenido de <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-002-2019-cgnorm-servicio-de-cont-resolucion-n-144-2020-cg-1866796-1/>

Peruano, P. D. (s.f.). *En qué consiste la recepción de una obra*. Lima. Obtenido de  
<https://www.gob.pe/12301-en-que-consiste-la-recepcion-de-una-obra>

Republica, C. G. (2020). *Informe de control concurrente n.º 244-2020-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 3 – Valorización n.º 3 de obra y expediente de adicional con deductivo vinculante n.º 1*. Obtenido de  
[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CSIC82300042&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300042&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)

República, C. G. (s.f.). *INFOBRAS - RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA*. Obtenido de  
[https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm\\_obras\\_mostrar\\_1.aspx?ID=Zemnf](https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zemnf)

República, I. -C. (s.f.). *Preguntas frecuentes INFObras*. Obtenido de  
<https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/help/PreguntasFrecuentes.pdf>

República, L. C. (2015). *PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL* . Lima. Obtenido de  
[http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/PREGUNTAS\\_FRECUENTES\\_2015.pdf](http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/PREGUNTAS_FRECUENTES_2015.pdf)

República, L. c. (2019). *INFOBRAS - MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA*. Obtenido de  
[https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm\\_obras\\_mostrar\\_1.aspx?ID=Zhkfh](https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zhkfh)

República, L. c. (2019). *INFOBRAS - RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA YA EN LA LOCALIDAD DE HUANCA YA, DISTRITO DE HUANCA YA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA*. Obtenido de  
[https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm\\_obras\\_mostrar\\_1.aspx?ID=Zhkji](https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zhkji)

República, L. c. (2019). *INFOBRAS - RENOVACIÓN DE PISTAS EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA* . Obtenido de  
[https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm\\_obras\\_mostrar\\_1.aspx?ID=Zemni](https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zemni)

República, L. c. (2019). *Informe de control concurrente n.º 018-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 1 – Primera Valorización*. Obtenido de  
[http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500018&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500018&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)

República, L. c. (2019). *Informe de control concurrente n.º 027-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 1 – Valorización*. Obtenido de  
[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500079&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500079&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)

República, L. c. (2019). *Informe de control concurrente n.º 027-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 1 – Valorización*. Obtenido de  
[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500079&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500079&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)

República, L. c. (2019). *Informe de control concurrente n.º 029-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 2 – Valorización*. Obtenido de

- [https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500081&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500081&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)
- República, L. c. (2019). *Informe de control concurrente n.º 031-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 2 – Valorización*. Obtenido de [https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500083&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500083&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)
- República, L. c. (2019). *Informe de control concurrente n.º 5936-2019-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 2 – Ejecución contractual al 9 de diciembre de 2019*. Obtenido de [https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CSIC82300009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)
- República, L. c. (2019). *Informe de control concurrente n.º 616-2019-CG/GRLP-CC, Hito de control n.º 1 – Actos Previos a Inicio de Obra*. Obtenido de [https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSIC82300031&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSIC82300031&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)
- República, L. c. (2019). *Informe de Orientación de Oficio n.º 4578-2019-CG/DEN-SOO - Seguimiento al registro y publicación del estado de avance de las obras en el sistema INFObras*. Obtenido de [https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2021CSIL53001140&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53001140&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)
- República, L. c. (2019). *Informe de Orientación de Oficio n.º 5528-2019-CG/DEN-SOO - Seguimiento al registro y publicación del estado de avance de las obras en el sistema INFObras*. Obtenido de [https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)
- República, L. c. (2019). *Informe de Orientación de Oficio n.º 5528-2019-CG/DEN-SOO – Seguimiento al registro y publicación del estado de avance de las obras en el sistema INFObras*. Obtenido de [https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)
- República, L. c. (2019). *Informe n.º 025-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 1 – Valorización n.º 5 y suspensión del plazo de ejecución*. Obtenido de [https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500081&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500081&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)



9CSI043500077&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

República, L. c. (2019). *Informe n.º 030-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 2 – Valorización n.º 6 de Supervisión y expediente adicional de obra n.º 1 y deductivo de obra n.º 1*. Obtenido de

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500082&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500082&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)

República, L. c. (2020). *Informe de control concurrente n.º 7201-2020-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 4 – Ampliación excepcional de plazo, cuantificación de costos y valorización de agosto del 2020*. Obtenido de

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CSIC82300201&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300201&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)

República, L. c. (2020). *Informe n.º 005-2020-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 3 – Recepción de obra*. Obtenido de

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CSI043500006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSI043500006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)

República, L. c. (2021). *Informe de control concurrente n.º 10297-2021-CG/GRLP-SCC, Recepción de obra y liquidación de contrato*. Obtenido de

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2021CSIC82300093&TIPOARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIC82300093&TIPOARCHIVO=ADJUNTO)

Rivera, H. M. (s.f.). *Diseño Experimental*. Obtenido de

[http://red.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000352/html/un1/cont\\_102-02.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20una%20investigaci%C3%B3n%20no,la%20intervenci%C3%B3n%20directa%20del%20investigador.](http://red.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000352/html/un1/cont_102-02.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20una%20investigaci%C3%B3n%20no,la%20intervenci%C3%B3n%20directa%20del%20investigador.)

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, L. d. (2018). Obtenido de

<https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0022/tuo-ley-30225.pdf>

Valenzuela, X. A. (2016). *PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS*. Tesis, Universidad de Chile, Santiago - Chile. Obtenido de <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144375/Si%c3%b1iga%20Valenzuela%20Ximena.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

## ANEXOS

### Anexo 1: Matriz de Operacionalización de Variables

Variable	Dimensión	Indicadores de logro	PESO	ITEMS	Nº	ITEMS	CRITERIO DE EVALUACION
Control Simultáneo	Control Concurrente	Reconoce riesgos y deficiencias	60%	12	1	¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones adversas que perjudiquen los objetivos previstos en los proyectos a ejecutar?	SIEMPRE A VECES NUNCA
					2	Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificados situaciones con hechos irreversibles?	
		Planifica intervenciones y procedimientos.			3	En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores?	
		Determina si la cantidad de inspecciones e intervenciones es la adecuada.			4	¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional?	
					5	¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos?	
					6	¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes?	
		Informa, implementa y corrige situaciones adversas			7	¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de información solicitados y en los plazos establecidos?	
					8	De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas señaladas?	
		Favorece a la supervisión y operatividad			9	En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto?	
					10	¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva?	
		Facilita la eficiente utilización de recursos, mediante el cumplimiento de plazos establecidos			11	¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos públicos?	
					12	¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos?	
	Orientación de Oficio	Favorece el cumplimiento de objetivos, a través de la utilización de recursos y la ejecución presupuestal.	40%	8	1	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos establecidos por la entidad?	
					2	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos en las Entidades Municipales?	
					3	¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del presupuesto en los proyectos?	
					4	Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas?	
		Comunica responsabilidades al titular de la entidad para que ejecute acciones pertinentes			5	¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al Titular de la entidad para la toma de decisiones?	
					6	¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la Entidad?	
		Evalúa y corrige riesgos, que se detectan en el proceso en curso del control			7	De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos?	
					8	De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han emitido durante el proceso en curso?	

## Anexo 2: Matriz de Consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES E INDICADORES			METODOLOGÍA		
<p><b>General</b></p> <p>¿Cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021?</p>	<p><b>General</b></p> <p>Comprobar cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.</p>	<p><b>General</b></p> <p>H1: A mayor control simultaneo, mayor ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.</p>	Variable independiente: Control Simultáneo			<p>DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental</p> <p>MÉTODO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo</p> <p>POBLACIÓN Y MUESTRA: 6 integrantes del OCI - MPY</p> <p>TÉCNICA E INSTRUMENTO: Encuesta - Cuestionario</p>		
<p><b>Específicos</b></p> <p>¿Cuál es el impacto de Control concurrente en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021?</p>	<p><b>Específicos</b></p> <p>Identificar cuál es el impacto de Control Concurrente en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.</p>	<p><b>Específicos</b></p> <p>H1: A mayor control concurrente, mayor ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.</p>	Control Concurrente	<b>Dimensiones</b>	<b>Indicadores</b>		<b>Ítems</b>	
							Reconoce riesgos y deficiencias	
							Planifica intervenciones y procedimientos.	
							Determina si la cantidad de inspecciones e intervenciones es la adecuada	
							Informa, implementa y corrige situaciones adversas	
							Favorece a la supervisión y operatividad	
<p>¿Cuál es el impacto de orientación de oficio en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021?</p>	<p>Identificar cuál es el impacto de Orientación de Oficio en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.</p>	<p>H2: A mayor Orientación de Oficio, mayor en ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.</p>	Orientación de Oficio		Favorece la eficiente utilización de recursos, mediante el cumplimiento de plazos establecidos			
					Favorece el cumplimiento de objetivos, a través de la utilización de recursos y la ejecución presupuestal.			
					Comunica responsabilidades al titular de la entidad para que ejecute acciones pertinentes			
					Evalúa y corrige riesgos, que se detectan en el proceso en curso del control			
			Variable dependiente: Ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021.					

### Anexo 3: Descripción de los proyectos en ejecución

En los siguientes cuadros se detallará los hitos de control efectuados y los informes resultados de la evaluación:

#### Proyectos en Ejecución por Distrito Detallado

N°	SNIP N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PERIODO DE EJECUCIÓN	MONTO DEL CONTRATADO S/
1	90783	RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	180 días calendarios	3,917,742.82
2	93505	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	120 días calendarios	1,015,636.97
3	90786	RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUOCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	45 días calendarios	343,365.58
4	93546	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	90 días calendarios	897,265.42
<b>MONTO TOTAL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b>				<b>6,174,010.79</b>

Fuente: Elaboración Propia

#### Proyectos con Servicios de Control Simultaneó en la Modalidad de Control Concurrente

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	INFORMES PROGRAMADOS	INFORMES EJECUTADOS	INFORMES EFECTUADOS	A CARGO
RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	5	4	Informe n.º 616-2019-CG/GRLP-CC	Gerencia regional de Lima Provincias
			Informe n.º 5936-2019-CG/GRLP-SCC	
			Informe n.º 244-2020-CG/GRLP-SCC	
			Informe n.º 7201-2020-CG/GRLP-SCC	
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	3	2	Informe n.º 027-2019-OCI/0435-SCC	OCI - MPY
			Informe n.º 031-2019-OCI/0435-SCC	
RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUOCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	3	3	Informe n.º 018-2019-OCI/0435-SCC	OCI - MPY
			Informe n.º 029-2019-OCI/0435-SCC	
			Informe n.º 005-2020-OCI/0435-SCC	
RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	3	2	Informe n.º 025-2019-OCI/0435-SCC	OCI - MPY
			Informe n.º 030-2019-OCI/0435-SCC	

Fuente: Elaboración Propia

**Proyectos con Servicios de Control Simultaneó en la Modalidad de Orientación de Oficio**

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	INFORMES EJECUTADOS	INFORMES EFECTUADOS	A CARGO
RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	1	Informe n.º 5528-2019- CG/DEN-SOO	Sub gerencia de Denuncias
RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	1	Informe n.º 5528-2019- CG/DEN-SOO	Sub gerencia de Denuncias
RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	1	Informe n.º 4578-2019- CG/DEN-SOO	Sub gerencia de Denuncias

**Fuente:** Elaboración Propia

## Caso N°1: Control Concurrente

De acuerdo a línea de investigación con relación al Diseño de infraestructura Vial, se utilizó la información de una (1) obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de Yauyos, del cual se analizará la efectividad del control simultaneo en su modalidad de control concurrente al proyecto **“RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA”**. Evidenciando que esté cuenta con un total de 5 hitos de control y 18 situaciones adversas comunicados a la entidad.

Denominación del Hito de Control	Periodo de Ejecución del Hito	Producto Obtenido	Situación Adversa	Hecho	Afectación
Hito de control N° 01 - Actos previos a inicio de obra	Del 15 de febrero al 25 de febrero de 2019	INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 616-2019-CG/GRLP-CC	La entidad ha perfeccionado el contrato con el contratista encargado de la ejecución de la obra sin haber iniciado el proceso de selección para la supervisión de la misma, generando el riesgo de incumplimiento de plazo y mayores gastos generales	Incumplimiento de contrato de ejecución de obra	Calidad y Costo de la Obra
			La entidad ha proyectado la ejecución de una obra de saneamiento, la misma que se encontraría superpuesta a la obra de la Av. Circunvalación generando el riesgo de incumplimiento de plazos	Incumplimiento de contrato de servicio como supervisor de obra	Calidad y Costo de la Obra
			Valor referencial de la obra es inconsistente por deficiencias en el cálculo de metrados y costos unitarios del expediente técnico, lo que afectaría la calidad y el uso eficiente de los recursos	Deficiente cálculo de metrados y costos unitarios	Costo de la Obra
Hito de control N° 2 - Ejecución contractual al 9 de diciembre de 2019	Del 22 de noviembre de 2019 al 09 de diciembre de 2019	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 5936-2019-CG/GRLP-CC	Las valorizaciones presentan metrados sobrevalorados debido a que no se está cuantificando según el avance de obra, generando el riesgo de afectar la correcta administración de los fondos públicos	Valorizaciones sobrevaloradas	Costo de la Obra
			La ausencia del personal clave propuesto por el contratista y supervisor, afectan el cumplimiento de los contratos y pone en riesgo la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra	Incumplimiento de contrato de ejecución y supervisión de obra	Calidad y Costo de la Obra
			Partidas del expediente técnico se ejecutan sin tener en cuenta las medidas de seguridad y mitigación ambiental, generando el riesgo de afectación a la salud y seguridad de trabajadores y población beneficiaria del proyecto y posible contaminación ambiental	Incumplimiento de contrato de ejecución de obra	Impacto Ambiental negativo y Seguridad de los trabajadores
			La empresa contratista no cuenta con expediente técnico durante la ejecución ni planos de replanteo en obra, generando incertidumbre sobre el alineamiento real, definición de secciones transversales y ubicación de los componentes de la obra, como consecuencia de ello, se estaría generando una inadecuada ejecución de partidas contractuales en obra	Deficiente control técnico en proceso constructivo	Calidad y Costo de la Obra
			Los agregados usados para elaborar concreto no cumplen con las especificaciones técnicas, además, de estar expuestos a contaminación, asimismo habría defectuoso vibrado durante el llenado del concreto, lo que generaría menor resistencia a la compresión y menor durabilidad en las estructuras afectando la vida útil de la obra	Deficiente control de calidad en los agregados y defectuoso vibrado en el llenado de concreto	Calidad y Costo de la Obra

Denominación del Hito de Control	Periodo de Ejecución del Hito	Producto Obtenido	Situación Adversa	Hecho	Afectación
			Demora en la atención de anotaciones en cuaderno de obra que señalan necesidad de incrementar altura de muro podría originar atrasos en la ejecución con posibles ampliaciones de plazo y consecuente pago por mayores gastos generales	Demora en solución de consultas	Calidad y Costo de la Obra
			Omisión de registro de la obra en el aplicativo infobras, genera el riesgo de afectar la transparencia en la información de las obras públicas, además, que afecte la toma de acciones y/o medidas de seguimiento por parte de los sectores correspondientes y organismos de control	Omisión de Registro de información pública	Inadecuado seguimiento y Control de la Obra.
Hito de control N° 3 - Valorización N° 3 de obra y expediente de adicional con deductivo vinculante N°1	Del 20 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 244-2020-CG/GRLP-CC	Inclusión de la partida "conformado y compactado de sub base granular E = 0.10 m." sin sustento técnico, modificaciones de altura de los muros de contención sin considerar posible erosión del río, deficiencias en el cálculo de costos unitarios, metrados y en el cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente de adicional podrían generar pagos indebidos en perjuicio de la entidad	Deficiente diseño del expediente de Adicional de obra.	Calidad y Costo de la Obra
			La valorización principal N° 03 y N° 01 del adicional correspondientes al mes de diciembre de 2019 presentan metrados mal cuantificados, pudiendo afectar el cumplimiento de metas debido al pago de metrados no ejecutados y generar un posible perjuicio a la entidad	Valorizaciones sobrevaloradas	Costo de la Obra
			Incumplimiento de los procesos constructivos, establecidos en el expediente técnico y las normas de construcción, ponen en riesgo la seguridad y calidad de los trabajos en perjuicio de la continuidad y vida útil de la obra	Incumplimiento de las especificaciones técnicas según el expediente técnico	Calidad y Costo de la Obra
Hito de control N°4 - Valorización N° 3 de obra y expediente de adicional con deductivo vinculante N°1	Del 10 de septiembre de 2020 al 11 de septiembre de 2020	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 7201-2020-CG/GRLP-CC	La entidad aprobó la solicitud de ampliación excepcional de plazo presentada por el contratista, no obstante, la obra ya se encontraba suspendida antes de la decretoria del estado de emergencia y los costos originados por la misma no se encuentran debidamente sustentados, generando el riesgo de afectar la correcta administración de los fondos públicos	Ampliación excepcional de plazo y reconocimiento de Costos	Tiempo y Costo de la Obra
			La entidad aprobó mayores gastos generales a la supervisión sin que estos se encuentren acreditados, generando el riesgo de afectar la correcta administración de los fondos públicos	Reconocimiento y pago de gastos generales	Tiempo y Costo de la Obra
Recepción de Obra y Liquidación de Contrato	Del 13 al 24 de abril de 2021	INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 10297-2021-CG/GRLP-SCC	El comité de recepción de obra no habría observado incongruencias entre plano de replanteo y lo ejecutado, así como tampoco habría observado deficiencias constructivas, generando el riesgo de pago por partidas no ejecutadas y reducción de la vida útil de la obra. Afectando la correcta administración de los fondos públicos.	Deficiencias constructivas y Liquidación Técnica - Financiera sin planos de replanteo	Costo de la Obra
			La entidad no se ha pronunciado oportunamente respecto de la liquidación de contrato de obra y ha solicitado opinión tardía de la supervisión situación que podría generar el consentimiento de dicha liquidación y que se reconozcan pagos que no corresponden, así como la omisión de aplicación de penalidades afectando los recursos del estado.	Omisión de pronunciamiento de parte de la entidad respecto a la liquidación de contrato de obra	Costo de la Obra y Penalidades.
			Liquidación de contrato presentada por el contratista, contiene valorizaciones de obra que incluyen partidas con metrados no ejecutados, lo que podría generar posible perjuicio económico a la entidad.	Metrados incongruentes	Costo de la Obra

## Anexo 4: Cuestionario Diseñado

**CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, RESPECTO AL SERVICIO DEL CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE Y ORIENTACIÓN DE OFICIO.**

**OBJETIVO:** Evaluar la pertinencia del servicio de control simultáneo en las modalidades de Control Concurrente y Orientación de Oficio en la ejecución de los proyectos a cargo de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yauyos.

**INSTRUCCIONES:** A continuación, usted encontrará un conjunto de preguntas relacionados a las modalidades de control simultáneo realizadas a la ejecución de los proyectos. Lea y elija la respuesta que mejor se adapte al servicio, existen tres posibles respuestas:

1. Siempre
2. A veces
3. Nunca

Nº	ITEMS	Siempre	A veces	Nunca
1	¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones adversas que perjudiquen los objetivos previstos en los proyectos a ejecutar?			
2	Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificados situaciones con hechos irreversibles?			
3	En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores?			
4	¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional?			
5	¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos?			
6	¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes?			
7	¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de información solicitados y en los plazos establecidos?			
8	De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas señaladas?			



9	En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto?			
10	¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva?			
11	¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos públicos?			
12	¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos?			
13	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos establecidos por la entidad?			
14	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos en las Entidades Municipales?			
15	¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del presupuesto en los proyectos?			
16	Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas?			
17	¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al Titular de la entidad para la toma de decisiones?			
18	¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la Entidad?			
19	De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos?			
20	De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han emitido durante el proceso en curso?			

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

## Anexo 5: Cuestionarios Realizados

**CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, RESPECTO AL SERVICIO DEL CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE Y ORIENTACIÓN DE OFICIO.**

**OBJETIVO:** Evaluar la pertinencia del servicio de control simultáneo en las modalidades de Control Concurrente y Orientación de Oficio en la ejecución de los proyectos a cargo de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yauyos.

**INSTRUCCIONES:** A continuación, usted encontrará un conjunto de preguntas relacionados a las modalidades de control simultáneo realizadas a la ejecución de los proyectos. Lea y elija la respuesta que mejor se adapte al servicio, existen tres posibles respuestas:

1. Siempre
2. A veces
3. Nunca

Nº	ITEMS	Siempre	A veces	Nunca
1	¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones adversas que perjudiquen los objetivos previstos en los proyectos a ejecutar?	✓		
2	Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificados situaciones con hechos irreversibles?		✓	
3	En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores?			✓
4	¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional?	✓		
5	¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos?		✓	
6	¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes?	✓		
7	¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de información solicitados y en los plazos establecidos?		✓	
8	De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas señaladas?		✓	
9	En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto?	✓		

10	¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva?			✓
11	¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos públicos?	✓		
12	¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos?	✓		
13	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos establecidos por la entidad?		✓	
14	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos en las Entidades Municipales?		✓	
15	¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del presupuesto en los proyectos?		✓	
16	Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas?	✓		
17	¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al Titular de la entidad para la toma de decisiones?	✓		
18	¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la Entidad?		✓	
19	De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos?		✓	
20	De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han emitido durante el proceso en curso?	✓		

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

**CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, RESPECTO AL SERVICIO DEL CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE Y ORIENTACIÓN DE OFICIO.**

**OBJETIVO:** Evaluar la pertinencia del servicio de control simultáneo en las modalidades de Control Concurrente y Orientación de Oficio en la ejecución de los proyectos a cargo de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yauyos.

**INSTRUCCIONES:** A continuación, usted encontrará un conjunto de preguntas relacionados a las modalidades de control simultáneo realizadas a la ejecución de los proyectos. Lea y elija la respuesta que mejor se adapte al servicio, existen tres posibles respuestas:

1. Siempre
2. A veces
3. Nunca

Nº	ITEMS	Siempre	A veces	Nunca
1	¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones adversas que perjudiquen los objetivos previstos en los proyectos a ejecutar?	x		
2	Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificados situaciones con hechos irreversibles?		x	
3	En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores?	x		
4	¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional?	x		
5	¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos?		x	
6	¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes?	x		
7	¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de información solicitados y en los plazos establecidos?		x	
8	De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas señaladas?		x	
9	En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto?	x		

10	¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva?		x	
11	¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos públicos?	x		
12	¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos?		x	
13	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos establecidos por la entidad?		x	
14	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos en las Entidades Municipales?		x	
15	¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del presupuesto en los proyectos?		x	
16	Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas?	x		
17	¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al Titular de la entidad para la toma de decisiones?	x		
18	¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la Entidad?		x	
19	De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos?		x	
20	De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han emitido durante el proceso en curso?	x		

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

**CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, RESPECTO AL SERVICIO DEL CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE Y ORIENTACIÓN DE OFICIO.**

**OBJETIVO:** Evaluar la pertinencia del servicio de control simultáneo en las modalidades de Control Concurrente y Orientación de Oficio en la ejecución de los proyectos a cargo de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yauyos.

**INSTRUCCIONES:** A continuación, usted encontrará un conjunto de preguntas relacionados a las modalidades de control simultáneo realizadas a la ejecución de los proyectos. Lea y elija la respuesta que mejor se adapte al servicio, existen tres posibles respuestas:

1. Siempre
2. A veces
3. Nunca

Nº	ITEMS	Siempre	A veces	Nunca
1	¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones adversas que perjudiquen los objetivos previstos en los proyectos a ejecutar?	X		
2	Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificados situaciones con hechos irreversibles?		X	
3	En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores?		X	
4	¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional?	X		
5	¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos?		X	
6	¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes?		X	
7	¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de información solicitados y en los plazos establecidos?		X	
8	De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas señaladas?		X	
9	En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto?		X	

10	¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva?		X	
11	¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos públicos?	X		
12	¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos?		X	
13	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos establecidos por la entidad?		X	
14	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos en las Entidades Municipales?		X	
15	¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del presupuesto en los proyectos?			X
16	Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas?		X	
17	¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al Titular de la entidad para la toma de decisiones?		X	
18	¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la Entidad?		X	
19	De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos?		X	
20	De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han emitido durante el proceso en curso?	X		

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

**CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, RESPECTO AL SERVICIO DEL CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE Y ORIENTACIÓN DE OFICIO.**

**OBJETIVO:** Evaluar la pertinencia del servicio de control simultáneo en las modalidades de Control Concurrente y Orientación de Oficio en la ejecución de los proyectos a cargo de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yauyos.

**INSTRUCCIONES:** A continuación, usted encontrará un conjunto de preguntas relacionados a las modalidades de control simultáneo realizadas a la ejecución de los proyectos. Lea y elija la respuesta que mejor se adapte al servicio, existen tres posibles respuestas:

1. Siempre
2. A veces
3. Nunca

Nº	ITEMS	Siempre	A veces	Nunca
1	¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones adversas que perjudiquen los objetivos previstos en los proyectos a ejecutar?		X	
2	Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificados situaciones con hechos irreversibles?		X	
3	En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores?	X		
4	¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional?	X		
5	¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos?	X		
6	¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes?	X		
7	¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de información solicitados y en los plazos establecidos?		X	
8	De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas señaladas?		X	
9	En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto?	X		



10	¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva?			X
11	¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos públicos?	X		
12	¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos?	X		
13	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos establecidos por la entidad?		X	
14	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos en las Entidades Municipales?		X	
15	¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del presupuesto en los proyectos?		X	
16	Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas?		X	
17	¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al Titular de la entidad para la toma de decisiones?	X		
18	¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la Entidad?		X	
19	De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos?		X	
20	De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han emitido durante el proceso en curso?	X		

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

**CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, RESPECTO AL SERVICIO DEL CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE Y ORIENTACIÓN DE OFICIO.**

**OBJETIVO:** Evaluar la pertinencia del servicio de control simultáneo en las modalidades de Control Concurrente y Orientación de Oficio en la ejecución de los proyectos a cargo de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yauyos.

**INSTRUCCIONES:** A continuación, usted encontrará un conjunto de preguntas relacionados a las modalidades de control simultáneo realizadas a la ejecución de los proyectos. Lea y elija la respuesta que mejor se adapte al servicio, existen tres posibles respuestas:

1. Siempre
2. A veces
3. Nunca

Nº	ITEMS	Siempre	A veces	Nunca
1	¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones adversas que perjudiquen los objetivos previstos en los proyectos a ejecutar?	X		
2	Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificado situaciones con hechos irreversibles?		X	
3	En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores?			X
4	¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional?	X		
5	¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos?	X		
6	¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes?	X		
7	¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de información solicitados y en los plazos establecidos?			X
8	De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas señaladas?		X	
9	En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto?	X		

10	¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva?		X	
11	¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos públicos?	X		
12	¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos?		X	
13	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos establecidos por la entidad?	X		
14	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos en las Entidades Municipales?	X		
15	¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del presupuesto en los proyectos?		X	
16	Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas?		X	
17	¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al Titular de la entidad para la toma de decisiones?	X		
18	¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la Entidad?		X	
19	De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos?	X		
20	De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han emitido durante el proceso en curso?	X		

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

**CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, RESPECTO AL SERVICIO DEL CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE Y ORIENTACIÓN DE OFICIO.**

**OBJETIVO:** Evaluar la pertinencia del servicio de control simultáneo en las modalidades de Control Concurrente y Orientación de Oficio en la ejecución de los proyectos a cargo de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yauyos.

**INSTRUCCIONES:** A continuación, usted encontrará un conjunto de preguntas relacionados a las modalidades de control simultáneo realizadas a la ejecución de los proyectos. Lea y elija la respuesta que mejor se adapte al servicio, existen tres posibles respuestas:

1. Siempre
2. A veces
3. Nunca

Nº	ITEMS	Siempre	A veces	Nunca
1	¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones adversas que perjudiquen los objetivos previstos en los proyectos a ejecutar?	X		
2	Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificados situaciones con hechos irreversibles?		X	
3	En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores?		X	
4	¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional?	X		
5	¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos?	X		
6	¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes?	X		
7	¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de información solicitados y en los plazos establecidos?		X	
8	De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas señaladas?		X	
9	En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto?	X		

10	¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva?		X	
11	¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos públicos?	X		
12	¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos?	X		
13	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos establecidos por la entidad?		X	
14	¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos en las Entidades Municipales?	X		
15	¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del presupuesto en los proyectos?		X	
16	Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas?	X		
17	¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al Titular de la entidad para la toma de decisiones?	X		
18	¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la Entidad?		X	
19	De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos?		X	
20	De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han emitido durante el proceso en curso?	X		

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

## Anexo 6: Portal De Transparencia – INFObras

# OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA.

Nº	Origen	Código	Estado	Plazo de ejecución	Entidad	Objeto	Modalidad	Tramo	Monto
11	GOB. LIMA	8077	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DEL SERVIDOR DE TELECOMUNICACION Y CABLEADO DE PASTA METALICA EN EL AREA PROYECTO DEL PASEO COO-AL PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Abstr. Directo	En ejecución	S/ 300,000.00
12	GOB. LIMA	8036	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	MEJORAMIENTO DEL SERVIDOR DE TELECOMUNICACIONES Y CABLEADO DE PASTA METALICA EN COMUNICACIONES Y SERVIDORES DE PASTA METALICA EN PASTA METALICA EN EL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Abstr. Directo	Sin ejecución	S/ 276,000.00
13	GOB. LIMA	8037	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	MEJORAMIENTO DEL SERVIDOR DE TELECOMUNICACIONES Y CABLEADO DE PASTA METALICA EN PASTA METALICA EN EL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Abstr. Directo	Finalizada	S/ 375,000.00
14	GOB. LIMA	8078	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL LA TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE LOS VIALTORES DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Concurso	De ejecución	S/ 417,000.00
15	GOB. LIMA	8079	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL LA TRAMO CALLE A-RODÓN ENTRE CALLE DE JACAYO Y CALLE DE JACAYO EN PASTA METALICA EN PASTA METALICA EN EL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Concurso	En ejecución	S/ 343,300.00
16	GOB. LIMA	8079	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL LA TRAMO CALLE A-RODÓN ENTRE CALLE DE JACAYO Y CALLE DE JACAYO EN PASTA METALICA EN PASTA METALICA EN EL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Concurso	Finalizada	S/ 333,500.00
17	GOB. LIMA	8080	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE VIALTORES EN EL LA TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE LOS VIALTORES DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Concurso	Finalizada	S/ 3,371,547.00
18	GOB. LIMA	8080	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE VIALTORES EN EL LA TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE LOS VIALTORES DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Concurso	Finalizada	S/ 1,228,000.00
19	GOB. LIMA	8080	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE VIALTORES EN EL LA TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE LOS VIALTORES DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Concurso	Finalizada	S/ 1,228,000.00
20	GOB. LIMA	8080	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE VIALTORES EN EL LA TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE LOS VIALTORES DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Concurso	En ejecución	S/ 1,375,000.00
21	GOB. LIMA	8080	●	●	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE VIALTORES EN EL LA TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE LOS VIALTORES DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Abstr. Directo	De ejecución	S/ 118,000.00

**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

VERIFICA LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD

---

FICHA RESUMEN DE LA OBRA

**1. DATOS GENERALES**

ENTIDAD	MINISTERIO PROVINCIAL DE YAUYOS
NOMBRE DE LA OBRA	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE LOS VIALTORES, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR CONTRATA
FECHA DE INICIO DE OBRA	
UBICACIÓN DE LA OBRA	AV. CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA
CONTRATISTA	CONSTRUCCION E INGENIERIA SRA. WALBERTH S.R.L.
SUPERVISOR	
RESIDENTE	DIAS

**ESTADO DE LA OBRA**

SIN EJECUCIÓN

**MONTO DE CONTRATO EN S/:**

3,917,742.82

**TIEMPO EN EJECUCIÓN**

0 5%

**AVANCE FISICO**

0.00

**AVANCE FINANCIERO EJECUTADO**

0.00

**FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA**

-

**2. DECRETOS DE URGENCIA**

La obra no está considerada dentro del inventario de obras prioritarias según (ART. N° 4 - 4.8)

### 5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Adelantos	Calendario	Ampliaciones	Adicionales	Procesos Arbitrales	Recepción	Liquidación
<p><b>La obra no cuenta con adelanto(s) de obra</b></p>						

### 6. INFORMES DE CONTROL RELACIONADOS A LA OBRA (SE MUESTRAN LOS INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DEL 2018)

Tipo Informe	Nº de Informe	Asunto	Fecha Emisión de Informe	Fecha Publicación de Informe	Resumen Ejecutivo	Informe	Videos de servicios de control	Fotos de servicios de control
CONTROL CONCURRENTE	616-2019-CG/GRIP-CC	RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	25/02/2019 12:00:00 a.m.	25/03/2019 09:04:33 a.m.				
CONTROL CONCURRENTE	5936-2019-CG/GRIP-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	18/12/2019 12:00:00 a.m.	21/05/2020 05:23:51 p.m.				
CONTROL CONCURRENTE	244-2020-CG/GRIP-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	21/02/2020 12:00:00 a.m.	29/04/2020 10:26:22 a.m.				
CONTROL CONCURRENTE	7201-2020-CG/GRIP-SCC	RENOVACIÓN DE PISTAS; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	15/09/2020 12:00:00 a.m.	28/09/2020 05:17:21 p.m.				

(INFOBRAS - RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA., s.f.)

Véase: [https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm\\_obras\\_mostrar\\_1.aspx?ID=Zemf](https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zemf)

# OBRA: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA.

N°	Resumen	Código PROYECTO	Estado de Registro	Indicadores	Entidad	Obra	Modalidad	Estado	Monto
31		80171			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INCUBACIÓN Y CONSERVACIÓN DE HUEVOS NATURALES EN LA RED DE INDUSTRIAS TECNO YAUYOS LOCALIDAD DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Admin. Directa	En ejecución	S/ 300,000.00
32		80196			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APRENDIZAJE ESCOLAR E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	Admin. Directa	En ejecución	S/ 270,000.00
33		80487			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO DE LA U. LA SERRA DOMINIO DE MANEJO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	Admin. Directa	Finalizada	S/ 377,475.00
34		80703			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL CAL TRAMAYU. OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Convocatoria	En ejecución	S/ 4,817,000.00
35		80786			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL CAL TRAMAYU CALLE INTERCOMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE ALCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Convocatoria	En ejecución	S/ 343,000.00
36		80782			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL CAL TRAMAYU CALLE ALFONSO VARELA Y CALLE DE ALCO EN LA LOCALIDAD DE ALCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Convocatoria	Finalizada	S/ 320,547.40
37		81389			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN CALLE 18 N° 488 08 DE CARRETERA AERONAUTA, DISTRITO DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Convocatoria	Finalizada	S/ 2,321,547.00
38		81388			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN CALLE 18 N° 488 09 DE CARRETERA AERONAUTA, DISTRITO DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Convocatoria	Finalizada	S/ 1,226,000.00
39		81391			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN CALLE 18 N° 488 09 DE CARRETERA AERONAUTA, DISTRITO DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Convocatoria	Finalizada	S/ 1,226,000.00
40		81392			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA, CENTRO PUEBLO DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE YAUYOS - REGIÓN LIMA	Por Convocatoria	En ejecución	S/ 1,818,000.00
41		81393			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	AMPLIACIÓN DEL PISO DE LA PLAZA POTABLE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE YAUYOS - REGIÓN LIMA	Admin. Directa	En ejecución	S/ 118,100.00

**INF OBRAS** LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO

VERIFICA LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD

**FICHA RESUMEN DE LA OBRA**

1. DATOS GENERALES

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	ESTADO DE LA OBRA	EJECUCIÓN
NOMBRE DE LA OBRA	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA, CENTRO PUEBLO DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE YAUYOS - REGIÓN LIMA	MONTO DE CONTRATO EN S/	973,544.68
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Por Convocatoria	TIEMPO DE EJECUCIÓN	120 días
FECHA DE INICIO DE OBRA	14/04/2019	AVANCE FÍSICO	0 %
UBICACIÓN DE LA OBRA	PLAZA CONSTITUCIÓN N° 188 - YAUYOS (LIMA - YAUYOS - YAUYOS)	AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	0.00
CONTRATISTA	SOLUCIONES & CONSULTORÍA MED SUR	FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA	11/09/2019
SUPERVISOR			
RESIDENTE	IME		

2. DECRETOS DE URGENCIA

La obra no está considerada dentro del inventario de obras prioritarias según (MOT N° 4 - 4)

## 5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Adelantos | Calendario | Ampliaciones | Adicionales | Procesos Arbitrales | Recepción | Liquidación

La obra no cuenta con adelanto(s) de obra

## 6. INFORMES DE CONTROL RELACIONADOS A LA OBRA (SE MUESTRAN LOS INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DEL 2018)

Tipo Informe	N° de Informe	Asunto	Fecha Emisión de Informe	Fecha Publicación de Informe	Resumen Ejecutivo	Informe	Videos de servicios de control	Fotos de servicios de control
ORIENTACIÓN DE OFICIO	5528-2019-C6/DEN-SOO	SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA INFOBRAS	28/11/2019 12:00:00 a.m.	26/01/2021 04:38:13 p.m.				
CONTROL CONCURRENTE	027-2019-OC/0435-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	30/10/2019 12:00:00 a.m.	30/10/2019 09:45:41 p.m.				
CONTROL CONCURRENTE	031-2019-OC/0435-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	29/11/2019 12:00:00 a.m.	29/11/2019 06:11:40 p.m.				

(República L. c., INFOBRAS - MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA., 2019)

Véase: [https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm\\_obras\\_mostrar\\_1.aspx?ID=Zhkfh](https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zhkfh)

# OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA.

N°	Resumen	Código INFOBRAS	Estado de Programa	Avance físico de obra	Plazo de ejecución	Entidad	Obras	Modalidad	Estado	Monto
31		09077				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AUTOS MANTENIDOS EN LA RED VIAL AGROPECUARIA EN YAUYOS (CALLE, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA)	Admin. Directa	En ejecución	S/ 300,000.00
32		09026				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN ESCOLAR E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMATIVOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Admin. Directa	En ejecución	S/ 276,022.00
33		09407				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO DE LA LE SARTO DOMINIO DE YAUYOS DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Admin. Directa	Finalizado	S/ 317,413.00
34		04103				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Contrato	En ejecución	S/ 4,877,092.00
35		07011				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Contrato	En ejecución	S/ 343,966.00
36		00702				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL TRAMO CALLE AV. SURETY Y CALLE DE LA JUDE EN LA LOCALIDAD DE AUCA, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Contrato	Finalizado	S/ 328,541.00
37		23319				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL TRAMO 4800 M DE CARRETERA ARRIBA DEDE HUAYTA A YAUYOS, CON REPOSICIÓN DE CARRETERA Y CABLES DE COOPERACIÓN DE TIERRA EN LA LOCALIDAD AGUACUA, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Contrato	Finalizado	S/ 2,321,147.00
38		23319				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL TRAMO 10 MAS 113 KM DE CARRETERA ARRIBA, DESDE HUAYTA A AGUACUA, CON REPOSICIÓN DE CARRETERA Y CABLES DE COOPERACIÓN DE TIERRA EN LA LOCALIDAD AGUACUA, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Por Contrato	Finalizado	S/ 1,254,809.33
39		23305				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	MEJORAMIENTO Y ACREDITAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LA CALLE CONSUELO DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA - LIMA, CENTRO PUEBLOS DE YAUYOS - DISTRITO DE YAUYOS - PROVINCIA DE YAUYOS - REGIÓN LIMA	Por Contrato	En ejecución	S/ 1,816,698.07
40		03617				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ACREDITAMIENTO DE LA RED DE CALIDAD AMBIENTAL Y AMBIENTE URBANO EN EL TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	Admin. Directa	En ejecución	S/ 118,738.00




VERIFICA LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD

### FICHA RESUMEN DE LA OBRA

**1. DATOS GENERALES**

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS
NOMBRE DE LA OBRA	RENOVACIÓN DE PISTA EN EL TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR CONTRATO <b>REGISTRO ENTIDAD</b>
FECHA DE INICIO DE OBRA	04/08/2019
UBICACIÓN DE LA OBRA	CALLE INDEPENDENCIA, ANEXO DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA
CONTRATISTA	SIEMPRE INGENIEROS Y SOLUCIONES S.A.C.
SUPERVISOR	LEONARDO GUERRA LORENZO
RESIDENTE	DANIEL OSORIO, LUIS DANIEL ORTEGA

<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	EJECUCIÓN
<b>MONTO DE CONTRATO EN S/:</b>	334,732.11
<b>TIEMPO EN EJECUCIÓN</b>	45 días
<b>AVANCE FÍSICO</b>	86.74 %
<b>AVANCE FINANCIERO EJECUTADO</b>	290,352.95
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA</b>	19/07/2019

**2. DECRETOS DE URGENCIA**

## 5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Adelantos
- Calendario
- Ampliaciones
- Adicionales
- Procesos Arbitrales
- Recepción
- Liquidación

La obra no cuenta con adelanto(s) de obra

## 6. INFORMES DE CONTROL RELACIONADOS A LA OBRA (SE MUESTRAN LOS INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DEL 2018)

Tipo Informe	N° de Informe	Asunto	Fecha Emisión de Informe	Fecha Publicación de Informe	Resumen Ejecutivo	Informe	Videos de servicios de control	Fotos de servicios de control
ORIENTACIÓN DE OFICIO	5528-2019-CG/DEN-SOO	SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA INFOBRAS	28/11/2019 12:00:00 a.m.	26/01/2021 04:38:13 p.m.				
CONTROL CONCURRENTE	018-2019-OCI/0435-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	24/07/2019 12:00:00 a.m.	25/07/2019 04:14:31 p.m.				
CONTROL CONCURRENTE	029-2019-OCI/0435-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	15/11/2019 12:00:00 a.m.	15/11/2019 03:39:13 p.m.				
CONTROL CONCURRENTE	005-2020-OCI/0435-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	11/03/2020 12:00:00 a.m.	11/03/2020 06:41:11 p.m.				



(INFOBRAS - RENOVACIÓN DE PISTAS EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA, 2019)

Véase: [https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm\\_obras\\_mostrar\\_1.aspx?ID=Zemni](https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zemni)



# OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA

N°	Resumen	Código PROBRAS	Estado de la obra	Indicadores	Avance físico de la obra	Plazo de ejecución	Entidad	Otros	Modalidad	Estado	Monto
21		2056					MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	RENOVACIÓN DE PISA EN EL(A) R. LIMA DESDE R. TUAC AMARU HASTA AV. DE BIERO DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	Por Contrato	Finalizada	S/ 220,000.24
22		2056					MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	RENOVACIÓN DE PISAS EN EL(A) TRAMO 1-42, R. JOSÉ CHAVEZ DESDE R. ST. TOMIC AMARU HASTA R. LIMA DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	Por Contrato	Finalizada	S/ 190,710.40
23		2056					MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	RENOVACIÓN DE PISAS Y SECLORAS EN EL(A) TRAMO 1-43, PASADÉ EN EL(A) SECTOR CARLOS OCHOA R. JOSÉ CHAVEZ HASTA R. SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	Por Contrato	Finalizada	S/ 80,205.14
24		2090					MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	RENOVACIÓN DE PISAS, SERVICIOS Y SECLORAS EN EL(A) TRAMO 1-58, R. SIMÓN BOLÍVAR DESDE R. LIMA HASTA CALLE EN EN LA LOCALIDAD HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	Por Contrato	Finalizada	S/ 153,938.90
25		2040					MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	RENOVACIÓN DE PISAS Y SECLORAS EN EL(A) TRAMO 1-43, SERVICIOS Y SECLORAS DESDE R. JOSÉ CHAVEZ HASTA CENICIENTO EN LA LOCALIDAD HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	Por Contrato	Finalizada	S/ 102,821.11
26		307					MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	Por Contrato	Finalizada	S/ 891,281.42
27		13087					MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	RENOVACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA EN EL(A) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	Admin. Directa	En ejecución	S/ 43,800.00
28		11645					MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA EN EL(A) BARRIO HUANCAYA, HUANCAYA EN LA LOCALIDAD HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	Admin. Directa	En ejecución	S/ 15,698.32
29		11734					MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD EN EL(A) DEL DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, SESIÓN LIMA, AFECTADA POR EL TENDIMIENTO DEL RÍO COYUPE	Por Contrato	En ejecución	S/ 742,162.91
30		11970					MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	RENOVACIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA EN EL(A) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	Admin. Directa	En ejecución	S/ 40,759.00

VERIFICA LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD







### FICHA RESUMEN DE LA OBRA

Inicio
Añadir comentario
Boleto de entrada
INFOGRAMA

**1. DATOS GENERALES**

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA	<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	FINALIZADA
NOMBRE DE LA OBRA	08346 - RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA	<b>MONTO DE CONTRATO EN S/</b>	896,812.75
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Por Contrato	<b>TIEMPO EN EJECUCIÓN</b>	90 días
FECHA DE INICIO DE OBRA	21/05/2019	<b>AVANCE FÍSICO</b>	100 %
UBICACIÓN DE LA OBRA	POBLADO DE HUANCAYA, LIMA - YAUYOS - HUANCAYA	<b>AVANCE FINANCIERO EJECUTADO</b>	896,232.55
CONTRATISTA	DESCROTTICE S.R.L.	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA</b>	21/06/2019
SUPERVISOR	GONZALES QUINTERO LILIA WALTER JULIUS		
RESIDENTE	MARCELO VARELA SANCHEZ DE LA CRUZ DNI: 78920485		

## 6. INFORMES DE CONTROL RELACIONADOS A LA OBRA (SE MUESTRAN LOS INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DEL 2018)


Tipo Informe	N° de Informe	Asunto	Fecha Emisión de Informe	Fecha Publicación de Informe	Resumen Ejecutivo	Informe	Videos de servicios de control	Fotos de servicios de control
ORIENTACIÓN DE OFICIO	4578-2019-CG/DEN-SOO	SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA INFOBRAS	28/11/2019 12:00:00 a.m.	26/01/2021 03:56:48 p.m.				
CONTROL CONCURRENTE	025-2019-OCI/0435-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	22/10/2019 12:00:00 a.m.	23/10/2019 06:33:03 p.m.				
CONTROL CONCURRENTE	030-2019-OCI/0435-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	28/11/2019 12:00:00 a.m.	16/12/2019 04:42:49 p.m.				

(INFOBRAS - RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA, 2019)

Véase: [https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm\\_obras\\_mostrar\\_1.aspx?ID=Zhkj](https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zhkj)

## Anexo 7: Informes De Control Realizados

### OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA.



**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

---

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS

**INFORME DE CONTROL CONCURRENTE**  
**N° 616 -2019-CG/GRLP-CC**

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  
YAUYOS - LIMA

RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV.  
CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA  
YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA"


PERIODO DE EVALUACIÓN:  
DEL: 15 DE FEBRERO AL 25 DE FEBRERO DE 2019  
HITO DE CONTROL N° 1 – ACTOS PREVIOS A INICIO DE OBRA

LIMA - PERÚ  
2019

(Informe de control concurrente n.º 616-2019-CG/GRLP-CC, Hito de control n.º 1 – Actos Previos a Inicio de Obra.)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSIC82300031&TIPO\\_ARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSIC82300031&TIPO_ARCHIVO=ADJUNTO)



**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

---

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 5936-2019-CG/GRLP-SCC**

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  
YAUYOS - YAUYOS - LIMA

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN  
EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE  
YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA

HITO DE CONTROL N°2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL AL 9 DE DICIEMBRE  
DE 2019

PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:  
DEL 22 NOVIEMBRE DE 2019 AL 09 DICIEMBRE DE 2019

LIMA - PERÚ  
12-2019

(Informe de control concurrente n.º 5936-2019-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 2 – Ejecución contractual al 9 de diciembre de 2019.)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CSIC82300009&TIPO\\_ARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300009&TIPO_ARCHIVO=ADJUNTO)

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 244-2020-CG/GRLP-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS**  
**YAUYOS - YAUYOS - LIMA**

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN**  
**EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE**  
**YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA**

**HITO DE CONTROL N°3 - VALORIZACIÓN N° 3 DE OBRA Y EXPEDIENTE DE**  
**ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1**

**PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:**  
**DEL 20 ENERO DE 2020 AL 31 ENERO DE 2020**

**LIMA - PERÚ**  
**02-2020**

(Informe de control concurrente n.º 244-2020-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 3 – Valorización n.º 3 de obra y expediente de adicional con deductivo vinculante n.º 1.)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CSIC82300042&TIPO\\_ARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300042&TIPO_ARCHIVO=ADJUNTO)

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 7201-2020-CG/GRLP-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS**  
**YAUYOS - YAUYOS - LIMA**

**RENOVACIÓN DE PISTAS; EN EL (LA) TRAMO AV.**  
**CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE**  
**YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA**

**HITO DE CONTROL N°4 - AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO,**  
**CUANTIFICACIÓN DE COSTOS Y VALORIZACIÓN DE AGOSTO DEL 2020**

**PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:**  
**DEL 10 SEPTIEMBRE DE 2020 AL 11 SEPTIEMBRE DE 2020**

**LIMA - PERÚ**  
**09-2020**

(Informe de control concurrente n.º 7201-2020-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 4 – Ampliación excepcional de plazo, cuantificación de costos y valorización de agosto del 2020.)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CSIC82300201&TIPO\\_ARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300201&TIPO_ARCHIVO=ADJUNTO)

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS

**INFORME DE CONTROL CONCURRENTE**  
**N° 10297-2021-CG/GRLP-SCC**

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  
YAUYOS, YAUYOS, LIMA

"RENOVACIÓN DE PISTAS; EN EL (LA) TRAMO AV.  
CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE  
YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA"

RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:  
DEL 13 AL 23 DE ABRIL DE 2021

HUACHO, 27 DE ABRIL DE 2021

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

(Informe de control concurrente n.° 10297-2021-CG/GRLP-SCC, Recepción de obra y liquidación de contrato.)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2021CSIC82300093&TIPO\\_ARCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIC82300093&TIPO_ARCHIVO=ADJUNTO)

**OBRA: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA  
CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE  
YAUYOS – LIMA.**



SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 5528-2019-CG/DEN-SOO**

ORIENTACIÓN DE OFICIO  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  
YAUYOS, YAUYOS, LIMA

"SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL  
ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA  
INFObras"

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

LIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Informe de Orientación de Oficio n.º 5528-2019-CG/DEN-SOO – Seguimiento al registro y publicación del estado de avance de las obras en el sistema INFObras.)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOA\\_RCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOA_RCHIVO=ADJUNTO)



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 027-2019-OCI/0435-SCC**

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  
DISTRITO Y PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO  
LIMA

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y  
ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS  
Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO  
DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA"

HITO DE CONTROL N° 01  
VALORIZACIÓN N° 04 Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL N° 02,  
DEDUCTIVO N° 01, MAYORES Y MENORES METRADOS N° 01

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 10 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019

YAUYOS, 30 DE OCTUBRE DE 2019

(Informe de control concurrente n.º 027-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 1 – Valorización, 2019)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500079&TIPOA\\_RCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500079&TIPOA_RCHIVO=ADJUNTO)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 031-2019-OCI/0435-SCC**

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  
DISTRITO Y PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO  
LIMA

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y  
ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS  
Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO  
DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA"

HITO DE CONTROL N° 02  
VALORIZACIÓN N° 5

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

YAUYOS, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

"Decretos de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Más de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

(Informe de control concurrente n.º 031-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 2 – Valorización, 2019)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500083&TIPOA\\_RCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500083&TIPOA_RCHIVO=ADJUNTO)

**OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA.**



SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 5528-2019-CG/DEN-SOO**

ORIENTACIÓN DE OFICIO  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  
YAUYOS, YAUYOS, LIMA

"SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL  
ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA  
INFObras"

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

LIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Informe de Orientación de Oficio n.º 5528-2019-CG/DEN-SOO - Seguimiento al registro y publicación del estado de avance de las obras en el sistema INFObras., 2019)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOA\\_RCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOA_RCHIVO=ADJUNTO)



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 018-2019-OCI/0435-SCC**

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  
DISTRITO Y PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO  
LIMA

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL  
(LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD  
DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS,  
DEPARTAMENTO DE LIMA"

HITO DE CONTROL N° 01 – PRIMERA VALORIZACIÓN

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 17 DE JULIO AL 24 DE JULIO DE 2019

YAUYOS, 24 DE JULIO DE 2019

(Informe de control concurrente n.º 018-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 1 – Primera Valorización., 2019).

Véase:

[http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500018&TIPOA\\_RCHIVO=ADJUNTO](http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500018&TIPOA_RCHIVO=ADJUNTO)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 029-2019-OCI/0435-SCC**

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  
DISTRITO Y PROVINCIA DE YAUYOS,  
DEPARTAMENTO LIMA

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL  
(LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD  
DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS,  
DEPARTAMENTO DE LIMA"

HITO DE CONTROL N° 02  
VALORIZACIÓN N° 02 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 24 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

YAUYOS, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

(Informe de control concurrente n.º 029-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 2 – Valorización, 2019).

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500081&TIPOA\\_RCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500081&TIPOA_RCHIVO=ADJUNTO)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 005-2020-OCI/0435-SCC**

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS  
DISTRITO Y PROVINCIA DE YAUYOS,  
DEPARTAMENTO LIMA

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL  
(LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD  
DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS,  
DEPARTAMENTO DE LIMA"

HITO DE CONTROL N° 03  
RECEPCIÓN DE OBRA

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 18 DE JULIO DE 2019 AL 6 DE MARZO DE 2020

YAUYOS, 11 DE MARZO DE 2020

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

(Informe n.º 005-2020-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 3 – Recepción de obra., 2020)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CSI043500006&TIPOA\\_RCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSI043500006&TIPOA_RCHIVO=ADJUNTO)



**OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE  
EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA  
LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA,  
DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO  
LIMA**



SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 4578-2019-CG/DEN-SOO**

ORIENTACIÓN DE OFICIO  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA  
HUANCAYA, YAUYOS, LIMA

"SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL  
ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA  
INFObras"

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

LIMA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Informe de Orientación de Oficio n.º 4578-2019-CG/DEN-SOO - Seguimiento al registro y publicación del estado de avance de las obras en el sistema INFObras., 2019)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2021CSIL53001140&TIPOA\\_RCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53001140&TIPOA_RCHIVO=ADJUNTO)



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 025-2019-OCI/0435-SCC**

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA  
DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA DE YAUYOS,  
DEPARTAMENTO LIMA

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE; EN EL (LA)  
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD  
DE HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA DE  
YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA"

HITO DE CONTROL N° 01  
VALORIZACIÓN N° 5 Y SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 30 DE SETIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2019

YAUYOS, 22 DE OCTUBRE DE 2019

(Informe n.º 025-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 1 – Valorización n.º 5 y suspensión del plazo de ejecución., 2019)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500077&TIPOA\\_RCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500077&TIPOA_RCHIVO=ADJUNTO)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 030-2019-OCI/0435-SCC**

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA  
DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA DE YAUYOS,  
DEPARTAMENTO LIMA

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE; EN EL (LA)  
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD  
DE HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA DE  
YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA"

HITO DE CONTROL N° 02  
VALORIZACIÓN N° 6 DE SUPERVISIÓN Y  
EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N° 1 Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 1

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 18 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

YAUYOS, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

(Informe n.º 030-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 2 – Valorización n.º 6 de Supervisión y expediente adicional de obra n.º 1 y deductivo de obra n.º 1., 2019)

Véase:

[https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2019CSI043500082&TIPOA\\_RCHIVO=ADJUNTO](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500082&TIPOA_RCHIVO=ADJUNTO)
