



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

Gestión de obras públicas y su incidencia en la ejecución del
gasto en la Municipalidad Distrital de Pimentel Periodo
2021

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Contador Público

AUTORES

Castillo Ñiquen, Leandro Arturo (orcid.org/0000-0002-2219-4518)

Gamarra Nizama, Pedro Alejandro (orcid.org/0000-0002-6127-9717)

ASESORA:

Mg. Suarez Santa Cruz, Liliana Del Carmen (orcid.org/0000-0003-2560-7768)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Finanzas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

CHICLAYO - PERÚ

2023

DEDICATORIA

Dedico la presente investigación en primer lugar a Dios por la vida, por consiguiente, a mi madre y abuela por su apoyo brindado desde el día uno que empecé la carrera profesional, muchas gracias.

Leandro Castillo

Esta tesis se la dedico a Dios por guiarme por el buen camino. A mis padres por su apoyo, consejos y ayudarme con los recursos necesarios para estudiar. Me han dado todo lo que soy como persona, mis principios, mis valores, mi empeño y coraje para lograr mis objetivos.

Pedro Gamarra

AGRADECIMIENTO

Agradecemos muy profundamente a nuestra docente por su dedicación y paciencia, sin sus enseñanzas y correcciones, hubiese sido imposible llegar a esta instancia tan esperada y anhelada. Gracias por lo aprendido y por todos sus consejos, estos que llevaremos grabados para siempre en la memoria a lo largo de nuestra vida profesional

Los autores



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, SUAREZ SANTA CRUZ LILIANA DEL CARMEN, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES de la escuela profesional de CONTABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHICLAYO, asesor de Tesis titulada: "Gestión de obras públicas y su incidencia en la ejecución del gasto en la municipalidad distrital de Pimentel Período 2021", cuyos autores son GAMARRA NIZAMA PEDRO ALEJANDRO, CASTILLO ÑIQUEN LEANDRO ARTURO, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 17.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

CHICLAYO, 10 de Julio del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
SUAREZ SANTA CRUZ LILIANA DEL CARMEN DNI: 41837348 ORCID: 0000-0003-2560-7768	Firmado electrónicamente por: LDSUAREZS el 13- 07-2023 12:24:20

Código documento Trilce: TRI - 0582939





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

Declaratoria de Originalidad de los Autores

Nosotros, GAMARRA NIZAMA PEDRO ALEJANDRO, CASTILLO ÑIQUEN LEANDRO ARTURO estudiantes de la FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES de la escuela profesional de CONTABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHICLAYO, declaramos bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Gestión de obras públicas y su incidencia en la ejecución del gasto en la municipalidad distrital de Pimentel Periodo 2021", es de nuestra autoría, por lo tanto, declaramos que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. Hemos mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
LEANDRO ARTURO CASTILLO ÑIQUEN DNI: 73144121 ORCID: 0000-0002-2219-4518	Firmado electrónicamente por: LCASTILLONI28 el 10-07-2023 12:37:33
PEDRO ALEJANDRO GAMARRA NIZAMA DNI: 74072586 ORCID: 0000-0002-6127-9717	Firmado electrónicamente por: PGAMARRAN el 10-07-2023 12:03:03

Código documento Trilce: TRI - 0582940



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Declaratoria de autenticidad del asesor	iv
Declaratoria de originalidad de autores	v
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
Índice de figuras	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA	10
3.1. Tipo y diseño de investigación	10
3.2. Variables y operacionalización	10
3.3. Población, muestra y muestreo	11
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	11
3.5. Procedimientos	12
3.6. Métodos de análisis de datos	12
3.7. Aspectos éticos	12
IV. RESULTADOS	14
V. DISCUSIÓN	38
VI. CONCLUSIONES	42
VII. RECOMENDACIONES	43
REFERENCIAS	44
ANEXOS	

Índice de tablas

Tabla 1: Resultado de entrevista, expedientes técnicos	14
Tabla 2: Expediente técnico de la obra 1	15
Tabla 3: Expediente técnico de la obra 2	16
Tabla 4: Expediente técnico de la obra 3	18
Tabla 5: Resultado de entrevista, licitación pública	19
Tabla 6: Resultado de entrevista, Plazos de ejecución, Revisión de expedientes técnicos, Supervisión y recepción de obra	20
Tabla 7: Penalidades de la obra 1	21
Tabla 8: Penalidades de la obra 2	22
Tabla 9: Penalidades de la obra 3	22
Tabla 10: Resultado de entrevista, Procedimiento de control interno, eficiencia y eficacia	23
Tabla 11: Resultado de entrevista, presupuesto	25
Tabla 12: Datos generales de la obra 1	25
Tabla 13: Datos generales de la obra 2	26
Tabla 14: Datos generales de la obra 3	26
Tabla 15: Resultado de entrevista, ingresos públicos	27
Tabla 16: Resultado de entrevista, fases de ejecución del gasto	28
Tabla 17: Fases de ejecución del gasto de la obra 1	28
Tabla 18: Fases de ejecución del gasto de la obra 2	29
Tabla 19: Fases de ejecución del gasto de la obra 3	30
Tabla 20: Desarrollo de la propuesta, Objetivo 1	33
Tabla 21: Desarrollo de la propuesta, Objetivo 2	34
Tabla 22: Presupuesto de la propuesta	34
Tabla 23: Cronograma de la propuesta	36

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Expediente técnico, obra 1	29
Gráfico 2: Expediente técnico, obra 2	30
Gráfico 3: Expediente técnico, obra 3	31

RESUMEN

Este estudio de investigación tiene como objetivo principal determinar si la gestión de obras públicas incide en la ejecución del gasto en la Municipalidad Distrital de Pimentel. La cual cuenta con un tipo de investigación aplicada no experimental de alcance descriptivo – propositivo. La muestra fueron 3 obras que se desarrollaron en el periodo 2021 en la Municipalidad Distrital de Pimentel. Los instrumentos para la recolección de datos fueron la entrevista, revisión bibliográfica y la guía de análisis documental, todo ello con la finalidad de lograr el objetivo general. Por otro lado, se obtuvo como resultado que hay una deficiencia en la gestión de obras públicas; esta incide en la ejecución del gasto, de manera que retrasa el pago de valorizaciones de las obras que están en ejecución. Se llega a la conclusión que existe una incidencia en la gestión de obras públicas con la ejecución del gasto, esto se debe a que para un buen desarrollo de la obra pública se debe aprobar el presupuesto inicial y ejecutar de manera correcta las fases de ejecución del gasto para que el proyecto se concrete, de lo contrario la obra no se ejecutaría de forma adecuada.

Palabras clave: gasto, gestión, obras.

ABSTRACT

The main objective of this research study is to determine if the management of public works affects the execution of spending in the District Municipality of Pimentel. Which has a type of non-experimental applied research of descriptive scope - purposeful. The sample consisted of 3 works that were developed in the 2021 period in the Municipality of Pimentel, the instruments for data collection were the interview, bibliographic review and the documentary analysis guide, which gave us as a result that there is a deficiency in the management of public works, this affects the execution of the expense in such a way that it delays the payment of valuations of the works that are in execution. It is concluded that there is an incidence in the management of public works with the execution of the expense, this is due to the fact that for a good development of the public works, the initial budget must be approved and the phases of execution of the expense must be correctly executed. for the project to be completed, otherwise the work would not be carried out properly.

Keywords: spending, management, works.

I. INTRODUCCIÓN

La investigación se enfocó en la ejecución del gasto y la incidencia en la gestión de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Pimentel.

A nivel internacional se obtuvo que la mala gestión de unas obras produjo que un túnel bajo tierra para el transporte de camiones detenga las operaciones durante varios años y duplique el presupuesto inicial que se consideró para el desarrollo de la obra, trayendo consigo el atraso de entrega del proyecto, la disconformidad y enfado de los conductores que usarían dicho túnel para su transporte. (Cañas, 2020).

A nivel nacional una deficiente gestión del gasto público en obras generó una problemática mayor por la corrupción en dichas obras y por las asociaciones públicas privadas, esto se vio reflejada en pandemia, como se sabe este problema es estructural y viene afectando desde hace mucho al desarrollo de las obras públicas de forma natural, ya que no se está haciendo nada por combatir esta problemática que azota al país. (Priale, 2021).

De la misma manera, a nivel nacional se asignó por parte del gobierno un presupuesto de alrededor de 63 millones de soles para la financiación pública, de los cuales se usaron casi el 40% del total, esto debido a la paralización de algunos proyectos públicos por diferentes motivos, la gran mayoría de estas obras paralizadas provienen de gobiernos locales. (Comex Perú, 2022).

A nivel regional local, en Chiclayo, Lambayeque, pese a la buena ejecución del gasto público, una inversión millonaria, por lo menos de 12 obras se encontraron inconclusas, y fueron afectadas por los fenómenos climatológicos que golpean al norte peruano tales como el posible fenómeno del niño, lo que buscan las autoridades de la región es realizar estrategias para lograr la calma y tranquilidad de los pobladores. (Salinas, 2019).

La investigación se desarrolló en la Municipalidad Distrital de Pimentel, causado por las quejas de la población por el incumplimiento de las obras públicas en el periodo 2021, donde se empezaron a realizar las operaciones para las obras de saneamiento, seguido de ello se realizó el mantenimiento y construcción de nuevas pistas para las calles principales; para ello se retiró todo el asfalto de las calles que eran parte del proyecto, empezaron los arreglos de agua y desagüe, pero hasta ahí se paralizaron las operaciones, esto ha causado una gran disconformidad

y enojo de la población debido a que las calles del distrito están llenas de huecos e inundaciones por las fugas de las redes de agua y desagüe, debido principalmente al mal manejo del presupuesto destinada al desarrollo de las obras, a la incapacidad de las autoridades o simplemente por una deficiente gestión para el desarrollo de las actividades. Es por ello que esta investigación buscó brindar soluciones para un mejor manejo en la ejecución del gasto en las obras públicas en la Municipalidad del Distrito de Pimentel.

Por tal motivo, en el trabajo se planteó la siguiente interrogante: ¿De qué manera la ejecución del gasto incide en la gestión de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Pimentel?

La justificación es de forma social, ya que, empleando bien el presupuesto destinado para el desarrollo de obras públicas, ayudó a contar con una mejor infraestructura, satisfacer necesidades básicas y tener un estilo de vida adecuado para los pobladores del balneario, en resumen, permitió el beneficio y crecimiento del Distrito de Pimentel.

La investigación se justificó de forma práctica debido a los hallazgos obtenidos en la presente, los cuales permitieron detectar las fortalezas y debilidades de la municipalidad, con referencia a la ejecución del gasto, a su vez estos resultados ayudaron a los funcionarios municipales a mejorar la ejecución del gasto; por otro lado, esta investigación no solo brindó soluciones al municipio, sino que también a los pobladores del distrito, porque involucra aspectos específicos del gasto público tanto del punto de vista técnico como económico.

El estudio se justificó teóricamente, ya que la ejecución del gasto en obras públicas es de vital importancia porque de emplearse adecuadamente va a resolver las necesidades y demandas tanto económicas como sociales.

Desde el punto de vista metodológico de la investigación, se planteó utilizar instrumentos que ayuden a recolectar los datos de las variables de la inversión y gasto en las obras públicas municipales; los cuales se podrán utilizar en investigaciones futuras en relación con la municipalidad y población de dicho distrito.

El objetivo general de la investigación fue: Determinar si la gestión de obras públicas incide en la ejecución del gasto en la Municipalidad Distrital de Pimentel. Mientras que, como objetivos específicos, se tuvieron: Analizar la gestión de obras

públicas de la Municipalidad Distrital de Pimentel del periodo 2021, Evaluar el nivel de ejecución del gasto de las obras públicas de la Municipalidad Distrital de Pimentel del periodo 2021 y elaborar un modelo de gestión de obras públicas para mejorar la ejecución del gasto en la Municipalidad Distrital de Pimentel.

II. MARCO TEÓRICO

Las investigaciones muestran que los procesos de contrataciones y ejecución de obras públicas cuentan con un nivel de injerencia alta en la ejecución de las obras, de igual manera se establece que guardan una relación de proporcionalidad entre ellas, ya que se quiere elegir a la mejor opción para el cumplimiento adecuado en el desarrollo de la obra con el fin de lograr satisfacer las necesidades básicas de la población. (Rodríguez,2018).

Una gestión eficaz de la cadena de suministro en el departamento de obras públicas se obtuvo que es importante contar con los recursos adecuados para el mejor desarrollo del proyecto, de la misma manera la implementación de innovaciones en tecnología y la comunicación adecuada entre el personal provocará y generará un mejor resultado, y una obra de calidad. (Manzini, et al., 2019).

Por lo tanto, se entiende que la gestión municipal es de vital importancia, ya que, por medio de sus políticas públicas, la administración de recursos del estado ofrece una notable calidad de vida y desarrollo urbano a través de las obras civiles, económicas y competentes. (Rengifo, 2021)

Una adecuada gestión debe contar con las siguientes dimensiones para su mejor desarrollo, estas son: estratégica, económica, operativa y social; cada una con indicadores que nos facilita conseguir, de manera estadística, resultados del proyecto contractual, las dimensiones señaladas no han sido eficaces, conservando una categoría regular, dado que no se establece una inadecuada coordinación en cada gobierno nuevo. (Alarcón et al., 2020)

Se le considera obra pública a toda construcción, edificación, remodelación, mantenimiento, mejoramiento, etc. de bienes raíces como edificios, cimientos, infraestructuras, carreteras, puentes, excavaciones, etc. que son financiados con presupuesto del Estado Peruano y regulados por la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.º 30225).

Para comprender mejor la gestión de obras públicas, se debe entender que es el manejo correcto de los medios o recursos con los que se cuenta y dispone para el desarrollo del proyecto (servicio), para cumplir con las necesidades primordiales de los ciudadanos (Asenardo y Rivera, 2018)

Una dimensión de la gestión de obras públicas es la licitación pública y se entiende que este último es un servicio de gestión completa, que comprende desde la elaboración de las bases (administrativas y técnicas) hasta la asignación y elaboración del contrato final, por ello incluye: Realizar las bases administrativas de licitación. (Ponce y Loor, 2020)

Hablar de gestión en obras públicas no solo refiere al trabajo del estado o sus autoridades, sino que también la población, ya que cumple un papel fundamental en el proceso de los proyectos, pues intercambian, coordinan, controlan y adoptan ideas y decisiones en los procesos de gestión pública para afrontar los problemas. Esto le permite a la población ser parte en la mejora del bienestar social y la satisfacción de necesidades en común. (Salgado y Gerónimo, 2021).

En un proyecto con relación a ampliaciones de plazo y el control de supervisión en obras públicas, se tiene que algunos riesgos asociados es que existen factores que provocan demora en la ejecución de este proyecto, una de ellas es la deficiencia presentada por los expedientes técnicos, lo que conlleva sobre costos y lo ya mencionado retrasos al inicio y término del desarrollo de la obra. (Ávila, 2019).

Investigaciones internacionales en el país de México muestran resultados un efecto positivo del gasto público como variable esencial que se relaciona con diferentes factores importantes y vitales como son la política social y el índice de competitividad, así como también con la inversión pública y privada, impuesto a la renta y la desigualdad social (Sánchez, 2018)

Teniendo en consideración la ejecución del gasto con relación a obras públicas en Chile 2018 - 2019, nos muestran que existe una brecha significativa en ambos años, empeorando en el 2019 por una fuerte declinación del gasto público y poca gestión por parte de las autoridades en los procesos asociados a proyectos públicos, trayendo consigo una baja producción en el ámbito de obras públicas. (Donoso, et al. 2019)

Con relación al gasto público en el desarrollo social en México, en la actualidad el gasto público no es el suficiente para asistir y satisfacer de forma adecuada las obligaciones que tiene el gobierno. Estas necesidades son varias y de distintos tipos. El rezago económico y social se ha venido incrementando. Son

el caso del desarrollo social y el gasto en la infraestructura de la sociedad. (Tello, 2020)

El mal uso del gasto público en Latinoamérica es un problema estructural y está muy relacionado con la corrupción, esto provoca a la ciudadanía una disminución con su relación a la calidad de vida y la continuación de la exclusión, así como la desigualdad; de igual manera, el BID indica que el mal uso del gasto público equivale a un 4,4% del PBI regional. Se entiende con esto que existe una gran posibilidad de poder mejorar los servicios públicos básicos sin la necesidad de incrementar el gasto. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018)

En Brasil, en la ciudad de Pau dos Ferros/RN, los cambios que perjudicaron la ejecución del gasto público, en mayor medida, fueron el resultado de las políticas macroeconómicas adoptadas, produciendo mayores restricciones. Esto no fue una sorpresa cuando llegó el nuevo ciclo de inversiones públicas, iniciado en la década de 2000, que provocó sucesos positivos en la estructura y ejecución del gasto en general, al menos hasta 2015. (Cleber y Miranda, 2021)

Para entender mejor al gasto público, se debe estudiar al presupuesto y a los ingresos públicos, el primero es de vital importancia para la gestión del estado con el objetivo de mejoras para la población, mediante la prestación de servicios, así mismo los ingresos públicos son igual de importantes porque sin ellos no se tendría el capital (dinero) para financiar el gasto del estado (D.L N° 1440, 2019)

Con respecto a la ejecución del gasto, este tiene 4 etapas o fases importante para su mejor desarrollo que son certificación, compromiso, devengado y pagado.

La certificación es un acto administrativo cuyo objetivo es asegurar que se tiene el crédito presupuestario libre y sin afectación. En el compromiso, el servidor designado en la oficina competente, según el organigrama organizacional, será el encargado de realizar el compromiso mediante el acto de administración que se ejecuta, afectando los créditos presupuestarios en su correspondiente cadena de gasto, al presupuesto institucional de apertura así como también en sus modificaciones, por lo cual se debe tener como acreditación sustentadora las órdenes de compra, ordenes de servicio, convenios, planillas de movilidad, dietas de directorio, viáticos entre otros; disminuyendo el importe del saldo disponible del crédito presupuestario (MEF, 2020)

La directiva N° 005-2010-EF/76.01, nos indica que el devengado es el acto administrativo en el cual se reconoce una obligación de pago, derivado de un gasto aprobado y comprometido, el cual se conlleva mediante una identificación documentaria ante el organismo competente, de la ejecución de la asistencia o el derecho del acreedor. Dicho registro deberá ser efectuado al presupuesto institucional, con carga de acuerdo a la cadena de gasto. Dicha fase está sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección Nacional de Tesoro Público. (MEF 2010, p. 12)

El pago aquí se solventa de forma parcial o total del importe de la obligación, esto mediante un documento correspondiente de manera oficial. (DL N°1440, 2019)

Se entiende que el gasto público produce un efecto positivo en la demanda agregada, y como consecuencia una mejora económica y social. De igual manera, el gasto público es usado como un instrumento anticíclico para minimizar la brecha de la producción real. (Peña 2021)

Con respecto a la clasificación de la ejecución del gasto en Brasil usados los SIOP, nos comentan que se basan en naturaleza del gasto que puede ayudar a conocer la categoría económica de la misma, a qué grupo pertenece, qué tipo de aplicación y elemento, todo ello con la finalidad de comprender mejor al gasto y a que va destinada su ejecución. (Vieira, et al. 2020)

La noción del gasto público surge con la finalidad de proveer bienes y servicios. Se entiende por gasto público a la cantidad de dinero que usa el Estado para asegurar y sostener el bienestar de los ciudadanos, de forma que este bienestar brinde más beneficios al país. (Huárac, et al., 2022)

El gasto público cumple un rol importante y fundamental como método de política económica, ya que permite el aumento de puestos de trabajo, provocando efectos en la demanda y en la cantidad de ingresos, impulsando el rango de consumo e inversión, así mismo como el aumento de la competencia productiva en el mediano y largo plazo. (Cernichiaro, et al. 2022)

Se considera gasto público todo gasto a nivel municipal, ya sean recursos, provisiones, pagos de servicios para atender a la población o mantener estos bienes públicos. En esta línea, el gasto público para ser ejercido de manera correcta debe seguir pautas de efectividad y eficiencia. (Dutra, et al. 2022)

En una investigación con relación al gasto público, explican que este debe de manejarse con seriedad y discreción, provocando un crecimiento positivo en los servicios públicos, en pocas palabras esto busca que se esté se centre únicamente en el desarrollo y mejora de la calidad de vida de los pobladores, en especial de los más necesitados (Vargas y Zavaleta 2020).

El gasto público se debe usar de manera correcta. Por ende, la mejor ejecución del gasto y la eliminación de algunos puntos del gasto actual generarán recursos para otras áreas de mayor importancia para ejercer el gasto. Todo esto con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y social del país. (Foro Económico Mundial 2018)

El presupuesto del gasto público debe ser usado con prudencia y seriedad, provocando un real valor a los servicios públicos brindados. En pocas palabras, la gestión debe proyectarse a brindar un mejor estilo de vida de los pobladores, en especial la de los más necesitados. Lo que busca es que la gestión del presupuesto tome una perspectiva que se base en resultados de mejora para el país y su gente. (Vargas y Zabaleta 2020).

Como se sabe, el gasto público es de vital importancia y más aún en el sector de obras públicas, ya que puede combatir el desempleo en la población, debido a que se requiere de personal capacitado para el desarrollo de las mismas, por medio de una táctica adecuada. El gasto y el ingreso no pueden sobrepasarse de forma permanente. (Ramírez y López 2021)

En el ámbito local, se efectuó un estudio cuantitativo y con diseño no experimental y descriptivo, con una muestra de 30 personas. Se concluyó que en un 75 % es de nivel medio con respecto al impacto social correspondiente a la ejecución de obras a nivel de la población en el distrito de Chimbote. (Pacheco,2019).

La descentralización fiscal altera al gasto público a los gobiernos locales en Brasil, sin embargo, el tipo de efecto va a depender del gasto local y su escala, por otro lado, la participación de los ingresos por concepto de tributos aumenta el fondo para ser gastado en servicios y obras públicas para beneficio de la comunidad y pobladores en general. (Morais y Aguiar, 2021).

Para que el estado cuente con el dinero necesario para poder ejercer el gasto público, es necesario que se contribuya (pago de tributos). En Brasil, los municipios

han incrementado su propia recaudación de tributos. Durante los años 2000 a 2016, la recaudación tributaria sobre los ingresos totales aumentó de 4,5 % a 7 %. Esto quiere decir que habrá mayor dinero que se podrá destinar al gasto público para el beneficio de los brasileños (Moraris y Aguiar, 2021).

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación.

3.1.1 Tipo de Investigación:

Los estudios de enfoque cuantitativo se diferenciaron por usar datos informáticos y numéricos que fueron sometidos a pruebas para conocer la hipótesis. Lo que se buscó es expresar numéricamente el problema (Escobar et al. 2018, citado en Roca, 2022).

Es por ello que este trabajo tuvo un enfoque cuantitativo debido a que se usaron datos para expresar numéricamente a las variables en estudio.

3.1.2 Finalidad de la investigación:

Las investigaciones aplicadas brindaron soluciones a problemas y fueron usadas de manera inmediata. (Taipe, 2022)

Es una investigación aplicada, puesto que buscó dar solución a la problemática, además de que es un problema que se vive en la municipalidad en estudio.

3.1.3 Diseño de la investigación:

La investigación no experimental es aquella donde no fueron manipuladas de manera directa a las variables, debido a que solo se encontraron información acerca de las variables, en pocas palabras, no se infirió en ellas (Hernández, Fernández y Baptista, 2019 citados en Pérez, 2022)

Este trabajo es no experimental porque no se modificaron las variables de estudio.

3.1.4 Alcance de la investigación:

El alcance de investigación descriptivo-propositivo, debido a que se usaron para describir las situaciones y los eventos, así mismo midió las características y cualidades de los fenómenos que están en estudio o alguna circunstancia (Ñaupas, et al. 2018, citado por Valencia, 2021).

Finalmente, esta investigación es descriptiva porque solo se estudiaron y describieron las variables ya mencionadas anteriormente.

3.2 Variables y operacionalización.

Las variables en investigación fueron las siguientes: Gestión de obras públicas y ejecución del gasto, siendo la primera la variable independiente y la

siguiente la independiente. Para un mejor entendimiento, se realizó un cuadro de operacionalización de variables que se puede ver en los Anexos.

3.3 Población y muestra.

Población:

El siguiente trabajo de investigación tuvo como población en consideración a la municipalidad Distrital de Pimentel, debido a que en esta entidad gubernamental se desarrolló el estudio de las dos variables planteadas.

Muestra:

El estudio de la muestra se obtuvo de la información brindada por parte de la municipalidad, que corresponden a 3 obras públicas en el año 2021. De la misma manera, también se tomó en cuenta como muestra a la Gerencia de desarrollo territorial e infraestructura y la oficina general de Presupuesto, quienes nos brindaron la información de los proyectos donde se ejecutó el gasto público destinado para su desarrollo.

3.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos.

3.4.1 Técnica de recolección de datos:

Las técnicas que se utilizó en esta investigación fueron la entrevista y el análisis documental.

La entrevista técnica cuantitativa consideró características y algunos instrumentos que ayudaron a recoger información válida, confiable y garantizada, para una mayor precisión en las respuestas (Figuroa 2020, citado en Casa 2022).

El análisis documental es la técnica que permitió recopilar información de fuentes externas importantes que resulten de interés para el desarrollo y entendimiento de la investigación (Espinoza 2019 citado en Gallo 2022).

3.4.2 Instrumento de recolección de datos:

Los instrumentos que ayudaron al desarrollo de este estudio fueron; la guía del análisis documental y la guía de entrevista.

La guía de análisis documental es una técnica donde se especificó como se van a extraer algunos aspectos de información con mayor importancia, que van a ser clasificados, ordenados y analizados que el investigador pretende alcanzar. Es

una forma de asociar y organizar la información que se necesita y con la cual se llevó a cabo el desarrollo del proyecto final del caso realizado (Sánchez et al., 2018).

La guía de entrevista se estructuró tomando en consideración una serie de preguntas para poder precisar conceptos u obtener mayor información del caso o el tema en investigación (Cáceres, 2022).

3.4.3 Validez del instrumento:

En esta investigación se usaron los instrumentos de análisis documental y guía de entrevista, que fueron evaluados y posteriormente aprobados por 3 expertos en la materia.

Confiabilidad:

Estos instrumentos que fueron mencionados son confiables, ya que se sigue rigurosamente el procedimiento y los protocolos establecidos por la universidad, así mismo fue validado por 4 expertos en la materia, lo cual ayudó a una mayor confiabilidad.

3.5 Procedimientos.

El procedimiento que se usó para el primer objetivo específico fue la entrevista al gerente de infraestructura y desarrollo urbano y rural para analizar la gestión de obras públicas que se llevó a cabo en la municipalidad de Pimentel en el periodo 2021, mientras que para el segundo objetivo específico se tomó la técnica de análisis documental respecto al nivel de ejecución del gasto en la municipalidad de Pimentel, y finalmente para el tercer objetivo específico se utilizó la revisión bibliográfica.

3.6 Método de análisis de datos.

La presente investigación se consiguió a través de los instrumentos de recolección de datos ya mencionados anteriormente, que son: la entrevista, análisis documental y la revisión bibliográfica. Estas fueron trabajadas de mejor manera mediante un Excel y Microsoft Word.

3.7 Aspectos éticos.

Principio de Autonomía:

En la investigación se respetó los derechos de las personas involucradas a tomar sus propias decisiones, es decir, el consentimiento informado y voluntario de parte las personas que participaron.

Principio de beneficencia/No maleficencia:

De la misma manera, en esta investigación no se hizo daño a las personas que participaron del desarrollo del trabajo, se minimizaron los posibles riesgos que esta pueda traer.

Principio de Justicia:

En esta investigación se veló por la equidad entre los beneficios y riesgos que esta pueda generar, así mismo se priorizó la seguridad del las personas que participen de la misma.

IV. RESULTADOS.

El informe tuvo como el objetivo Determinar si la gestión de obras públicas incide en la ejecución del gasto en la Municipalidad Distrital de Pimentel; así mismo los objetivos específicos son Evaluar el nivel de ejecución del gasto de las obras públicas de la Municipalidad Distrital de Pimentel del periodo 2021, Analizar la gestión de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Pimentel del periodo 2021 y Elaborar un plan de acción para mejorar la ejecución del gasto en obras públicas de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una encuesta al jefe del área de presupuesto y al encargado de la gerencia de desarrollo territorial e infraestructura, por otro lado, se hizo un análisis documental, los cuales permitieron lograr los resultados con relación a la ejecución del gasto en obras públicas, así mismo se encontró una deficiencia en la gestión de obras públicas, esta incidió en la ejecución del gasto.

A. Análisis de gestión de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Pimentel del periodo 2021.

Para el desarrollo del segundo objetivo específico, de igual manera se aplicó la técnica de la entrevista y la guía de análisis documental, donde se procedió hacer las preguntas a los entrevistados y se recopiló la información mediante documentos evaluados, tales resultados se muestran a continuación:

Dimensión 1: Proceso de contratación:

Indicador a) Expediente técnico.

Resultado de la entrevista.

Se realizó la entrevista al Gerente de desarrollo territorial e infraestructura de la municipalidad de Pimentel, el Ing. Pedro Castro, esto para conseguir la información con respecto a nuestro primer indicador.

Tabla 1

Entrevista al ingeniero Pedro Castro sobre expediente técnico.

Pregunta de la entrevista	Respuesta del entrevistado	Análisis Crítico
Los expedientes técnicos muestran información importante, tanto técnica como económica de la obra ¿De qué manera se vela porque se cumpla lo establecido?	Los expedientes muestran toda la información necesaria para la correcta ejecución de la obra y eso está realizado de acuerdo con la norma, regida por el reglamento nacional de fiscalización y supervisión de parte del estado. Usando la norma de supervisión de la obra, que vela por su correcta ejecución.	Tal cual, como dice el ingeniero, los expedientes técnicos son de vital importancia para el desarrollo de un proyecto; sin ellos no se llevaría a cabo una obra segura y de calidad. Son la parte principal y fundamental.

Nota. Resultados de la entrevista al ing. Pedro Castro

Así mismo se revisó el expediente técnico a las 3 obras evaluadas en la investigación, esto para conocer toda la información relacionada a este proyecto tanto técnicas, como económicas.

Tabla 2

Expediente técnico obra 1

A. DATOS DE LAS FASES DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	
<i>1.- Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el PMI</i>	
Función	TRANSPORTE
División funcional	TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional	VÍAS URBANAS
Sector responsable	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto	PISTAS Y VEREDAS
<i>2.- Institucionalidad</i>	

	Fases de Ejecución-Aprobado	Fase de ejecución-Actualización	
UEI	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL	(UEIMDPT010-GEOVANI TIMANA)	PISCOYA
B. DATOS DE LA FASES DE EJECUCIÓN			
3. Lista de activos			
Componente	Activo	Descripción	Unidad de medida
INFRAESTRUCTURA	PISTA	Pavimento flexible, veredas, agua potable, red de alcantarillado y sardineles	NUMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS
INFRAESTRUCTURA	VEREDA	Pavimento flexible, veredas, agua potable, red de alcantarillado y sardineles	NUMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS

Nota. Datos extraídos del Sistema de seguimiento de inversiones (SSI). Se muestra la información técnica como económica del proyecto en ejecución, información que ayudar a saber las especificaciones técnicas, presupuestos, las fechas de ejecución, modificaciones del presupuesto, etc.

Tabla 3:

Expediente técnico obra 2

A. DATOS DE LAS FASES DE FORMULACION Y EVALUACION	
1.- Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el PMI	
Función	TRANSPORTE
División funcional	TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional	VÍAS URBANAS
Sector responsable	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Tipología de proyecto		PISTAS Y VEREDAS	
2.- Institucionalidad			
	Fases de Ejecución-Aprobado	Fase de ejecución-Actualización	
UEI	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL	(UEIMDPT010-GEOVANI PISCOYA TIMANA)	
B. DATOS DE LA FASES DE EJECUCIÓN			
3. Lista de activos			
Componente	Activo	Descripción	Unidad de medida
INFRAESTRUCTURA	PAVIMENTO	Pavimento flexible, veredas, agua potable, red de alcantarillado	NUMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS
4. Costos de inversión y programación del proyecto de inversión			
INFRAESTRUCTURA PAVIMENTO			2,307,570.33
EXPEDIENTE TÉCNICO			25,000.00
SUPERVISIÓN			115,378.52
LIQUIDACIÓN			0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO			2447,948.85
Fecha de inicio 15/11/2020		Fecha de término 18/12/2021	

Nota. Datos extraídos del Sistema de seguimiento de inversiones (SSI). Aquí se visualizó la información técnica como económica del proyecto en ejecución, información que ayudó a saber las especificaciones técnicas, presupuestos, las fechas de ejecución, modificaciones del presupuesto, etc.

Tabla 4:

Expediente técnico de la Obra 3

A. DATOS DE LAS FASES DE FORMULACION Y EVALUACION			
1.- Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el PMI			
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		
División funcional	DESARROLLO URBANO Y RURAL		
Grupo funcional	PLANEAMIENTO, DESARROLLO URBANO Y RURAL		
Sector responsable	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO		
2.- Institucionalidad			
	Fases de Ejecución-Aprobado	Fase de ejecución-Actualización	
UEI	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL	(UEIMDPT010-GEOVANI PISCOYA TIMANA)	
B. DATOS DE LA FASES DE EJECUCIÓN			
3. Lista de activos			
Componente	Activo	Descripción	Unidad de medida
INFRAESTRUCTURA	PAVIMENTO	Pavimento (capa sub base, base granular, carpeta asfáltica flexible, losa de concreto	M2
4. Costos de inversión y programación del proyecto de inversión			
INFRAESTRUCTURA PAVIMENTO			5,623,916.67
EXPEDIENTE TÉCNICO			0.00
SUPERVISIÓN			0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO			5,623,916.67
Fecha de inicio 16/12/2021		Fecha de término 14/10/2022	

Nota. Datos extraídos del Sistema de seguimiento de inversiones (SSI) Aquí se verificó información técnica como económica del proyecto en ejecución, información que ayudó a saber las especificaciones técnicas, presupuestos, las fechas de ejecución, modificaciones del presupuesto, etc.

Indicador b: Licitación pública.

Resultado de la entrevista.

Se realizó la entrevista al Gerente de desarrollo territorial e infraestructura de la municipalidad de Pimentel, el Ing. Pedro Castro, esto para conseguir la información con respecto a nuestro segundo indicador.

Tabla 5.

Entrevista al ing. Pedro Castro sobre licitación pública

Pregunta de la entrevista	Respuesta del entrevistado	Análisis crítico
<p>¿Cómo se realizan los procesos de licitación pública en la municipalidad Distrital de Pimentel?</p>	<p>La municipalidad elabora el expediente técnico y luego saca concurso, a través de terceros, y la ley también le permite realizar las obras de manera directa, siempre y cuando la empresa cuente con la logística que indica la norma.</p>	<p>Creo que lo de hacer concursos para la elección de empresas constructoras es la mejor, ya que puedes elegir entre varias opciones y quedarte con la mejor propuesta y que te brinde mayor calidad de trabajo y resultados</p>

Nota. Resultados de la entrevista al ing. Pedro Castro

Dimensión 2: Ejecución de obras públicas:

Indicadores a, b y c: Plazos de ejecución, Revisión de expedientes técnicos, Supervisión y recepción de obra.

Se realizó la entrevista al Gerente de desarrollo territorial e infraestructura de la municipalidad de Pimentel, el Ing. Pedro Castro, esto para conseguir la información con respecto a los indicadores de nuestra segunda dimensión.

Tabla 6.

Entrevista al ing. Pedro Castro sobre el atraso en las obras.

Pregunta de la entrevista	Respuesta del entrevistado	Análisis crítico
¿A qué se debe el atraso o ampliaciones de fechas de las obras en el distrito? ¿Se realizan penalidades por ellos?	Los retrasos se dan por diversos motivos ya sea por incumplimientos del contratista proveedores, sindicatos, clima, afectan el desarrollo del proyecto	Esto de los retrasos es un tema que afecta a muchas de las obras en ejecución, debido a que la gran variedad de problemas o circunstancias que se presentan en el desarrollo de la obra
¿Cómo se garantiza la supervisión y la fiscalización del desarrollo de la obra publicas?	Todo de acuerdo al reglamento, lo que se busca con la fiscalización es revisar que el trabajo sea realizado de acuerdo a lo establecido.	La fiscalización es de vital importancia en el desarrollo de la obra, esto ayuda a conocer el avance de la obra y si se esta desarrollando d manera adecuada.

Nota. Resultado de la entrevista al ing. Pedro Castro

Así mismo para comprender mejor estos indicadores se analizaron las obras en estudio para conocer los plazos de ejecución las penalidades, los encargados de la obra, etc.

Tabla 7.

Datos generales, plazos y penalidades de la obra 1.

El pago de esta obra fue en soles por valorizaciones mensuales

Plazo de la obra 180 días calendario

Contratista: consorcio construyendo Pimentel

Consultoría: ing. Mendoza Picoaga Carlos Humberto

De acuerdo a las penalidades por retrasos o ampliaciones de tiempo

$$\begin{aligned}
 \text{Penalidad} & \quad 0.1 \quad \times \\
 \text{d diaria} = & \quad \text{monto} \\
 & \quad \frac{\quad}{\quad} \\
 & \quad \text{f x plazo de días}
 \end{aligned}$$

F= 0.15 para plazos mayores a 60 días

F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días

Nota. En la presente tabla verificamos información importante de la obra, como es el tiempo de ejecución, el contratista, y los encargados de realizar la supervisión, así mismo observamos como se aplica el cálculo de la fórmula de acuerdo a las penalidades por ampliaciones o retrasos del proyecto.

Tabla 8

Datos generales, plazos y penalidades de la obra 2

El pago de esta obra fue en soles por valorizaciones mensuales

Plazo de la obra 120 días calendario

Contratista: consorcio Genesis

Consultoría: acuña vega consultores y ejecutores

E.I.R.L

De acuerdo a las penalidades por retrasos o ampliaciones de tiempo:

$$\begin{aligned}
 \text{Penalidad} & \quad 0.1 \quad \times \\
 \text{d diaria} = & \quad \text{monto} \\
 & \quad \frac{\quad}{\quad}
 \end{aligned}$$

f x plazo

de días

F= 0.15 para plazos mayores a 60 días

F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días

Nota. En la presente tabla se aprecia la información importante de la obra, como es el tiempo de ejecución, el contratista, y los encargados de realizar la supervisión, de tal manera nos percatamos como se aplica el cálculo de la fórmula de acuerdo a las penalidades por ampliaciones o retrasos del proyecto.

Tabla 9.

Datos generales, plazos y penalidades de la obra 3.

El pago de esta obra fue en soles por valorizaciones mensuales
Plazo de la obra 180 días calendario
Contratista: consultores & constructores ribab E.I.R.L.

De acuerdo a las penalidades por retrasos o ampliaciones de tiempo

Penalidad 0.1 x

d diaria = monto

f x plazo

de días

F= 0.15 para plazos

mayores a 60 días

F= 0.40 para plazos menores o

iguales a 60 días

Nota. En la presente tabla se observa información de la obra, como es el tiempo de ejecución, el contratista, y los encargados de realizar la supervisión, así mismo apreciamos como se aplica el cálculo de la fórmula de acuerdo a las penalidades por ampliaciones o retrasos del proyecto.

Dimensión 3: Procedimiento de control interno.

Indicador a y b) Eficiencia, Eficacia.

Tabla 10.

Entrevista al ing. Pedro Castro sobre los beneficios de las obras ejecutadas en el distrito.

Pregunta de la entrevista	Respuesta del entrevistado	Análisis crítico
<p>¿Las obras públicas dentro de la localidad han tenido beneficios sociales? ¿Cuáles fueron estos beneficios?</p>	<p>Las obras se realizan para el cierre de brechas, esto significa; (cierre de brechas en saneamiento, agua y desagüe para la población que lo necesita).</p>	<p>Lo que se busca con los proyectos ejecutados por parte del municipio es darle soluciones y brindarles la <i>calidad de vida adecuada a los pobladores del distrito.</i></p>
<p>¿Al término de las obras realizadas como se sabe si son eficientes o eficaces y si cumplen con los objetivos por la cual fue creada?</p>	<p>Primero la obra debe terminarse para que se practique una recepción de obra donde se ve que la obra esté debidamente ejecutada, al estar ejecutada correctamente está cumpliendo con los requisitos que pidieron para realizar los expedientes técnicos y atender a la población de acuerdo a su objetivo de cada obra</p>	<p>Para medir si la obra es eficiente y eficaz debes haber seguido al pie de la letra la información de los expedientes técnicos, además de haber sido supervisada por profesionales del tema, esto va a garantizar una obra de calidad y que satisfaga el cierre de brechas por el cual se realizó el proyecto en mención.</p>

Nota. Resultados de la entrevista al ing. Pedro Castro

B. Evaluación del nivel de ejecución de gasto en las obras públicas de la Municipalidad Distrital de Pimentel del periodo 2021.

Para el desarrollo del primer objetivo específico, se aplicó la técnica de la entrevista y la guía de análisis documental, donde se procedió a hacer las preguntas a los entrevistados y la recopilación de información mediante documentos evaluados. Tales resultados se muestran a continuación:

Dimensión 1: Presupuesto del sector público:

Indicador a) Presupuesto:

Se realizó la entrevista al jefe de la oficina de presupuesto para conseguir la información con respecto a nuestro primer indicador mencionado.

Tabla 11

Presupuesto destinado a obras en el distrito.

Pregunta de la entrevista	Respuesta del entrevistado	Análisis crítico
¿El presupuesto destinado para obras en el distrito es el adecuado para tener obras de calidad?	El presupuesto institucional es financiado por recursos propios y por transferencias de partidas previa suscripción de convenios con los ministerios respectivos y financian el cierre de brechas de cobertura.	Lo que busca el municipio con el dinero obtenido es el cierre de brechas, todo ello para el beneficio y desarrollo del distrito, (brindar una calidad de vida a los pobladores del distrito)

Fuente: Resultados de la entrevista realizada al jefe del área de Presupuesto de la MDP

Asimismo, se realizó el análisis del presupuesto destinado a las 3 obras evaluadas en la investigación, esto para conocer la cantidad de dinero que fue destinado para ello, y hasta el momento cuánto de ese dinero ha sido usado para el fin de dicho proyecto.

Tabla 12

Información general del proyecto, obra 1

DATOS GENERALES DEL PROYECTO O INVERCION	
Código único de inversiones	2454354
Nombre de la inversión	Reparación de obras exteriores
Monto de la inversión	s/. 5,182,266.63
Monto actualizado	s/. 6,133,824.84

Nota. Datos extraídos del Sistema de seguimiento de inversiones (SSI). Como se nota, el presupuesto que fue destinado para esta obra fue modificado, por temas de costos de control concurrente, costos de controversias o por cartas de fianzas, este se vio modificado y aumentó a una cifra mayor, el presupuesto inicial fue actualizado.

Tabla 13

Información general del proyecto, obra 2

DATOS GENERALES DEL PROYECTO O INVERCIÓN	
Código único de inversiones	2473782
Nombre de la inversión	Rehabilitación de las calles del sector la plata
Monto de la inversión	s/. 2,447,948.85
Monto actualizado	s/. 2,447,948.85

Nota. Datos extraídos del Sistema de seguimiento de inversiones (SSI). Por otro lado, en esta obra el presupuesto se mantuvo tal y como fue aceptado por parte de la municipalidad y el contratista, lo que quiere decir que hasta el momento no hubo costos adicionales para la ejecución del proyecto.

Tabla 14

Información general del proyecto, obra3

DATOS GENERALES DEL PROYECTO O INVERCIÓN	
Código único de inversiones	2464097

Nombre de la inversión	Rehabilitación de las calles del sector la pradera
Monto de la inversión	s/. 4,723916.67
Monto actualizado	s/. 4,723916.67

Nota. Datos extraídos del Sistema de seguimiento de inversiones (SSI). Como se muestra en esta obra el presupuesto se mantuvo tal y como fue aceptado por parte de la municipalidad y el contratista, lo que quiere decir que hasta el momento no hubo costos adicionales para la ejecución del proyecto.

Indicador b) Ingresos públicos:

Del mismo modo se realizó la entrevista al jefe de la oficina de presupuesto para conseguir la información con respecto a nuestro segundo indicador, ingresos públicos.

Tabla 15

Ingresos captados para las obras en el distrito

Pregunta de la entrevista	Respuesta del entrevistado	Análisis crítico
¿Cree usted que los ingresos públicos captados por la municipalidad son suficientes para que los pimente leños tengan una calidad de vida adecuada?	No, porque como responsable de presupuesto, puedo evidenciar que no existe un saldo de libre disponibilidad para los múltiples requerimientos de distintas unidades.	Como pimenteleño se evidencia, como dice el entrevistado, que no se cuenta con los recursos suficientes para que la población goce de una adecuada calidad de vida.

Fuente: Resultados de la entrevista realizada al jefe del área de Presupuesto de la MDP

Asimismo, se realizó el análisis de los ingresos públicos destinados a las 3 obras evaluadas en la investigación, esto para conocer cómo fue financiada la obra para su ejecución.

Dimensión 2: Desarrollo de la ejecución del gasto público.

Indicadores a, b, c y d: Certificación, Compromiso, Devengado y Pagado.

Resultado de la entrevista.

Se realizó la entrevista al jefe de la oficina de presupuesto para conseguir la información con respecto a nuestra segunda dimensión y sus indicadores, con relación a las etapas y desarrollo de la ejecución del gasto público.

Tabla 16

Como se ejecuta las fases del gasto en las obras del distrito.

Pregunta de la entrevista	Respuesta del entrevistado	Análisis crítico
¿Se cumplen de forma correcta las etapas de la ejecución del gasto para lograr los resultados establecidos de financiamiento?	Sí, porque de no cumplirse estas etapas no se aprueba el SIR, ahora en la gestión pública se están colocando filtros, desde la certificación, hasta el pago. El que certifica usa un lector de DNI y su firma electrónica, lo mismo para las demás etapas	Esto quiere decir que para la aprobación de cualquier etapa de un proyecto debe pasar necesariamente por los filtros además existe obligatoriedad de la firma electrónica.

Fuente: Resultados de la entrevista realizada al jefe del área de Presupuesto de la MDP

Por otro lado, se realizó el análisis del desarrollo de las etapas de la ejecución del gasto de las 3 obras evaluadas en la investigación, todo ello para saber cómo se dieron estas fases en dichas obras, para su mejor entendimiento y saber cuánto se aprobó de manera anual desde que empezó el proyecto.

Tabla 17.


Fases de ejecución del gasto en la obra 1.

ANO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2019	S/0.00	S/30,100	S/30,100	S/30,100	S/30,100
2020	S/0.00	S/1,066,562	S/1,066,562	S/0.00	S/0.00
2021	S/4,618,981	S/5,685,543	S/5,627,130.30	S/5,497,838.80	S/2,862,668.05
2022	S/0.00	S/3,075,372	S/2,897,313.50	S/2,799,532.12	S/2,637,899.89
2023	S/252,498	S/252,498	S/255,005.89	S/225,005.89	S/225,005.89

Nota. Datos extraídos del Sistema de seguimiento de inversiones SSI

Gráfico 1

Ejecución financiera de la obra 1

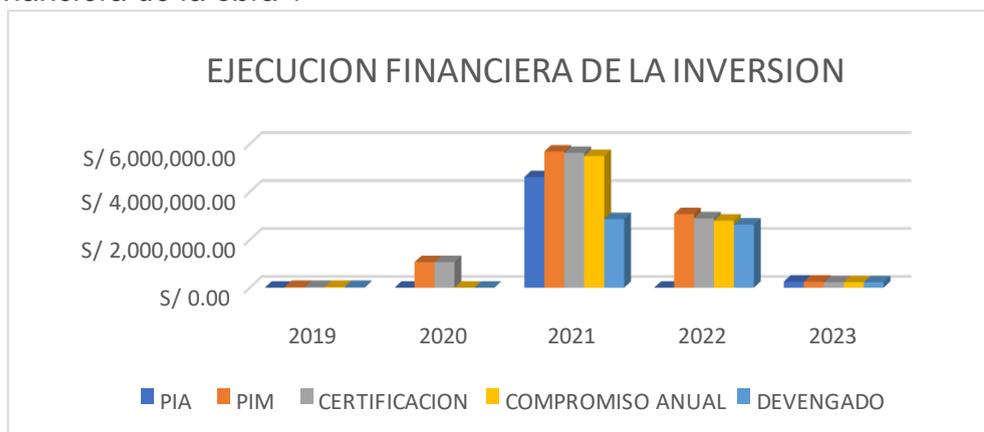

Nota. Elaboración propia de datos extraídos del SSI. En la figura se puede observar el avance de las fases de la ejecución del gasto, si bien esta ha variado conforme al avance del proyecto y a las facilidades de dinero para solventar estos gastos de forma anual en los diferentes años de desarrollo de la obra, de la misma manera se nota que la obra ya se encuentra en la fase terminal de su desarrollo.

Tabla 18


Fases de ejecución del gasto de la obra 2.

ANO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2020	S/0.00	S/1,305,627	S/1,305,627	S/0.00	S/0.00
2021	S/1,117,322	S/2,422,949	S/2,422,948.52	S/2,365,261.87	S/1,448,380.56
2022	S/0.00	S/974,569	S/0.00	S/0.00	S/0.00
2023	S/999,568	S/974,569	S/0.00	S/0.00	S/0.00

Nota. Datos extraídos del Sistema de seguimiento de inversiones SSI

Gráfico 2

Ejecución financiera de la obra 2

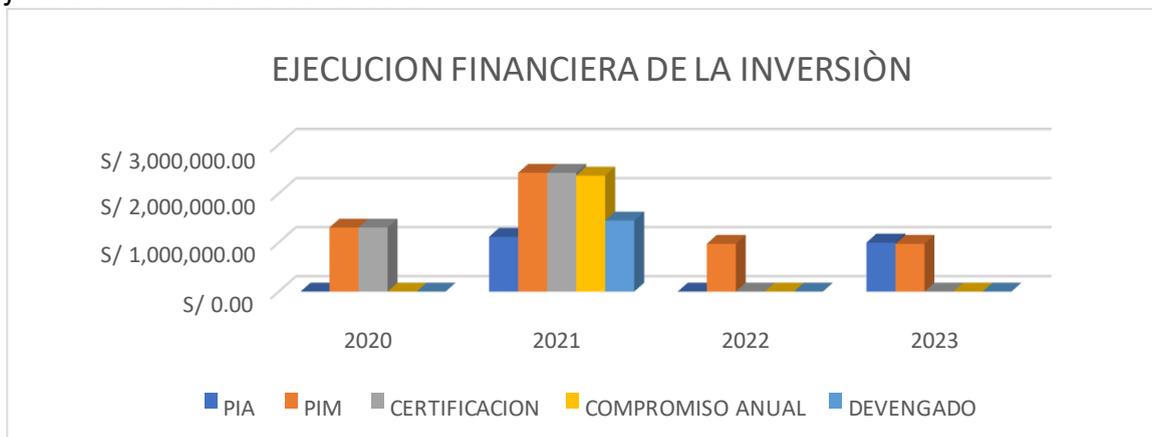

Nota. Elaboración propia de datos extraídos del SSI. En la figura se observó el avance de las fases de la ejecución del gasto, si bien esta ha variado conforme al avance del proyecto y a las facilidades de dinero para solventar estos gastos de forma anual en los diferentes años de desarrollo de la obra, así mismo pueden notar que desde el 2022 no se ha devengado ni un solo sol para el término de este proyecto, lo que indica que la obra se encuentra paralizada hasta el día de hoy.

Tabla 19

Fases de ejecución del gasto de la obra 3.


ANO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2021	S/0.00	S/4,697,247	S/4,697,246.07	S/4,315,173.44	S/2,862,668.05
2022	S/0.00	S/4,332,096	S/4,297,356.58	S/4,297,356.58	S/4,272,588.40

2023	S/26,670	S/24,769	S/0.00	S/0.00	S/0.00
------	----------	----------	--------	--------	--------

Nota. Datos extraídos del Sistema de seguimiento de inversiones SSI

Gráfico 3

Ejecución financiera de la obra 3

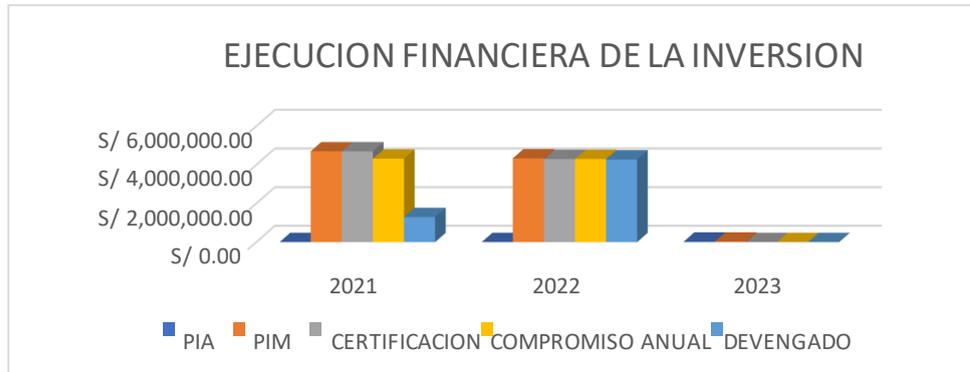

Nota. Elaboración propia de datos extraídos del SSI. En la figura se observó el avance de las fases de la ejecución del gasto, presentando variaciones en el avance del proyecto con las facilidades de dinero para solventar estos gastos de forma anual en los diferentes años de desarrollo de la obra, así mismo se puede notar que en los periodos 2021-2022 se devengó para poder avanzar el proyecto y se paralizó en el 2023 si embargo esta obra ya estaba en su etapa final del 99% del avance de la inversión.

C) Elaborar un modelo de gestión de obras públicas para mejorar la ejecución del gasto la Municipalidad Distrital de Pimentel.

En los últimos años, se observó que la municipalidad distrital de Pimentel se vio afectada por la mala gestión de obras públicas en el distrito, esto incidió de manera directa en el presupuesto inicial, ya que se modificó por costos de control concurrente, costos de controversias o por cartas de fianzas, etc.; así mismo, afectó en la ejecución del gasto, ya que se aprobó este dinero para su presupuesto inicial, pero no se ejecutan las fases de este gasto para el desarrollo y cumplimiento de la obra.

Frente a la problemática encontrada, se propuso un modelo de gestión eficiente y eficaz, es decir, darle la importancia debida a la gestión de obras en el distrito, ya que le dará una mejor calidad de vida a pobladores, podrá cerrar brechas a sectores del distrito que se encuentran alejados, además que se les podrá otorgar

con este reajuste servicios básicos como luz, agua y saneamiento, estos últimos que son de vital importancia para el desarrollo de la vida humana. Partiendo de ello, el desarrollo de nuevas infraestructuras ayudará a que Pimentel como distrito y primer balneario del norte cuente con más turismo, esto generará ingresos para nuevos proyectos; por otro lado, contar con una buena gestión ayudará a que la ejecución del gasto se realice de la mejor manera y se ejecute sus fases de forma correcta para su mejor desarrollo dentro de los plazos establecidos.

Nuevo modelo de gestión de obras públicas.

Propósito del nuevo modelo de gestión de obras públicas.

Establecer estrategias que se usarán al efectuarse el nuevo modelo de gestión, con la finalidad de mejorar el desarrollo de las obras públicas en el distrito de Pimentel.

Enfoque del nuevo modelo de gestión de obras públicas.

Está dirigido a mejorar la gestión de obras públicas en la municipalidad de Pimentel, para la obtención de obras de calidad y que satisfagan las necesidades de la población pimenteleña. Se consideran los siguientes aspectos:

- Se identificarán los problemas que provocan la mala gestión de obras públicas, ya sean problemas administrativos o técnicos al momento del desarrollo del proyecto u obra.
- Estará basado en el desarrollo de la obra, ya que se considera que en esta fase se presenta la problemática (entrega tardía de valorizaciones, lo que genera que las fases de ejecución del gasto no se realicen de manera correcta en el tiempo establecido y el desarrollo del proceso constructivo de la obra).

Alcance del nuevo modelo de gestión de obras públicas.

- Se llevará a cabo la verificación de las partidas presupuestales para la ejecución de las obras, para saber si se cumple con el precio, condiciones y garantías para el desarrollo del proyecto.

- Se revisará la consistencia de los expedientes técnicos y de su valor referencial, con la finalidad de conocer la calidad, costo y oportunidad de la obra.
- Se evaluará el proceso productivo o desarrollo de la obra, para que se cumplan las especificaciones técnicas y la normativa aplicable.
- Velar por el cumplimiento de calidad en el desarrollo de la obra, esto ayuda a que la inversión efectuada garantice el periodo útil de la obra.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

OBJETIVO GENERAL:

- Elaborar un modelo de gestión de obras públicas para mejorar la ejecución del gasto de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Evaluar la asignación presupuestal y los pagos a cuenta por valorizaciones.
- Revisar los expedientes técnicos y el proceso constructivo de las obras en estudio.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA:

Tabla 20

Evaluar la asignación presupuestal y los pagos a cuenta por valorizaciones.

PROCEDIMIENTOS	DOCUMENTACION EVALUAR	A BENEFICIOS	GASTOS ADM.
Comprobar que el PIA y el PIM se encuentren aprobados en instancias pertinentes	PIA, PIM, documentos de ejecución presupuestal y sus aprobaciones	No habrá sobre costos, pago de interés, cumplimiento de la ejecución presupuestal.	S/ 0.00
Verificar el documento de ejecución presupuestal			S/ 0.00
Verificar que el pago de valorizaciones cuente con la conformidad del supervisor	Expediente técnico contractual, contrato de la obra, valorizaciones de la obra, calendario de avances y comprobantes de pago		S/ 0.00
Corroborar que la entidad haya pagado las valorizaciones en los plazos establecidos			S/ 0.00
Constatar que la empresa contratista			

haya emitidos sus comprobantes (facturas, boletas) en el plazo estipulado			S/ 0.00
---	--	--	---------

Nota. Los datos usados son de elaboración propia

Tabla 21:

Revisar los expedientes técnicos y el proceso constructivo de las obras en estudio

PROCEDIMIENTOS	DOCUMENTACION A EVALUAR	BENEFICIOS	GASTOS ADM.
Verificar que el expediente técnico contenga: planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto base, etc.	Expedientes técnicos, bases, cotizaciones de precios, reglamentos o normativas técnicas nacionales	Obra de calidad, no habrá sobre costos ni pagos extras a supervisores, cumplimiento en la ejecución	S/ 0.00
Revisar si en el expediente técnico define: el objeto de la obra, costo de la obra y plazo de ejecución.			S/ 0.00
Evaluar los expedientes técnicos determinando la conformidad y pertinencia de los documentos que contiene.			S/ 0.00
Constatar que el contratista haya realizado su trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas	Cuaderno de obra, informes del supervisor, expediente técnico, catálogo de (materiales, insumos y maquinarias), reglamentos o normas técnicas nacionales.	la obra se realiza con eficiencia, no se presenten modificaciones técnicas ni económicas, cumplimiento de la meta física	S/ 0.00
Velar que el contratista use los materiales adecuados y estipulados en los expedientes técnicos			S/ 0.00
Confirmar que las licencias y autorizaciones hayan sido gestionadas oportunamente			S/ 0.00

Nota. Los datos usados son de elaboración propia

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA:

Tabla 22

Presupuesto para el desarrollo de la propuesta

G/P	PRESUPUESTO	
GASTOS ADM.	S/ -	
GASTOS OPER.	S/	50.00
TOTAL	S/	50.00

Nota. Los datos usados son de elaboración propia

Tabla 23

Cronograma de actividades de la propuesta

P/C	CONOGRAMA 2024											
PROCEDIMIENTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Comprobar que el PIA y el PIM se encuentren aprobados en instancias pertinentes												
Verificar el documento de ejecución presupuestal												
Verificar que el pago de valorizaciones cuente con la conformidad del supervisor												
Comprobar que la entidad haya pagado las valorizaciones en los plazos establecidos												
Constatar que la empresa contratista haya emitidos sus comprobantes (facturas, boletas) en el plazo estipulado												

Verificar que el expediente técnico contenga: planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto base, etc.												
Revisar si en el expediente técnico define: el objeto de la obra, costo de la obra y plazo de ejecución.												
Evaluar los expedientes técnicos determinando la conformidad y pertinencia de los documentos que contiene.												
Confirmar que las licencias y autorizaciones hayan sido gestionadas oportunamente												
Velar que el contratista use los materiales adecuados y estipulados en los expedientes técnicos												
Constatar que el contratista haya realizado su trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas												

Nota. Los datos usados son de elaboración propia

V. DISCUSIÓN

Para la obtención de resultados de la presente investigación se aplicaron instrumentos de recolección de datos como la entrevista, la revisión bibliográfica y la guía de análisis documental, el primer instrumento fue aplicado al Econ. Josué López Ramírez, jefe de la oficina de presupuesto y al Ing. Pedro Castro gerente del área de desarrollo territorial e infraestructura de la municipalidad distrital de Pimentel.

La entrevista y la guía de análisis documental fue validada por 3 expertos en la materia que revisaron el cuadro de operacionalización de variable y el del análisis documental, con ello se ha evaluado la relevancia y la pertinencia de nuestras preguntas y de la información que se solicitó a la propia entidad; por otro lado, la revisión bibliográfica ha sido obtenida de artículos científicos, normativas y leyes.

La investigación tiene validez externa, ya que es relevante y se puede aplicar en otros países, debido a que la mala gestión en ejecución de obras existe en la mayoría de países del mundo (subdesarrollados) que se ven perjudicados con este tipo de acciones que lo único que generan es el retraso con miras al desarrollo y crecimiento.

Para la redacción de la discusión se debe saber que hubo algunas limitaciones con el acceso a la información, esto debido a las elecciones municipales realizadas en el país. Esto generó que la municipalidad distrital de Pimentel cambie a una nueva gestión y un nuevo personal. Esto provocó el poco acceso a la información de las preguntas planteadas en las entrevistas y los documentos a revisar en la guía de análisis documental. No querían dar opiniones acerca de la anterior gestión y los proyectos que se emplearon anteriormente esto para no generar controversia y suspicacia con la información que nos puedan brindar por parte de las personas involucradas en las entrevistas.

Asimismo, por este motivo se limitó el acceso a la información de las obras que fueron gestionadas por el anterior alcalde y sus trabajadores. Estas obras que se encuentran paralizadas también por este motivo, debido a que aun la anterior gestión no entrega la documentación e información de obras para saber en qué

condiciones están, y poder terminarlas con la mayor brevedad posible para que puedan ser usadas por la población Pimenteleña.

El primer objetivo específico relacionado al Análisis de gestión de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Pimentel del periodo 2021, tiene como resultado que en el municipio se vela porque se cumpla de manera correcta lo estipulado en los expedientes técnicos de las obras, ya que son de vital importancia para el mejor desarrollo de la obra en estos se encuentre información técnica, el presupuesto, plazos de ejecución, normativa, materiales a emplear, medidas, planos, etc.

Cada uno de estos proyectos se da mediante concursos de licitación pública; así mismo se sigue la normativa del reglamento nacional de fiscalización y supervisión de parte del estado para garantizar que la obra sea de calidad, se logre el cierre de brechas por la cual es realizada y satisfaces las necesidades de la población pimenteleña.

En la investigación de Ávila (2019) manifiesta en los resultados obtenidos que los factores asociados que provocan las ampliaciones de plazos y del fallo de control de supervisión es debido a la deficiencia que presentan los expedientes técnicos, generando sobre costos y retrasos para la entrega de los proyectos aprobados. La municipalidad distrital de Pimentel presenta similitudes con respecto a esta investigación, debido a que también se ven atrasos y sobrecostos al presupuesto inicial aprobado de las 3 obras en investigación, ya que estas obras están paralizadas por diferentes motivos generando malestar y disconformidad de la población.

Según Rengifo (2021), sostiene que para el desarrollo de una obra es necesaria la aplicación de políticas públicas para la adecuada gestión municipal en el desarrollo de las obras. Esto ayudará a que la obra se desarrolle de manera correcta y que se cumpla lo estipulado en los expedientes técnicos. En cuanto a la municipalidad de Pimentel, se encuentran algunas diferencias con esta investigación, ya que no se está buscando mejorar la gestión para el adecuado desarrollo de las obras que se están ejecutando, se siguen cometiendo los mismos errores en los procesos administrativos y técnicos, esto por no existe un control o

fiscalización por parte de las entidades encargadas de supervisar el desarrollo correcto de dichos proyectos.

El segundo objetivo específico expuesto a la Evaluación del nivel de ejecución de gasto en las obras públicas de la Municipalidad Distrital de Pimentel del periodo 2021, tiene como resultado que la municipalidad distrital de Pimentel pese a que se ejecuta de manera correcta las fases de ejecución del gasto, no se está contando con el presupuesto adecuado para la aprobación de proyecto esto debido a la gran variedad de requerimientos múltiples de las unidades para la satisfacción de las necesidades, esto debido a que la municipalidad financia el presupuesto institucional para obras con recursos propios y por transferencias de partidas previa suscripción de convenios con los ministerios respectivos.

La investigación de Cleber y Miranda (2021), está basada en el planteamiento de políticas macroeconómicas para la ejecución del gasto. Esto provoca mayores restricciones en las futuras inversiones, así mismo el crecimiento positivo de estructuras de ejecución del gasto. Se encontraron diferencias con la investigación debido a que aquí se muestra que el estado está usando políticas macroeconómicas para mejorar la ejecución del gasto, estas políticas como (crecimiento del PBI, ingresos y gasto público, etc.), lo que no sucede en la municipalidad de Pimentel por la variedad de requerimientos en las distintas áreas.

La investigación de Vargas y Zavaleta (2019), para contar con el presupuesto adecuado para los diferentes requerimientos, en este caso obras públicas, es la eliminación de algunos puntos del gasto actual, todo esto para que se tenga más dinero para el desarrollo de las obras de calidad. Se establecen diferencia con relación a la municipalidad distrital de Pimentel, esto debido a que en el municipio se tienen distintos requerimientos que no son de tanta importancia, pero que aún se sigue ejecutando el gasto de manera innecesaria, este dinero podría ser destinado para otros rubros que realmente lo necesiten como es el sector de obras públicas que sirven para conectar y dar mejor calidad de vida a los pobladores.

El tercer objetivo específico referido a la elaboración de un modelo de gestión de obras públicas para mejorar la ejecución del gasto de la Municipalidad Distrital de Pimentel, se propone este nuevo modelo de gestión con la finalidad de mejorar la gestión de obras públicas para una adecuada ejecución del gasto, esto

mediante nuevos procedimientos adecuados en el desarrollo de la obra, ya que es la etapa donde se presenta la problemática ya sea en la información del expediente técnico, la asignación presupuestal o la entrega de valorizaciones, ello ayudará al mejor desarrollo de la obra y que se obtengan resultados de calidad para beneficio de la población pimenteleña.

En la investigación de Manzini, et al. (2019) indica que para la gestión adecuada de un proyecto se debe priorizar una cadena de suministros esenciales en el área de obras públicas, al contar con recursos adecuados para el mejor desarrollo de la misma, tales como una mejor gestión y comunicación constante del personal se conseguirá obras de calidad, y satisfacer las necesidades de la población. Comparado con la municipalidad distrital de Pimentel, presenta similitudes con el trabajo, ya que una adecuada gestión con mecanismos adecuados en el nuevo modelo de obras ayudará a que la obra se desarrolle de manera correcta y que esta sea de calidad.

Según Alarcón, et al., (2020) manifiesta que una buena gestión en obras públicas debe contar con las siguientes dimensiones, estratégica, económica, operativa y social, esto para conseguir resultados importantes en el desarrollo del proyecto, sin embargo, en la investigación estas dimensiones no han sido eficaces por eso no se cuenta con obras de calidad. La municipalidad de Pimentel cuenta con estas similitudes debido a que no se emplea un sistema de gestión de obras públicas adecuada, ya que no se usan las dimensiones mencionadas para el mejor desarrollo de las obras en el distrito generando atrasos en los plazos establecidos, entregan obras defectuosas, etc.

VI. CONCLUSIONES

1. Existe una incidencia en la gestión de obras públicas con la ejecución del gasto, esto se debe a que para un buen desarrollo de la obra pública se debe aprobar el presupuesto inicial y ejecutar de manera correcta las fases de ejecución del gasto para que el proyecto se realice, de lo contrario la obra no se ejecutaría de forma adecuada.

2. La gestión de obras públicas de la municipalidad distrital de Pimentel es deficiente, esto se debe a que no cuenta con un modelo de gestión adecuado, lo que genera atrasos o aplazamientos de tiempo en la ejecución de dichas obras, muchas de estas se encuentran paralizadas porque para llevar una obra de manera eficiente es necesario tomar decisiones a partir de una metodología o mecanismos idóneos.

3. El nivel de ejecución del gasto en las obras públicas del distrito de Pimentel no fue eficiente; esto se debe a la inadecuada gestión administrativa. Si bien se aprobó el presupuesto inicial de las obras en estudio, dos de estas se encuentra paralizadas debido a que no se han cumplido de forma correcta los procedimientos adecuados, como la entrega de valorizaciones en los plazos establecidos para realizar de forma adecuada las fases de ejecución del gasto.

4. El contar con un modelo de gestión de obras públicas adecuado y eficiente ayudará a una mejor ejecución del gasto y el procedimiento correcto de la obra, esto mediante mecanismos o actividades que favorezcan el desarrollo tanto administrativo como técnico en lo que respecta al avance de la obra y sus fases de ejecución.

VII. RECOMENDACIONES

Se le recomienda a la Municipalidad Distrital de Pimentel que para un buen desarrollo de una obra pública debe cumplir con los lineamientos de acuerdo a las normas legales con respecto a la ejecución de los contratos, de tal manera se ejecuten las fases de ejecución del gasto para realizar dichos proyectos.

Se sugiere a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura contar con una gestión en obras públicas adecuada para el cumplimiento del proyecto, donde se cumplan las especificaciones mostradas en los expedientes técnicos, así mismo los plazos estipulados de ejecución, y el control de calidad continuo del proceso y avances de la obra en ejecución.

Se le recomienda a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura entregar las valorizaciones en los plazos estimados para su recepción, así mismo a la oficina de Presupuesto y a la de Abastecimiento gestionar de manera correcta las fases de ejecución del gasto para el pago de dichas valorizaciones por los avances de la obra.

Se le propone a la gerencia y sus áreas involucradas implementar el nuevo modelo de gestión de obras públicas para la obtención de proyectos de calidad mediante la realización adecuada de los procedimientos, respetando lo estipulado en los expedientes técnicos para su desarrollo adecuado.

Se recomienda a los futuros investigadores continuar con estudios similares o relacionados con la gestión de obras públicas y la ejecución del gasto porque de esta manera se lograrán implementar nuevas estrategias o procedimientos que ayudarán a mejorar la gestión municipal en beneficio de la población.

REFERENCIAS

Alarcón, R., et al. (2020) Dimensiones claves de una gestión pública efectiva en gobiernos locales. Aplicación en un caso de estudio

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000600411

Alves, D., et al. (2023) Crise econômica e disparidades no gasto, oferta e utilização de serviços públicos de saúde no Brasil no período entre 2011 e 2019

<https://www.scielo.br/j/csp/a/3vpqJkVYbsh8PB9KNvcyqjd/?lang=pt#>

Arguedas, O. (2021) Elementos básicos de bioética en investigación

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000160022010000200004

Asernado, M. y Rivera, M. (2018) Ley N° 30607 en la Gestión de Obras de la Municipalidad Provincial de Arequipa, período 2018

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29922/asernado_cm.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Azevedo, U., Avalone, P., (2023) Financiamento do esporte no Brasil e Portugal: uma análise sobre a magnitude dos recursos públicos entre 2004 e 2020

<https://www.scielo.br/j/rbce/a/gxJydpTQkMqXgNB5qm5qdWr/?lang=pt#>

Banco Interamericano de Desarrollo (2018) Gasto público en América Latina registra ineficiencias de 4,4% del PIB: estudio BID

<https://www.iadb.org/es/noticias/gasto-publicoenamericalatinaregistraineficiencias-de-44-del-pib-estudio-bid>

Casa, C. (2022). Percepción de la Educación Virtual en Estudiantes y Docentes de un Instituto Superior Pedagógico de Apurímac en la Pandemia

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/79744/Casa_TCY-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cáceres I. (2022). Análisis de la educación remota en tiempos de pandemia y formación continua en posgrado en una universidad pública de Lima, 2021

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/80500/Caceres_BIM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cernichiaro, C. (2022) Incidencia del gasto público y deuda subnacional en el crecimiento económico sectorial estatal en México (2010-2018)

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S244866552022000100085&lang=es#B26

Cleber, R. y Miranda, H. (2021) Influência do gasto público no fortalecimento da centralidade de Pau dos Ferros/RN

<https://www.scielo.br/j/cm/a/J88y4TXyqKGgtrdCDVBjK9x/?lang=pt>

Comex Perú (2022) Las principales regiones del Perú con obras paralizadas.

<https://rpp.pe/economia/economia/cusco-puno-y-lima-son-las-regiones-con-mas-obras-publicas-paralizadas-noticia-1429698?ref=rpp>

CAÑAS, J. (2020) El túnel maldito del Puerto de Cádiz: la inundación que demoró durante años la obra y disparó su coste.

<https://elpais.com/economia/20220820/eltunelmalditodelpuertodecadizlainundacionquedemoroduranteanoslaobraydisparosucoste.html?fbclid=IwAR1FQohPjTxxwZydxO-YT4bh0LqVLKFYnffZtAw4EIVAEXvgkNV8vN8P67w>

Danoso, S., et al. (2019) La Ejecución del Gasto del Nuevo Sistema de Educación Escolar Pública en Chile 2018-2019: Disonancias entre la letra y espíritu de la reforma

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S19957785201900020005&lang=es

Dutra, J., et al. (2022) Determinantes do gasto público em Educação nos municípios do estado de Mato Grosso do Sul

<https://www.scielo.br/j/ensaio/a/xwpGzbjkRGg9v68FqMjgzTB/?lang=pt>

Decreto legislativo N° 1440 (2021) Normativa del mef

<https://www.mef.gob.pe/es/porinstrumento/decretolegislativo/18247-fe-de-erratas-239/file>

Donoso, S. et al (2019) La Ejecución del Gasto del Nuevo Sistema de Educación Escolar Pública en Chile 2018-2019: Disonancias entre la letra y espíritu de la reforma

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S199577852019000200005&script=sci_abstract&tlng=en

Huárac, P., et al. (2022) Participatory budget and public expenditure management

<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085131446879&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=gasto+publico&sid=7c387718fe8fcef4a260ae359c6710d0&sot=b&sdt=b&sl=28&s=TITLEABSKEY%28gasto+publico%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=>

Foro Económico Mundial (2018), Índice Global Competitividad 2013-2014.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665952X2019000100054&lang=es

Gallo, M. (2022) Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en los Alumnos del Primer Año de una Universidad Privada de Morropón, 2021 https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/78870/Gallo_NMG-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Manzini, P., Lubbe, S., Klopper, R. & Meyer, J. (2019). Improvement of infrastructure delivery through effective supply chain management in the Department of Public Works and Highways of the Northwest Province. <https://hdl.handle.net/10520/EJC-1a9f9fb55b>

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). Directiva para la ejecución presupuestaria. Lima, Perú. <https://www.mef.gob.pe/es/normatividadsp9867/por-instrumento/directivas/12276-directiva-n-005-2010-ef-76-01deejecucion-presupuestaria-modificada-por-r-d-n-027-2014-ef-50-01/file>

Morais, K., Aguiar, P. (2021) Public expenditure composition and fiscal decentralization in Brazilian local governments: an analysis through unconditional quantile regression with longitudinal data <https://www.scielo.br/j/rap/a/wQsKcsLc7kKNRVP8wnq7QDg/?lang=en>

Ponce, J., Loor, I. (2020) Differences between reference and executed budget in public bidding processes http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S252879072020000400001&lang=es

Ramírez, E., López, F. (2021) Gasto público y crecimiento en América Latina: la ley de Wagner y la hipótesis de Keynes https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018516672021000200109&lang=es

Rengifo, R. (2021) Gestión de la producción y avance de las obras civiles municipales, Rioja 2021

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/82237/Rengifo_MR-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rodríguez, P. (2018). Los procesos de contrataciones de bienes, servicios y la ejecución de obras en el Proyecto Especial Sierra centro Sur – zonal Cusco

<https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2558/TM%20ADGp%204174%20R1%20-%20Rodriguez%20Arosquipa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Peña, C. (2021) Gasto público y crecimiento económico en Venezuela: Un análisis de cointegración y causalidad (1950 – 2017)

<https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/37281/40657>

Pacheco, V. (2019) Impacto social de las obras públicas ejecutadas en el distrito de Nuevo Chimbote, 2018.

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29635/Pacheco_MV_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Salgado, R., Gerónimo, F. (2021) Public value in social projects implementation: potable water and sanitation in Tegucigalpa, 2017-2019

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S247792452021000200125&lang=es&fbclid=IwAR0CbTQz6pb8M8V1k25oOquPk1EfiL_mytEACnDJvWP93TN4adNU7sEQ40

Prialé, G. (2021), La fallida gestión del gasto público en obras.

<https://gestion.pe/opinion/lafallidagestiondelgastopublicoenobrasnoticia/?ref=gesr&fbclid=IwAR23pEzvvVeNFbSDqgQ2B3RiHTz1i7GRDpEScyV12mNj9Np7MGE64FgDWI>

Salinas, P. (2019) Obras inconclusas con millonaria inversión son un peligro por El Niño

https://larepublica.pe/sociedad/884873-obras-inconclusas-conmillonaria-inversion-sonunpeligroporelnino/?fbclid=IwAR30UaqvZqX0171oPXZgXsq9NIq1G8Kf9UIRmn2_zjBNXfI9wjtvlaEt0

Sánchez, I. (2018) Gasto público, índice de competitividad y política social en México.

<https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/58918/61912>

Taipe, M. (2022) Gobernanza del agua y sostenibilidad de la agricultura familiar en una comisión de usuarios de riego en Cañete

<https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/80706/TaipeCMHSuence=1&isAllowed=y>

Texto único ordenado de la ley N° 30225 ley de contrataciones del estado

<https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0022/tuo-ley-30225.pdf>

Tello, C. (2020) Austeridad, gasto público y crecimiento económico con justicia social

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665952X2019000100054&lang=es

Pérez, D. (2022) Acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las IE multigrado de la UGEL Huancabamba, 2021

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/78339/P%c3%a9rez_QD-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Roca, A. (2022) Educación virtual y niveles de estrés emocional en tiempos de pandemia en adolescentes de un colegio privado de Abancay, 2021.

<https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/79925/RocaUASD.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Vinces, R. (2021) Gestión administrativa y calidad de las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Awajun, 2016-2019

<https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/52573/VincesMRDP-SD.pdf?sequence=1>

Vargas, J., Zavaleta, W. (2020) The management of the budget for results and the quality of expenditure in local governments

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S16688708202000020002&lang=pt

Vieira, F., et al. (2020) Gasto total dos municípios em atenção primária à saúde no Brasil: um método para ajuste da despesa declarada de 2015 a 2020

<https://www.scielo.br/j/csp/a/MnRQRzcnqxJCdjTBmmLQHhD/?format=pdf&lang=>

ANEXOS

Anexo: Tabla de operacionalización de variables

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Definición conceptual	Definición Operacional	Dimensión	Indicadores	Técnica de recolección
Variable dependiente : Gestión de obras públicas	Es el manejo correcto de recursos con los que se dispone para el desarrollo del proyecto. (Asenardo y Rivera, 2018)	fundamental mecanismo de ejecución e integración para el desarrollo de proyectos. (Triveño, 2018)	Proceso de Contratación	Expediente técnico Licitación Pública	Razón
			Ejecución de obras públicas	Plazos de ejecución Revisión de expediente técnico Supervisión y recepción de la obra	Razón
			Análisis de la obra	Eficiencia Eficacia Económica Transparencia	Razón
Variable independiente	Es el proceso de cumplimiento	aplicación de fondos con la	Presupuesto o del sector público	Presupuesto Ingresos públicos	Razón

Ejecución del Gasto	de las obligaciones del gasto, proporcionando fondos para la provisión de bienes y servicios públicos (Barbaran, 2022)	finalidad de que el país cumpla sus metas y objetivos (Nguyen, 2019)	Desarrollo de la ejecución del gasto público	Certificación Compromiso Devengado Pagado	Razón
---------------------	--	--	--	---	-------

Anexo: Instrumentos de recolección de datos

Entrevista para el gerente de infraestructura y desarrollo urbano y rural de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

Objetivo: La entrevista planteada, en el presente cuestionario cuyo objetivo es recopilar información relevante para desarrollar el trabajo de investigación

“Gestión de obras públicas y su incidencia en la ejecución del gasto en la municipalidad distrital de Pimentel.”.

Entidad: Municipalidad Distrital de Pimentel

Entrevistado:

1. Los expedientes técnicos muestran información importante, tanto técnica como económica de la obra ¿De qué manera se vela porque se cumpla lo establecido?

2. ¿Cómo se realizan los procesos de licitación pública en la municipalidad Distrital de Pimentel?

3. ¿A qué se debe el atraso o ampliaciones de fechas de las obras en el distrito?
¿Se realizan penalidades por ello?

4. ¿Cómo se garantiza la supervisión y fiscalización del desarrollo de las obras públicas?

5. ¿Las obras públicas dentro de la localidad han tenido beneficios sociales?
¿Cuáles fueron estos beneficios?

6.- ¿Al término de las obras realizadas como se sabe si son eficientes o eficaces y si cumplen con los objetivos por la cual fue creada?

Entrevistado:

1. ¿Se cumplen de forma correcta las etapas de la ejecución del gasto para lograr los resultados establecidos de financiamiento?

2. ¿Cree usted que los ingresos públicos captados por la municipalidad son suficientes para que los pimenteleños tengan una calidad de vida adecuada?

3. ¿El presupuesto destinado para obras en el distrito, es el adecuado para tener obras de calidad?

GUÍA DE ANALISIS DOCUMENTAL

VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES	DOCUMENTACIÓN A EVALUAR	PRETENDE MEDIR
Gestión de obras públicas	Proceso de contratación	Expediente técnico	EXPEDIENTE TECNICO, CONSULTA AMIGABLE DEL MEF, SSI MEF	El cumplimiento de los principios que rigen las contrataciones.
		Licitación pública		
	Ejecución de obras públicas	Plazo de ejecución		Cumplir con lo establecido de acuerdo al contrato entre ambas partes (calidad, costo, tiempo y alcance de la obra.
		Revisión de expedientes técnicos		
		Supervisión y recepción de obra		
	Procedimiento de control interno	Eficiencia		Nivel de cumplimiento de la normativa del control interno.
		Eficacia		
		Estructura económica		
		Transparencia		
	VARIABLE	DIMENSIÓN		INDICADORES
Ejecución del gasto	Presupuesto del sector público	Presupuesto	SIAF (PIA), CONSULTA AMIGABLE DEL MEF DEL PORTAL DE INFORMACION PRESUPUESTARIA, SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI MEF).	El % utilizado para la ejecución del gasto.
		Ingresos públicos		
	Desarrollo de la ejecución del gasto público	Certificación		Corroborar que las etapas del desarrollo de ejecución se apliquen de manera adecuada y que estén estipuladas según la ley.
		Compromiso		
		Devengado		
		Pagado		

Anexo: Modelo de consentimiento, formato UCV

Ciudad, 09 de mayo del 2023

Señor (a):
Rosa Elena Pizarro Piscoya
Gerente Municipal
Municipalidad Distrital de Pimentel

Presente. -

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez manifestarle que dentro de mi formación académica en la experiencia curricular de investigación del X ciclo, se contempla la realización de una investigación con fines netamente académicos /de obtención de mi título profesional al finalizar mi carrera.

En tal sentido, considerando la relevancia de su organización, solicito su colaboración, para que pueda realizar mi investigación en su representada y obtener la información necesaria para poder desarrollar la investigación titulada: "GESTIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCION DEL GASTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 2021 ". En dicha investigación me comprometo a mantener en reserva el nombre o cualquier distintivo de la empresa, salvo que se crea a bien su socialización.


Se adjunta la carta de autorización de uso de información en caso que se considere la aceptación de esta solicitud para ser llenada por el representante de la empresa.

Agradeciéndole anticipadamente por vuestro apoyo en favor de mi formación profesional, hago propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,



Castillo Niquen Leandro
DNI: 73144121



Gamarra Nizama Pedro
DNI: 74072586

AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN DE EMPRESA

Yo Marco Antonio Nejosup Rivas
(Nombre del representante legal o persona facultada en permitir el uso de datos)
identificado con DNI 42136545, en mi calidad de Gerente Municipal (e)
(Nombre del puesto del representante legal o persona facultada en permitir el uso de datos)
del área de Gerencia Municipal
(Nombre del área de la empresa)
de la empresa Municipalidad Distrital de Pimentel
(Nombre de la empresa)
con R.U.C N° 20164032613, ubicada en la ciudad de

OTORGO LA AUTORIZACIÓN,

Al señor(a, ita,) Castillo Niquen Leandro Arturo, Gamarra Nizama Pedro Alejandro

Identificado(s) con DNI N° 73144121, 74072586 de la (X) Carrera profesional Contabilidad para que utilice la siguiente información de la empresa:

En nombre de la entidad gubernamental e información a fines de cumplir con el desarrollo del tema de la investigación en curso.

con la finalidad de que pueda desarrollar su () Informe estadístico, () Trabajo de Investigación, (x) Tesis, para optar al grado de () Bachiller, o (x) Título Profesional.

Indicar si el Representante que autoriza la información de la empresa, solicita mantener el nombre o cualquier distintivo de la empresa en reserva, marcando con una "X" la opción seleccionada,

- () Mantener en Reserva el nombre o cualquier distintivo de la empresa; o
(x) Mencionar el nombre de la empresa.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Abog. Marco Antonio Nejosup Rivas
GERENTE MUNICIPAL (E)

Firma y sello del Representante Legal

DNI:

El Estudiante declara que los datos emitidos en esta carta y en el Trabajo de Investigación, en la Tesis son auténticos. En caso de comprobarse la falsedad de datos, el Estudiante será sometido al inicio del procedimiento disciplinario correspondiente; asimismo, asumirá toda la responsabilidad ante posibles acciones legales que la empresa, otorgante de información, pueda ejecutar.


Firma del Estudiante

DNI: 73144121


Firma del Estudiante

DNI: 74072586



**ANEXO 3 DIRECTIVA DE INVESTIGACIÓN N° 001-2022-VI-UCV
AUTORIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA PUBLICAR SU IDENTIDAD EN
LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES**

Datos Generales

Nombre de la Organización:	RUC: 20164032613
Municipalidad Distrital de Pimentel	
Nombre del Titular o Representante legal: Marco Antonio Neciosup Rivas	
Nombres y Apellidos Castillo Niquen Leandro Arturo Gamarra Nizama Pedro Alejandro	DNI: 73144121 74072586

Consentimiento:

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º, literal "f" del Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo ^(*), autorizo , no autorizo publicar LA IDENTIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, en la cual se lleva a cabo la investigación:

Nombre del Trabajo de Investigación Gestión de obras públicas y su incidencia en la ejecución del gasto en la municipalidad distrital de Pimentel	
Nombre del Programa Académico: Escuela de Contabilidad	
Autor: Nombres y Apellidos Castillo Niquen Leandro Arturo Gamarra Nizama Pedro Alejandro	DNI 73144121 74072586

En caso de autorizarse, soy consciente que la investigación será alojada en el Repositorio Institucional de la UCV, la misma que será de acceso abierto para los usuarios y podrá ser referenciada en futuras investigaciones, dejando en claro que los derechos de propiedad intelectual corresponden exclusivamente al autor (a) del estudio.

Lugar y Fecha:


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

 Abog. Marco Antonio Neciosup Rivas
 Representante Legal
 Firma y sello del Representante Legal

(*) Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo-Artículo 7º, literal "f" Para difundir o publicar los resultados de un trabajo de investigación es necesario mantener bajo anonimato el nombre de la institución donde se llevó a cabo el estudio, salvo el caso en que haya un acuerdo formal con el gerente o director de la organización, para que se difunda la identidad de la institución. Por ello, tanto en los proyectos de investigación como en los informes o tesis, no se deberá incluir la denominación de la organización, pero sí será necesario describir sus características.

Anexo: Matriz Evolución por juicio de expertos, formato UCV

Certificado de validez de contenido del instrumento.

MD= Muy en desacuerdo D= desacuerdo A= Acuerdo MA= Muy de acuerdo

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹				Relevancia ²				Claridad ³				Sugerencias
		MD	D	A	MA	MD	D	A	MA	MD	D	A	MA	
	GESTIÓN DE OBRAS PUBLICAS													
1	Los expedientes técnicos muestran información importante, tanto técnica como económica de la obra ¿De qué manera se vela porque se cumpla lo establecido?			X				X				X		
2	¿Cómo se realizan los procesos de licitación pública en la municipalidad Distrital de Pimentel?			X				X				X		
3	¿A qué se debe el atraso o ampliaciones de fechas de las obras en el distrito? ¿Se realizan penalidades por ello?		X					X					X	
4	¿Cómo se garantiza la supervisión y fiscalización del desarrollo de las obras públicas?		X					X					X	
5	¿Las obras públicas dentro de la localidad han tenido beneficios sociales? ¿Cuáles fueron estos beneficios?			X				X				X		
6	¿Al término de las obras realizadas como se sabe si son eficientes o eficaces y si cumplen con los objetivos por la cual fue creada?			X				X				X		

EJECUCION DEL GASTO													
1	¿Se cumplen de forma correcta las etapas de la ejecución del gasto para lograr los resultados establecidos de financiamiento?			X			X				X		
2	¿Cree usted que los ingresos públicos captados por la municipalidad son suficientes para que los pimenteleños tengan una calidad de vida adecuada?			X		X				X			
3	¿El presupuesto destinado para obras en el distrito, es el adecuado para tener obras de calidad?		X				X			X			

Certificado de validez de contenido del instrumento.

MD= Muy en desacuerdo

D= desacuerdo

A= Acuerdo

MA= Muy de acuerdo

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹				Relevancia ²				Claridad ³				Sugerencias
		MD	D	A	MA	MD	D	A	MA	MD	D	A	MA	
	GESTIÓN DE OBRAS PUBLICAS													
1	Los expedientes técnicos muestran información importante, tanto técnica como económica de la obra ¿De qué manera se vela porque se cumpla lo establecido?			X				X				X		
2	¿Cómo se realizan los procesos de licitación pública en la municipalidad Distrital de Pimentel?			X				X				X		
3	¿A qué se debe el atraso o ampliaciones de fechas de las obras en el distrito? ¿Se realizan penalidades por ello?				X			X					X	
4	¿Cómo se garantiza la supervisión y fiscalización del desarrollo de las obras públicas?				X			X					X	
5	¿Las obras públicas dentro de la localidad han tenido beneficios sociales? ¿Cuáles fueron estos beneficios?				X			X				X		
6	¿Al término de las obras realizadas como se sabe si son eficientes o eficaces y si cumplen con los objetivos por la cual fue creada?				X				X				X	

EJECUCION DEL GASTO													
1	¿Se cumplen de forma correcta las etapas de la ejecución del gasto para lograr los resultados establecidos de financiamiento?		X					X					X
2	¿Cree usted que los ingresos públicos captados por la municipalidad son suficientes para que los pimenteleños tengan una calidad de vida adecuada?			X				X					X
3	¿El presupuesto destinado para obras en el distrito, es el adecuado para tener obras de calidad?		X					X					X

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Mg: BRAVO PASTOR YAMES YORDAN DNI 80329252

Especialidad del validador: MAESTRO EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS MBA

Nº de años de Experiencia profesional: 17 AÑOS

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Chiclayo 05 de junio del 2023



Yames Yordan Bravo Pastor
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT 04-2101

Firma del Experto Informante.
Especialidad

Certificado de validez de contenido del instrumento.

MD= Muy en desacuerdo D= desacuerdo A= Acuerdo MA= Muy de acuerdo

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹				Relevancia ²				Claridad ³				Sugerencias
		MD	D	A	MA	MD	D	A	MA	MD	D	A	MA	
	GESTIÓN DE OBRAS PUBLICAS													
1	Los expedientes técnicos muestran información importante, tanto técnica como económica de la obra ¿De qué manera se vela porque se cumpla lo establecido?				X				X				X	
2	¿Cómo se realizan los procesos de licitación pública en la municipalidad Distrital de Pimentel?				X				X				X	
3	¿A qué se debe el atraso o ampliaciones de fechas de las obras en el distrito? ¿Se realizan penalidades por ello?			X					X			X		
4	¿Cómo se garantiza la supervisión y fiscalización del desarrollo de las obras públicas?			X					X			X		
5	¿Las obras públicas dentro de la localidad han tenido beneficios sociales? ¿Cuáles fueron estos beneficios?				X			X				X		
6	¿Al término de las obras realizadas como se sabe si son eficientes o eficaces y si cumplen con los objetivos por la cual fue creada?				X				X				X	

EJECUCION DEL GASTO													
1	¿Se cumplen de forma correcta las etapas de la ejecución del gasto para lograr los resultados establecidos de financiamiento?			X					X				X
2	¿Cree usted que los ingresos públicos captados por la municipalidad son suficientes para que los pimenteleños tengan una calidad de vida adecuada?				X				X				X
3	¿El presupuesto destinado para obras en el distrito, es el adecuado para tener obras de calidad?			X				X					X

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir No aplicable

Chiclayo, 18 de mayo del 2023

Apellidos y nombres del juez evaluador: Mg. María Yolanda Barrueto Brambilla DNI: 43651259

Especialidad del evaluador: Contabilidad

Nº de años de Experiencia profesional: 20



Mg. CPC. María Yolanda
Barrueto Brambilla
Rón. 04 - 3449

Firma

¹ **Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

² **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

VALIDACIÓN DE GUÍA DOCUMENTAL

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: NIVEL DE EJECUCION DEL GASTO EN OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIIPALIDAD DE PIMENTEL

N.º	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSIÓN 1: Presupuesto del sector publico							
1	SIAF (PIA)	X		X		X		
2	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF DEL PORTAL DE INFORMACION PRESUPUESTARIA	X		X		X		
3	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI MEF).	X		X		X		
	DIMENSIÓN 2: Desarrollo de la ejecución de gasto publico	Si	No	Si	No	Si	No	
4	SIAF (PIA)	X		X		X		
5	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF DEL PORTAL DE INFORMACION PRESUPUESTARIA	X		X		X		
6	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI MEF).	X		X		X		
	DIMENSIÓN 3: Proceso de contratación	Si	No	Si	No	Si	No	
5	EXPEDIENTE TECNICO	X		X		X		
6	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF	X		X		X		
7	SSI MEF	X		X		X		
	DIMENSIÓN 4: Ejecución de obras publicas	Si	No	Si	No	Si	No	
8	EXPEDIENTE TECNICO	X		X		X		
9	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF	X		X		X		
10	SSI MEF	X		X		X		
	DIMENSIÓN 5: Análisis de obra	Si	No	Si	No	Si	No	
11	EXPEDIENTE TECNICO	X		X		X		
12	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF	X		X		X		
13	SSI MEF	X		X		X		


Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Chiclayo, 18 de mayo del 2023

Apellidos y nombres del juez evaluador: Mg. María Yolanda Barrueto Brambilla DNI: 43651259

Especialidad del evaluador: Contabilidad



Mg. CPC. María Yolanda
Barrueto Brambilla
Memb. 04 - 3449

Firma

¹ **Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

² **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: NIVEL DE EJECUCION DEL GASTO EN OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIIPALIDAD DE PIMENTEL

N.º	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSIÓN 1: Presupuesto del sector publico							
1	SIAF (PIA)					X		
2	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF DEL PORTAL DE INFORMACION PRESUPUESTARIA					X		
3	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI MEF).					X		
	DIMENSIÓN 2: Desarrollo de la ejecución de gasto publico	Si	No	Si	No	Si	No	
4	SIAF (PIA)					X		
5	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF DEL PORTAL DE INFORMACION PRESUPUESTARIA					X		
6	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI MEF).					X		
	DIMENSIÓN 3: Proceso de contratación	Si	No	Si	No	Si	No	
5	EXPEDIENTE TECNICO					X		
6	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF					X		
7	SSI MEF					X		
	DIMENSIÓN 4: Ejecución de obras publicas	Si	No	Si	No	Si	No	
8	EXPEDIENTE TECNICO					X		
9	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF					X		
10	SSI MEF					X		
	DIMENSIÓN 5: Análisis de obra	Si	No	Si	No	Si	No	
11	EXPEDIENTE TECNICO					X		
12	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF					X		
13	SSI MEF					X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez evaluador: LELANGUI QUINDE MARINS DNI. 06789915
04 de 07 del 2023

Especialidad del evaluador: GESTIÓN PÚBLICA



[Handwritten Signature]
C.P.C. MARINATREANGUI QUINDE
MAT. 04-2236

Firma

¹ **Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

² **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: NIVEL DE EJECUCION DEL GASTO EN OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIIPALIDAD DE PIMENTEL

N.º	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSIÓN 1: Presupuesto del sector publico							
1	SIAF (PIA)	X		X		X		
2	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF DEL PORTAL DE INFORMACION PRESUPUESTARIA	X		X		X		
3	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI MEF).	X		X		X		
	DIMENSIÓN 2: Desarrollo de la ejecución de gasto publico	Si	No	Si	No	Si	No	
4	SIAF (PIA)	X		X		X		
5	CONSULTA AMIGABLE DEL MEF DEL PORTAL DE INFORMACION PRESUPUESTARIA	X		X		X		
6	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI MEF).	X		X		X		
	DIMENSIÓN 3: Proceso de contratación	Si	No	Si	No	Si	No	
5	EXPEDIENTE TECNICO	X		X		X		
6	CONSULTA AMIGLABLE DEL MEF	X		X		X		
7	SSI MEF	X		X		X		
	DIMENSIÓN 4: Ejecución de obras publicas	Si	No	Si	No	Si	No	
8	EXPEDIENTE TECNICO	X		X		X		
9	CONSULTA AMIGLABLE DEL MEF	X		X		X		
10	SSI MEF	X		X		X		
	DIMENSIÓN 5: Análisis de obra	Si	No	Si	No	Si	No	
11	EXPEDIENTE TECNICO	X		X		X		
12	CONSULTA AMIGLABLE DEL MEF	X		X		X		
13	SSI MEF	X		X		X		

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Mg: BRAVO PASTOR YAMES YORDAN DNI 80329252

Especialidad del validador: MAESTRO EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS MBA

Nº de años de Experiencia profesional: 17 AÑOS

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Chiclayo 05 de junio del 2023



Yames Yordan Bravo Pastor
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT 04-2101

Firma del Experto Informante.
Especialidad

Anexo: Resultado de similitud programa Turnitin

Feedback Studio - Google Chrome
ev.turnitin.com/app/carta/es/?u=1088032488&tro=103&lang=es&o=2133221634&ts=1

feedback studio Leandro Arturo Castillo Ñiquen | Gestión de obras públicas y su incidencia en la ejecución del gasto en la municipalidad distrital de Pimentel 2021

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

TÍTULO DE LA TESIS
Gestión de obras públicas y su incidencia en la ejecución del gasto en la municipalidad distrital de Pimentel 2021

AUTOR (ES):
Castillo Ñiquen, Leandro Arturo (orcid.org/0000-0002-2219-4518)
Gamarra Nizama, Pedro Alejandro (orcid.org/0000-0002-6127-9717)

ASESOR(A):
Suárez Santa Cruz, Liliana Del Carmen (orcid.org/0000-0003-2560-7768)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
FINANZAS (Gestión Pública)

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:
Desarrollo Económico y Responsabilidad social

CHICLAYO— PERÚ
(2023)

Página: 1 de 45 | Número de palabras: 9704

Versión sólo texto del informe | Alta resolución | Activado

19°C Bruma | 02:55 p.m. 18/07/2023

Resumen de coincidencias

17 %

Se están viendo fuentes estándar

Ver fuentes en inglés (Beta)

Coincidencias

Número	Fuente	Porcentaje
1	Entregado a Universidad... Trabajo del estudiante	4 %
2	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	3 %
3	hdl.handle.net Fuente de Internet	2 %
4	1library.co Fuente de Internet	1 %
5	docslide.us Fuente de internet	1 %
6	prodapp.seace.gob.pe Fuente de Internet	1 %
7	www.slideshare.net Fuente de internet	1 %
8	Entregado a Pontificia ... Trabajo del estudiante	<1 %
9	Entregado a Universidad... Trabajo del estudiante	<1 %
10	vdocumento.com Fuente de Internet	<1 %
11	es.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %

IMÁGENES DEL PROYECTO 01:

REPARACIÓN DE OBRAS EXTERIORES; EN EL (LA) CALLES MIGUEL GRAU CUADRAS 01-04 TORRES PAZ CUADRAS 01-06 CHICLAYO CUADRAS 02-08 JOSE QUIÑONES CUADRAS 02-08 BUENOS AIRES CUADRAS 04, 05 FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 08 JOSE BALTA CUADRAS 05,06,07,08 LIMA CUADRAS 05,06,07,08 DEL CENTRO URBANO DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE



Estado de la calle Chiclayo cuadras 02-08 en la actualidad



Estado de la calle Miguel Grau cuadra 01-04 en la actualidad



Estado de la calle Torrez Paz cuadra 01-06 en la actualidad



Estado de la calle Francisco Bolognesi cuadra 08 en la actualidad



Estado de la cuadra Buenos Aires cuadra 04 – 05 en la actualidad



Estado de la Calle José Quiñonez cuadra 08 en la actualidad


IMÁGENES DEL PROYECTO 02:
REHABILITACIÓN DE CALLES DEL SECTOR LA PLATA, DEL DISTRITO DE
PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE4



Se hizo la visita al sector Pradera en Pimentel y se encontró solo una calle con asfalto, esto habla del poco avance ya la deficiente gestión de la municipalidad con este sector.

IMÁGENES DEL PROYECTO 03:

REHABILITACION DE CALLES DEL SECTOR LA PRADERA, DEL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

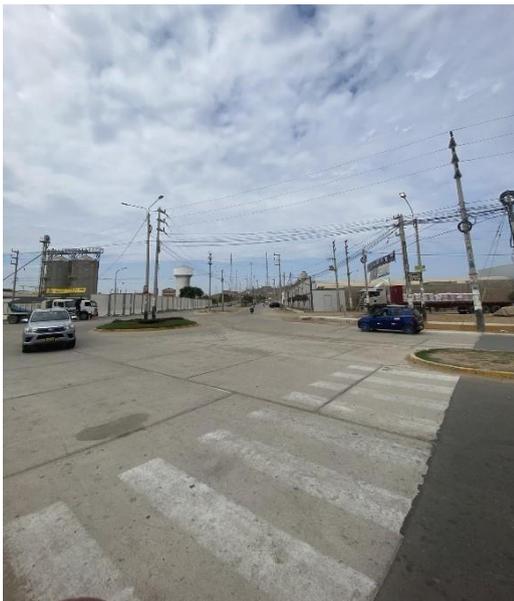

Se realizo la visita a el sector Pradera y aquí se encontró un gran avance en las calles que están involucradas en la rehabilitación del proyecto, sin embargo, existe aún algunas calles o tramos de calle que no se culminan.
