



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA
EN GESTIÓN PÚBLICA**

Actuaciones Preparatorias y Contratación de Obras públicas en una
Municipalidad Provincial – 2022

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Maestro en Gestión Pública

AUTOR:

Salazar Moreno, Jesus Enrique ([orcid.org/ 0000-0003-2076-625X](https://orcid.org/0000-0003-2076-625X))

ASESOR:

Dr. Aguirre Espinoza, Edwards Jesus (orcid.org/0000-0002-5514-6707)

CO – ASESOR:

Dr. Yache Cuenca, Eduardo Javier (orcid.org/0000-0001-9434-3351)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo Económico, Empleo y Emprendimiento

TRUJILLO – PERÚ

2023

Dedicatoria

- *Aún sigues vivo en lo más hondo de mi ser y si algo habré de ofrecerte hoy en la distancia infinita; es ese algo que tú mismo construiste antes de partir: Para ti **Henry Antonie** hijo de mi alma, en el Cielo...*
- *Construyeron todo un palacio de fuerza para cristalizar este trabajo, fueron el soporte en los días y noches de sacrificio. Pero hoy en la cúspide del logro alcanzado, son los verdaderos dueños eternos de mis anhelos: Para mi **Mirtha, Hisella, Brigitte, Jesmark's y Jesús Enrique**, familia adorada...*
- *Les debo el ser que soy, y en mis triunfos y fracasos presentes siempre estuvieron. Hoy en la vicisitud de su adorable ancianidad fueron los que impulsaron a la consolidación de mis logros: Para **Macario** padre mío en el Cielo y **Brígida**, adorada madre en el regocijo de mi alma y mi vida...*

El Autor.

Agradecimiento

- *Al Señor de Señores, dueño de la justicia como virtud más grande que la humanidad tenga en sus manos administrar: A **Dios** verdadero Maestro.*
- *A aquella Institución encargada de formar a los verdaderos hombres del mañana, con hondo agradecimiento: A la **Universidad César Vallejo**.*
- *Al Maestro, aquel hombre encargado pulir los anhelos de los estudiantes, aquel cuya voluntad significó la firme consolidación de este trabajo: Al **Dr. Edwards Jesús Aguirre Espinoza**, al Asesor con cariño.*

El Autor.

Índice de contenidos

Carátula	i
Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
Índice de figuras.....	vi
Resumen	vii
Abstract.....	viii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO	5
III. METODOLOGÍA.....	12
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	12
3.2. Variables y operacionalización	13
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis.....	15
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	18
3.5. Procedimientos.....	19
3.6. Método de análisis de datos	19
3.7. Aspectos éticos	20
IV. RESULTADOS	21
4.1. Descripción.....	21
4.2. Resultado de las variables de investigación	21
4.3. Prueba de normalidad	26
4.4. Prueba de hipótesis.....	27
V. DISCUSIÓN.....	31
VI. CONCLUSIONES	35
VII. RECOMENDACIONES	36
REFERENCIAS	37
ANEXOS.....	41

Índice de tablas

Tabla 1.	Población de funcionarios de una municipalidad provincial, 2022...14
Tabla 2.	Muestra de funcionarios de una municipalidad provincial, 2022.....16
Tabla 3.	Nivel de frecuencia y porcentaje de la variable actuaciones preparatorias.....20
Tabla 4.	Nivel de frecuencia y porcentaje de las dimensiones de las actuaciones preparatorias.....21
Tabla 5.	Nivel de frecuencia y porcentaje de la contratación de obras públicas.....22
Tabla 6.	Nivel de frecuencia y porcentaje de las dimensiones de la contratación de obras públicas.....23
Tabla 7.	Prueba de normalidad.....25
Tabla 8.	Correlación entre las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas.....26
Tabla 9.	Correlación entre “Dimensión Requerimientos” de las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas.....27
Tabla 10.	Correlación entre “Dimensión entre el Valor estimado y referencial” de las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas...28
Tabla 11.	Correlación entre “Dimensión entre el Método de contratación” de las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas.....29

Índice de figuras

Figura 1.	Niveles de las actuaciones preparatorias de una municipalidad provincial – 2022.....	20
Figura 2.	Nivel de las dimensiones de las actuaciones preparatorias de una municipalidad provincial – 2022.....	21
Figura 3.	Nivel de la contratación de obras públicas de una municipalidad provincial – 2022.....	23
Figura 4.	Nivel de las dimensiones de la contratación de obras públicas de una municipalidad provincial – 2022.....	24

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022, se pretende analizar relación que existe entre las dimensiones de las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas de una municipalidad provincial, se utilizó un diseño no experimental correlacional y para ello se trabajó con una población (muestra) de 53 funcionarios, se aplicó un muestreo no probabilístico; asimismo la técnica es la encuesta y el instrumento utilizado es el cuestionario. Los resultados fueron procesados usando programas estadísticos, de ello se arriba a la conclusión que se tiene una relación muy alta entre las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas, según la correlación de Spearman ($Rho=0,887$) representando ésta una alta asociación de variables; asimismo, se obtuvo un p-valor 0,000 menor que el valor de significancia ($p<0,05$), por lo que se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna (H_1).

Palabras clave: Actuaciones preparatorias, contratación de obras públicas, municipalidad provincial.

Abstract

The objective of this investigation was to determine the relationship that exists between the preparatory actions and the contracting of public works in a provincial municipality, 2022, it is intended to analyze the relationship that exists between the dimensions of the preparatory actions and the contracting of public works of a provincial municipality. , a correlational non-experimental design was used and for this purpose, a population (sample) of 53 officials was used, a non-probabilistic sampling was applied; Likewise, the technique is the survey and the instrument used is the questionnaire. The results were processed using statistical programs, from which it is concluded that there is a very high relationship between the preparatory actions and the contracting of public works, according to Spearman's correlation ($Rho=0.887$), representing a high association of variables; likewise, a p-value 0.000 less than the significance value ($p<0.05$) was obtained, therefore the null hypothesis (H_0) is rejected and the alternate hypothesis (H_1) is accepted.

Keywords: Preparatory actions, contracting of public works, provincial municipality.

I. INTRODUCCIÓN

Las actuaciones preparatorias en todo el mundo son los lineamientos fundamentales para los procesos de licitación pública, ya que en las acciones ejecutadas se podrá establecer la calidad en las contrataciones de obras públicas, tenemos que tener en cuenta que la ejecución de obras es un establecimiento fundamental para reducir las brechas de comunicaciones, pobreza e infraestructura precaria lo que lleva a la ejecución de servicios ineficientes. (Caballero, 2017). Las poblaciones a nivel global han presentado siempre insatisfacción con la realización de proyectos públicos especialmente en la ejecución de obras, ya que continuamente se presenta deficiencias en los procesos de planificación verificando muchos cambios en el costo real de las contrataciones, lo que lleva al uso indebido del presupuesto ya que tenemos que tener en cuenta que la sobrevaloración y la corrupción existentes en estos procedimientos de contratación. (Cretu y Bienkowska, 2018).

En América Latina, las contrataciones de obras públicas establecen grandes deficiencias, por la poca transparencia en la gestión de la formulación de requerimientos o actuaciones preparatorias no establecen los criterios de eficacia requeridos, y esto se debe que muchas veces a la escasez de capacidades técnicas de las autoridades no han hecho que las decisiones en cuanto al gasto público tenga acciones acertadas no propiciando un desarrollo sostenible, dichos lineamientos han generado que los gobiernos no muestren una adecuada administración pública, incumpliendo con los procedimientos que den garantía a la eficiencia de los procesos de licitación pública que llevan a no cumplir con los requerimientos de la población. (Villamizar et al., 2018).

A nivel nacional, tenemos que tener en cuenta que el estado peruano ha presentado un mayor índice de casos de desviación de fondos y corrupción, las contrataciones de obras públicas han establecido grandes pérdidas de recursos debido a su ineficiencia en su ejecución ya que usualmente dichos procedimientos no inciden de manera positiva en la calidad de vida de la ciudadana, no permitiendo proyectar obras modernas para mejorar la calidad

de los servicios públicos brindados, ya que estos problemas se manifiestan en la insatisfacción de los pobladores, y el bajos niveles de aceptación de las autoridades ya que cumplen con suplir la necesidades, teniendo en cuenta que el cumplir con los servicios públicos establecerán una gestión que maximice la recaudación de fondos para poder tener mejores proyectos de inversión pública. (Carhuancho, 2018).

A nivel departamental, se menciona que la gestión no es eficiente ya que la ejecución de recursos presupuestarios, ha evidenciado que la región cuenta con poca efectividad entorno al cumplimiento de ejecución de obras, teniendo en cuenta que los requerimientos de la ciudadanía no han sido escuchados y estos se debe, por la deficiencias en el manejo de los recursos, han generado una verificación de uso elevado del presupuesto, esto se debe a que las actuaciones preparatorias no están sustentadas en parámetros correctos de verificación de la formulación de los requerimientos, la elaboración de los perfiles técnicos, y sobre todo los problemas en las contrataciones públicas como son la corrupción establecen los contratos que no nos permiten generar proyectos que sea para el bienestar de la población.

En la provincia de estudió se tiene que tomar en cuenta que la falta de capacidad técnica a establecida un ineficiente formulación de requerimientos por ende las actuaciones preparatorias ha incidido negativamente en la gestión de proyectos públicos, verificando el descontento de la sociedad ya que las autoridades no están satisfechas con las obras ejecutadas no solo por las deficiencia observadas sino por la ejecución retrasadas, generando y verificando que el poco conocimiento ha establecido un mal uso de los recursos por ende se propone el subsecuente problema de investigación; ¿Cuál es la relación que existe entre las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022?

Así mismo se establece parámetros para justificar la investigación desde un valor teórico ya que la investigación, nos permitirá la descripción de las dimensiones y componentes que permiten incrementar el conocimiento científico de como la formulación eficiente de las actuaciones preparatorias nos permitirán procesos o procedimientos de contratación para poder

planificar y ejecutar los proyecto de inversión o gestión de obras públicas, desde una explicación de implicancias practicas el incrementar el conocimiento teórico nos podrá ayudar a responder a nuestro problema de investigación, creando fundamentos teóricos que sean sustento para crear establecimientos de mejora para que se puedan ejecutar eficientemente los temas de investigación.

Se justifica de manera metodológica, ya que se tomará cuestionarios los cuales serán validados para verificar la correcta dirección de investigación de nuestros temas de investigación, especificando que el diseño de métodos podrá ayudar a fundamentar nuevos instrumentos con otras perspectivas.

Finalmente es relevante socialmente ya que se establece que el incrementar el conocimiento teórico, y tener los fundamentos adecuados para responder a los problemas de investigación podrá ser relevante ya que el mejorar la eficiencia nos ayudará a que la perspectiva de la población pueda evidenciar una mejor ejecución de obras.

Por ende, se formula el objetivo general de; Determinar la relación que existe entre las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022; como objetivos específicos; Determinar la relación que existe entre los requerimientos de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022. Determinar la relación que existe entre el valor estimado y referencial de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022. Determinar la relación que existe entre el método de contratación de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.

Se estableció por hipótesis de investigación; Existe relación significativa entre las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022; como objetivos específicos; Existe relación significativa entre los requerimientos de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022. Existe relación significativa entre el valor estimado y referencial de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad

provincial, 2022. Existe relación significativa entre el método de contratación de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.

II. MARCO TEÓRICO

Álvarez (2020) en su investigación establece una explicación sobre cómo se han ejecutado las contrataciones públicas en Ecuador en base a los estamentos de la pandemia, empleando en su investigación el método cualitativo en tanto se ha recurrido a la doctrina jurídica de la normativa ecuatoriana respecto al cumplimiento y funcionamiento de la contratación pública, empleándose para ello el método de la interpretación hermenéutica en la confrontación de las normas acerca de los principios de transparencia y eficacia de la contratación estatal bajo el contexto aplicable a la emergencia sanitaria; obteniendo como resultado que en dicho contexto se infringió la contratación como una forma de ejecución del presupuesto ecuatoriano, que facilitaba la regulación y la utilización de recursos en favor de la ciudadanía en tanto se inobservó los principios de transparencia en contrataciones expuestas como fraudulentas y en las que sobreestimó precios ocasionando el aprovechamiento indebido de los recursos públicos con la afectación a la ciudadanía; la conclusión de la investigación destaca que los actos de corrupción y falta de control en las contrataciones públicas realizadas en el contexto del estado de emergencia vulneraron el principio de transparencia como un principio fundamental en la adquisición de bienes cuyo beneficio resultante sería para la sociedad afectada en sobremanera en el sector de la salud.

Viscarra (2021), en su investigación establece una explicación de cómo la contratación pública ha evolucionado entorno a una adecuada planificación de los procesos, mediante la cual se plantea como objetivo principal determinar en qué y de qué forma se logra mejorar la contratación pública a fin de dar un óptimo cumplimiento al planeamiento estatal; la óptica de la investigación de tipo cualitativo, con efecto del tipo descriptivo sin intervención en las variables en estudio; en los resultados se destaca la existencia de debilidades y aciertos en el empleo de organización y priorización de la contratación del estado previa planificación estatal, programando los requerimientos de las entidades; la investigación presenta como conclusión que la problemática en la ejecución presupuestaria se encuentra relacionado con el deficiente planeamiento o en su defecto la

carencia de la misma ocasionando la ineficiencia por parte de la institución respecto a los recursos que se le asignaron por lo que la óptima prioridad y organización en la contratación pública permite potencializar los recursos públicos dando respuesta a los requerimientos necesarios sea de servicios, bienes u obras, según lo requiera dicha población haciendo uso efectivo y eficiente de los recursos.

Macías et al (2021), en su investigación planteo parámetros de análisis planteándose como objetivo determinar los componentes que influyen en la contratación pública en una situación de emergencia, así como visibilizar los peligros que se exponen en los procedimientos de licitación y en razón de intuir las soluciones más favorables; en cuanto a la metodología empleada se tiene que ésta según su alcance es del tipo descriptivo – exploratorio, de enfoque cualitativo en tanto se recurre al análisis y síntesis de los enfoques; obteniendo como resultado que existe una conexión entre los efectos de los fundamentos legales y económicos con un impacto político, existiendo directa relación proporcionalmente positiva, permitiendo deducir que mientras se favorezca el ambiente legal en ese mismo sentido se favorecerá el aspecto económico; la investigación concluye que existen componentes negativos que causan un efecto en la contratación pública en situaciones de emergencia lo cual se ha visto reflejado sobre todo en los procesos de adquisición de recursos; por lo que reforzar el ámbito legal y económico influyen directamente en el uso correcto de la contratación pública.

Quispe et al (2022), establece una explicación de cómo el presupuesto participativo genera eficiencia como instrumento en la gestión pública, desde la explicación de planificación gubernamental, tomando como objetivo el análisis desde un enfoque teórico del presupuesto participativo y gestión del gasto público, planteando una metodología descriptiva, tomando como fuente a 20 fuentes bibliográficas, para verificar como el destino de los recursos públicos plantean un lineamiento de contribución para el bienestar de la población, direccionado a varios sectores económicos, los autores llegaron a la conclusión que la efectividad del gasto público desde la perspectiva de los diferentes sectores sociales, tiene una incidencia positiva desde el adecuado uso del presupuesto participativo ya que la población

debe establecer los que requiere en base a sus necesidades con el fin de que las entidades públicas puedan gestionar adecuadamente la distribución de los recursos.

Como antecedentes nacionales tomamos en cuenta a Mendoza y Susanivar (2021), los autores establecen un análisis de como las actuaciones preparatorias tienen un influencia entorno a la eficacia de los procesos de contratación, generando una determinación de relación desde un enfoque cualitativo, donde se explicó los fundamentos y nivel de cumplimiento del PAC, para ejecutar los procedimientos de selección de servicios, obteniendo como resultados que la poca eficiencia en los enfoques de requerimientos para las actuaciones preparatorias pueden orientar una eficiencia adscrito a los procedimientos de compra y adquisición de bienes, servicios u obras, generado desde una apropiada indagación del presupuesto y del diagnóstico de lo que requiere la entidad, concluyendo que las actividades de las áreas usuarias, tienen que realizarse en tiempo adecuado para que los procesos de selección cumplan con los plazos establecidos en el PAC, conllevando a una eficiencia en los estamentos de adquisición de lo que se especifica en el presupuesto.

Rumín (2020), explica un análisis de como la formulación de los requerimientos establecen una relación en los procesos de contrataciones, determinando la relación entre las variables a partir de un enfoque cuantitativo, por medio de una muestra de 35 administrativos, sobre los que se han ejecutado dos cuestionarios obteniendo como resultantes que se tiene un índice de 0.466 y una significancia menor al 5%, por lo que se concluye que ante una preeminente eficiencia en los planteamientos de las actuaciones o actos preparatorios para poder establecer la definición de requerimientos genera que las contrataciones públicas generen eficiencia en los procesos.

Cruzado (2021) en su investigación establece como el formular adecuadamente los requerimientos genera eficacia en la contratación pública de obras, planteando como propósito establecer una relación entre los estamentos mencionados, desde una investigación básica, tomando en

cuenta un muestreo de 35 funcionarios, sobre los que se han ejecutado dos cuestionarios, los datos obtenidos nos ayudaron a verificar un índice de relación de 0.719 y significancia de 0.000, ante lo cual podemos enunciar que la formulación de los requerimientos es un lineamiento fundamental para que la eficiencia de la contratación de obras públicas se eficiente y eficaz en su ejecución.

Vílchez et al (2020) a través de su investigación plantean como objetivo general evaluar el rango de observancia de los principios de eficacia y eficiencia en la adjudicación de contratos de obras convocados a través del procedimiento de Licitación Pública en el Gobierno de la Región Lambayeque, periodo 2017 – 2019, para conseguir el objetivo, la investigación ha seguido la metodología cualitativa a través de la recopilación de expedientes de contratos de obras convocados a través de Licitación Pública del periodo 2017 – 2019, empleando una método de recopilación de datos a través de la ficha de observación con las que se evaluó el cumplimiento del principio en los expedientes seleccionados, obteniendo como resultado que el rango de aplicación de eficiencia representa el 72% registrándose en escala de medida en calidad de alto y respecto al nivel de eficacia esta es muy bajo, por lo que resulta cuestionable el compromiso que realmente asume cada gestión en las diferentes etapas de encargatura en los que se inicia, continúa y concluye la obra en atención a que la repercusión de la ejecución de cada obra recae en la población.

Ruiz y Delgado (2020) en su investigación planteó como objetivo conocer el manejo interno del proceso de contrataciones en las instituciones estatales, para alcanzar el objetivo trazado se siguió la metodología aplicada con diseño no experimental y descriptiva recurriendo a la observación de artículos y empleando el método deductivo, obteniendo como resultado que el 30% de las investigación alegan a que el control interno se aplica por la autoridad competente por medio de diversos procedimientos como ambiente, actividades de control y seguimiento; así también se muestra que el 70% que normativa respecto a las contrataciones con el Estado es confusa. La investigación concluye que el control interno es débil en las instituciones estatales y que los procedimientos respecto a compras y

licitaciones no se han desarrollado completamente debido a que los mismos no se han establecido de forma clara en la normativa por lo que es recomendable estandarizar dichos procedimientos a fin de contribuir a la consecución de objetivos por parte de las instituciones públicas en atención a que las mismas usan los recursos públicos para estos fines y un mal procedimiento o un procedimiento incompleto o ineficiente además de generar más gastos en la población resultan en operaciones deficientes.

Ramos (2019), quien analiza como las actuaciones preparatorias son lineamientos fundamentales para los procesos de contrataciones el autor determino como objetivo encontrar la relación existente, desde un plano cuantitativo, con una muestra de 30 funcionarios, a los cuales se les realizó un par de cuestionarios eficaces y fiables, los efectos alcanzados arrojaron un índice de relación de 0.717 con una alcance menor al 1%, por tanto, se infiere la existencia de una correspondencia significativa entre cómo se ejecutan de manera eficiente en las actuaciones preparatorias para poder establecer una mejor eficiencia en los procesos de contratación.

Para fundamentar las actuaciones preparatorias fundamentadas en la Ley 30225, en donde explica que el primer punto a establecer es la descripción del requerimientos ya que establece los requisitos de las áreas, desde los lineamientos de especificaciones técnicas para que se puedan cumplir con las finalidades públicas, verificando la homologación de los requerimientos para que la elaboración de los estamentos normativos no esté fuera de lo que establece la norma, tomando en cuenta los valores referenciales y estimados con el fin de que los procesos de selección cumpa con los lineamientos requeridos para una transparente asignación de recursos presupuestarios, para después de tener en cuenta poder seleccionar el método de contratación más eficiente especificando los procedimientos de selección para poder cumplir con los lineamientos de licitaciones públicas ya que los concursos deben establecer los parámetros de transparencia para poder establecer una correcta definición del presupuesto público.

La Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, establece requerimientos y procesos de observancia y formalismo obligatorios que se deben cumplir

respecto a las contrataciones con el Estado en tanto la incidencia de estas contrataciones se refleja ya sea en la esfera estatal y privada. La Ley 30225 y su Reglamento buscan garantizar que las partes contratantes logren ejercer sus derechos y asumir sus obligaciones asegurando la transparencia de sus actuaciones en beneficio de la sociedad.

La ejecución de obras comprende tanto deberes del contratista respecto de la obra tales como: el deber inspeccionar el lugar en el que se realizará la obra y realizar la revisión del expediente técnico, acto que debe realizar antes de efectuar su oferta; así también debe nombrar a un ingeniero residente encargado de la dirección técnica de la obra; debe proporcionar facilidades a la Entidad a fin de que ésta verifique o supervise la obra y con ello el cumplimiento de las condiciones y obligaciones asumidas por el contratista.

Así también, la Ley establece que el contratista está obligado a cumplir con el calendario de ejecución de obras el mismo que comprende desde los avances parciales a la conclusión de la obra, el mismo que de no ser cumplido tendrá como consecuencia aplicarle penalidades por mora.

Para la ejecución de obra la Ley 30225 establece que es obligación del contratista abastecerse con el total de equipamiento, materiales y elementos imprescindibles que tengan el rendimiento, tecnología y capacidad que se requiera para ejecutar los trabajos y conforme hayan sido ofertados por el contratista. Además como parte de la realización de la obra se debe contar con el cuaderno que contiene las indicaciones, reparos y variantes necesarios para el desarrollo de la obra; a su vez el Expediente técnico establece los lineamientos bajo los cuales se debe ejecutar la obra tales como: los diseños y/o planos, los requerimientos específicos técnicos, las bases integradas, el cronograma de avance de obra, los calendarios de compra de materiales, el cronograma de pagos entre otra documentación que formen parte de la ejecución de la obra.

Según la Ley 30225, las actuaciones preparatorias son las actividades establecidas cuando las áreas usuarias requieren un bien, servicio o ejecución de alguna obra, elaborando requerimientos para poder establecer

los términos de referencia, en base a los expedientes técnicos y requisitos para establecer el fin público, tomando en cuenta que las contrataciones deben ser orientados a cumplir con los lineamientos de valor estima y referencial descrita por el área de contrataciones.

Las contrataciones de obras públicas, son los procesos de contratación que las entidades públicas realizan para que una empresa privada que cuente con los requerimientos del rubro, para poder responder a los lineamientos de planificación, organización del proceso para que ellos puedan ejecutar la obra. (Marianelli y Antoniou, 2019).

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1. Tipo de investigación

La investigación es básica ya que es un tipo de investigación científica con el objetivo de enriquecer las teorías científicas para una mayor comprensión y predicción de los fenómenos naturales o de otro tipo, incrementando el intelecto teórico de las variables de nuestra investigación. (CONCYTEC, 2020).


El enfoque cuantitativo, nos dice que es un enfoque que está basado en investigaciones basadas a sus estudios de números estadísticos ya que dan respuestas concretas al objetivo de obtener respuestas de la población a preguntas específicas. (Mata, 2019).

3.1.2. Diseño de investigación

El diseño no experimental correlacional es el que se efectúa no tergiversando deliberadamente las variables. Se sustenta esencialmente en la investigación de sucesos conforme ocurren en su entorno genuino para luego estudiarlos. (Cabezas et al, 2018).

Las investigaciones transversales recopilan información de la variable exposición y desenlace simultáneamente. (Bhandari, 2021), con el fin de detallar sus atributos y provisionalmente analizar su nivel de relación. (Hernández y Mendoza, 2018)

Esquema:



Dónde:

M = Muestra determinada

O₁= Actuaciones preparatorias

O₂= Contratación de obras públicas

r = Relación estadística.

3.2. Variables y operacionalización

3.2.1. Variables

Variable 1: Actuaciones preparatorias

Variable 2: Contratación de obras públicas

3.2.2. Operacionalización de variables

Variable 1: Actuaciones preparatorias

Definición conceptual:

Según la Ley 30225, son las actividades establecidas cuando las áreas usuarias requieren un bien, servicio o ejecución de alguna obra, elaborando requerimientos para poder establecer los términos de referencia, en base a los expedientes técnicos y requisitos para establecer el fin público, tomando en cuenta que las contrataciones deben ser orientados a cumplir con los lineamientos de valor estima y referencial descrita por el área de contrataciones.

Definición operacional:

Es la ejecución de un cuestionario válido y confiable, el cual estuvo construido tomando en cuenta los indicadores y dimensiones de la presente investigación, tomando datos de la valoración de la muestra participante.

Indicadores

Según la dimensión requerimiento establece a los indicadores especificaciones técnicas, TDR, expedientes, requisitos, finalidad y obligaciones.

Según la dimensión valor estimado y referencial establece a los indicadores indagaciones, revisión, componentes, pluralidad, maximización, antigüedad de monto, monto, precio unitario, verificación, presupuesto y periodos.

Conforme la dimensión método de contratación establece a los indicadores sumaalzada, precios unitarios, modalidad mixta, tarifas y honorarios y contratación de llave en mano

Escala: Ordinal

Variable 2: Contratación de obras públicas

Definición conceptual:

Son los procesos de contratación que las entidades públicas realizan para que una empresa privada que cuente con los requerimientos del rubro, para poder responder a los lineamientos de planificación, organización del proceso para que ellos puedan ejecutar la obra. (Marianelli y Antoniou, 2019).

Definición operacional:

Es la ejecución de un cuestionario válido y confiable, el cual estuvo construido tomando en cuenta los indicadores y dimensiones de la presente investigación, tomando datos de la valoración de la muestra participante.

Indicadores:

Según la dimensión establece a los indicadores PAC, presupuesto, especificaciones, TDR, certificación y autonomía.

Según la dimensión organización del proceso establece a los indicadores concurrencia, buena pro, solicitudes de apelación, consentimiento y proceso de anulación.

Según la dimensión contratación establece a los indicadores tiempo establecido, adicional de obra, ampliación de plazo, actas, obras y convenios.

Escala: Ordinal

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis

3.3.1. Población

Define como un conjunto del evento a analizar en el cual los componentes de población tienen una peculiaridad frecuente la cual se analiza dando origen a los datos de la investigación. (Arias, J. 2016 p.202).

Determinando la siguiente distribución:

Tabla 1

Población de funcionarios de una municipalidad provincial, 2022.

Órgano	Frecuencia
Alcaldía	3
Gerencia municipal	2
Control institucional	2
Procuraduría	2
Asesoría jurídica	2
Planificación y presupuesto	4
Programación multianual de inversiones	2
Secretaria general	2
Tramite documentario	2
Comunicación e imagen institucional	2
Administración y finanzas	2

Contabilidad	2
Tesorería	2
Recursos humanos	2
Logística	3
Tecnologías de la información	2
Control patrimonial	6
Administración tributaria	2
Servicios públicos	40
Infraestructura y acondicionamiento territorial (Estudios y proyectos, ejecución de obras, supervisión y liquidación de obras, catastro, gestión de riesgos)	28
Desarrollo económico local	21
Desarrollo humano	8
Total	143

Nota. Información cuadro del personal en una municipalidad provincial, 2022.

Criterios de selección

Criterios de inclusión, se establecerá a los funcionarios que tengan una ejecución de funciones entorno a nuestras variables de investigación, o se toma en cuenta a los funcionarios que tengan conocimientos técnicos con referente a nuestros temas tratados.

Criterios de exclusión, establece a los funcionarios que no ejecuten labores directas que se relacionen con las variables de investigación.

3.3.2. Muestra

La muestra viene hacer la pequeña parte de la población, lo cuales van a pertenecer a un mismo conjunto de características.

Seleccionando la muestra en base a un muestreo no probabilístico determinando la siguiente distribución:

Tabla 2

Muestra de funcionarios de una municipalidad provincial, 2022.

Órgano	Frecuencia
Planificación y presupuesto	4
Programación multianual de inversiones	2
Contabilidad	2
Tesorería	2
Logística	3
Servicios públicos	20
Infraestructura y acondicionamiento territorial (Estudios y proyectos, ejecución de obras, supervisión y liquidación de obras, catastro, gestión de riesgos)	18
Desarrollo económico local	2
Total	53

Nota. Información cuadro del personal en una municipalidad provincial, 2022.

Determinando que la muestra de investigación es de 66 funcionarios de una municipalidad provincial, 2022.

3.3.3. Muestreo

El muestreo es un establecimiento que tiene como finalidad que el investigador seleccione las unidades más representativas o característica en las cuales se obtendrá dichos datos que le permitirá extraer deducciones acerca de la población sobre la cual se investiga, eligiendo un muestreo no probabilístico a conformidad del investigador.

3.3.4. Unidad de análisis

Funcionario de una municipalidad provincial, 2022.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.4.1. Técnicas

Define encuesta al método que procura conseguir datos que proporciona un conjunto de personas o muestra de individuos sobre sí mismos, o relacionados por un asunto en común. (Sordo, 2021)

3.4.2. Instrumentos

El cuestionario, es una técnica muy utilizada en la recopilación de datos, el mismo que radica en una secuencia de interrogantes en correspondencia a una o más variables a tratar. (Garay, 2020), para el cuestionario actuaciones preparatorias se tomó en cuenta un formulario de 19 preguntas de las cuales 06 corresponden a la dimensión requerimiento, 11 a la dimensión valor estimado y referencial y 02 a la dimensión sistema y modalidad de contratación, con un grado de medición de Likert. (Ver anexo 03), y para el cuestionario contratación de obras públicas se tomó en cuenta uno de 18 preguntas de las cuales 06 corresponden a la dimensión planificación, 06 a la dimensión organización del proceso y 06 a la dimensión contratación con un grado de medición de Likert. (Ver anexo 04).

3.4.3. Validez

Es aquel que constituye la probabilidad de que una forma de investigación pueda contestar a las preguntas expuestas, en base a criterios de profesionales especialistas en los temas de los procesos ejecutados. (Moreno, 2017), tomando en cuenta la valoración de 3 expertos en gestión pública (Ver anexo 05). Los expertos validadores son:

- Dr. Yache Cuenca, Eduardo Javier
- Ms. Sánchez Rosales, Carlos Alberto
- Ms. Torres Solano, Betsabe

3.4.4. Confiabilidad

La confiabilidad de un instrumento viene a ser el cálculo el cual se dispone a través de diferentes técnicas, y se refieren al nivel en la que su utilización redundante al propio sujeto obtiene los mismos efectos, dichos resultados son obtenidos mediante la aplicación de una muestra piloto a 15 individuos que poseen similares caracteres que nuestra variable de investigación. (Quero, 2010), los datos al ser analizados por la técnica estadística de alfa de Cronbach, se estableció para la variable actuaciones preparatorias, un índice de 0.854 que contrasta a una fiabilidad buena, y para la variable contratación de obras públicas un índice de 0.877 que contrasta a una confiabilidad buena. (Ver anexo 06).

3.5. Procedimientos

Para poder recolectar los datos se establece la búsqueda cuestionarios que tengan criterios de medición parecidos a nuestra operacionalización de variables con el fin de poder tener un fundamento teórico de obtención de datos.

Los cuestionarios seleccionados también fueron validados por expertos ya que se tuvo que determinar si dichos establecimiento o ítems están correctamente direccionados con nuestra investigación.

Se procedió a la digitalización de dichos cuestionarios mediante el uso de la herramienta Google Drive, y distribuido entre la muestra de investigación.

Los datos obtenidos serán evaluados para poder demostrar nuestros objetivos de investigación.

3.6. Método de análisis de datos

Se establecerá la descripción de tablas de frecuencia y porcentaje, para describir una estadística descriptiva usando la herramienta, tomando en cuenta la presentación de los nivel de frecuencia absoluta y relativa porcentual, ya que se realizó un conteo en base a una

ejecución de intervalos para poder establecer los niveles de cada una de las variables estos procesos se realizaron utilizando Excel, además se establece una estadística inferencial, las cuales se ejecutará una prueba de normalidad para establecer que prueba estadística va a utilizar para demostrar los objetivos de investigación, que este caso fue la evaluación no paramétrica de Rho de Spearman para la correspondencia entre las variables.

3.7. Aspectos éticos

La actual investigación toma por razón el derecho a la autonomía referente a que la muestra de investigación no está obligada a participar la investigación, e informándoles que se guardará la confidencialidad de los datos, puesto que la información obtenida solo se usará en la actual investigación, además la estructuración se realiza en fundamento a los parámetros de la universidad y las normas APA 7ma edición.

IV. RESULTADOS

4.1. Descripción

La información obtenida mediante la ejecución de cuestionarios basándose en la opinión de la muestra determinada, dio como resultados datos que establecieron como primer punto una estadística descriptiva e inferencial con el fin de conocer los niveles de frecuencia, así como las relaciones entre variables y dimensiones, con el fin de poder tener un fundamento teórico numérico para incrementar el conocimiento.

4.2. Resultado de las variables de investigación

4.2.1. Resultados variable actuaciones preparatorias

Tabla 3


Niveles de las Actuaciones preparatorias en una Municipalidad Provincial, 2022.

Nivel	Actuaciones Preparatorias	
	F	%
Eficiente	39	73.6
Regular	12	22.6
Deficiente	2	3.8
Total	53	100

Nota. Información obtenida del desarrollo de los instrumentos.

Figura 1.

Niveles de las actuaciones preparatorias de una municipalidad provincial – 2022.

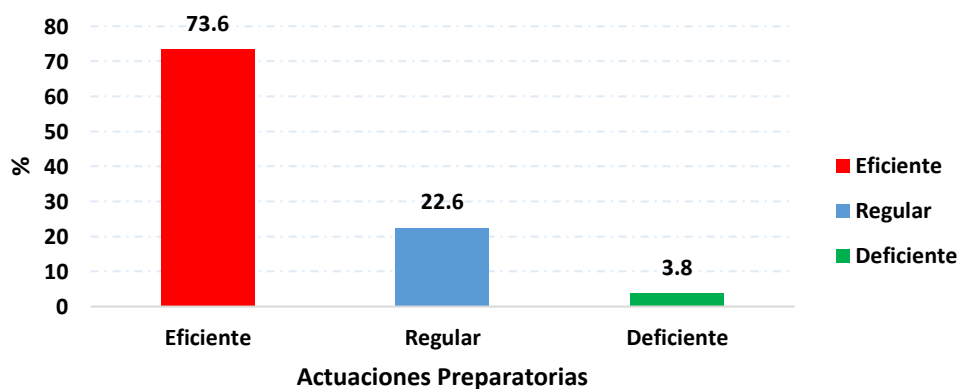

En la Tabla 3 y Figura 1, se advierte que de acuerdo al punto de vista de los encuestados el 73.6% valora a las actuaciones preparatorias en un nivel eficiente, el 22.6% la valora en un nivel regular y el 3.8% pondera a las actuaciones preparatorias en un rango deficiente, por lo que podemos decir que se puede identificar el cumplimiento de los establecimientos o lineamientos para generar que la variable cumpla con todo lo referido en la normativa, se verifica que hay una parte que establece que se puede mejorar ya que puede generarse que los procesos no sean ejecutados correctamente o en plazos que difieren de la norma.

Tabla 4


Nivel de las dimensiones de las actuaciones preparatorias en una Municipalidad Provincial – 2022

Nivel	Requerimiento		Valor estimado y referencial		Método de contratación	
	F	%	F	%	F	%
Eficiente	41	77.4	43	81.1	34	64.2
Regular	12	22.6	8	15.1	14	26.4
Deficiente	0	0	2	3.8	5	9.4
Total	53	100	53	100	53	100

Nota. Información obtenida de la ejecución de los instrumentos.

Figura 2.

Nivel de las dimensiones de las actuaciones preparatorias de una Municipalidad Provincial – 2022

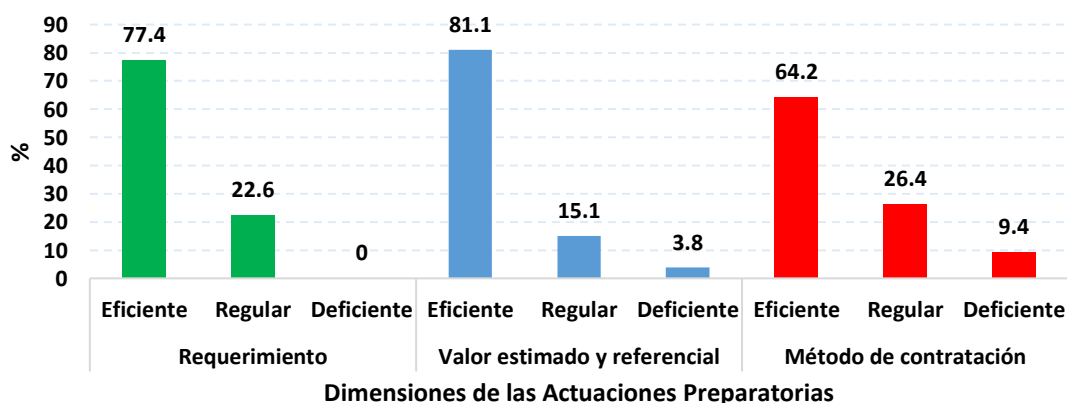

En la Tabla 4 y Figura 2, se advierte que, conforme a los encuestados, se establece que el 77.4% valora los requerimientos en un nivel eficiente, y el 22.6% pondera a los requerimientos en un rango regular, lo que se puede interpretar que la formulación de los requerimientos de las unidades no establece un adecuado diagnóstico para una correcta calidad del gasto.

Con respecto a la dimensión valor estimado y referencial, se verifica que un 81.1% de los encuestados valora a la misma en un rango eficiente, el 15.1% la pondera en un rango regular y el 3.8% valora a la misma en un rango deficiente, por lo que podemos interpretar que las estimaciones para las actuaciones preparatorias en los procesos de contratación algunas veces no establecer los establecimientos de mercado real.

La dimensión método de contratación, se verifica que el 64.2% de los encuestados valora a la misma en un rango eficiente, el 26.4% pondera al método de contratación en un rango regular y el 9.4% la valora en un rango deficiente, por lo que muchos de los funcionarios no están de acuerdo con los establecimientos que se realizan las contrataciones ya que a veces no se cumplen con los requisitos precios o la documentación que exige la norma.

4.2.2. Resultados variable contratación de obras públicas

Tabla 5


Nivel de la contratación de obras públicas en una Municipalidad Provincial – 2022

Nivel	Contratación de obras públicas	
	F	%
Eficiente	41	77.4
Regular	12	22.6
Deficiente	0	0
Total	53	100

Nota. Información obtenida de la ejecución de los instrumentos.

Figura 3.

Nivel de la contratación de obras públicas en una municipalidad provincial – 2022.

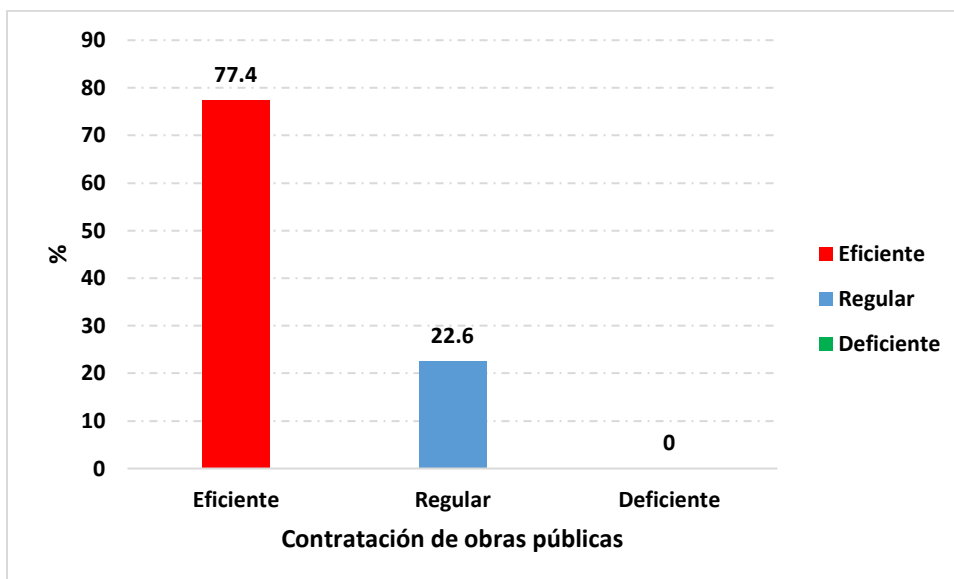

En la Tabla 5 y Figura 3, se evidencia que el 77.4% de los encuestados valora a la contratación de obras públicas en un rango eficiente y el 22.6% valora a la variable en un rango regular, en tanto podemos afirmar que la entidad ha establecido contrataciones eficientes, pero algunos de sus lineamientos no han sido ejecutados correctamente lo que causa alguna duda con referencia a que pueda generarse los procesos que se tiene que establecen para el cumplimiento de objetivos.

Tabla 6


Nivel de las dimensiones de la contratación de obras públicas en una Municipalidad Provincial – 2022.

Nivel	Planificación		Organización del proceso		Contratación	
	F	%	F	%	F	%
Eficiente	41	77.4	39	73.6	40	75.5
Regular	11	20.8	14	26.4	13	24.5
Deficiente	1	1.9	0	0	0	0
Total	53	100	53	100	53	100

Nota. Información obtenida de la ejecución de los instrumentos.

Figura 4.

Nivel de las dimensiones de la contratación de obras públicas en una municipalidad distrital, 2022.

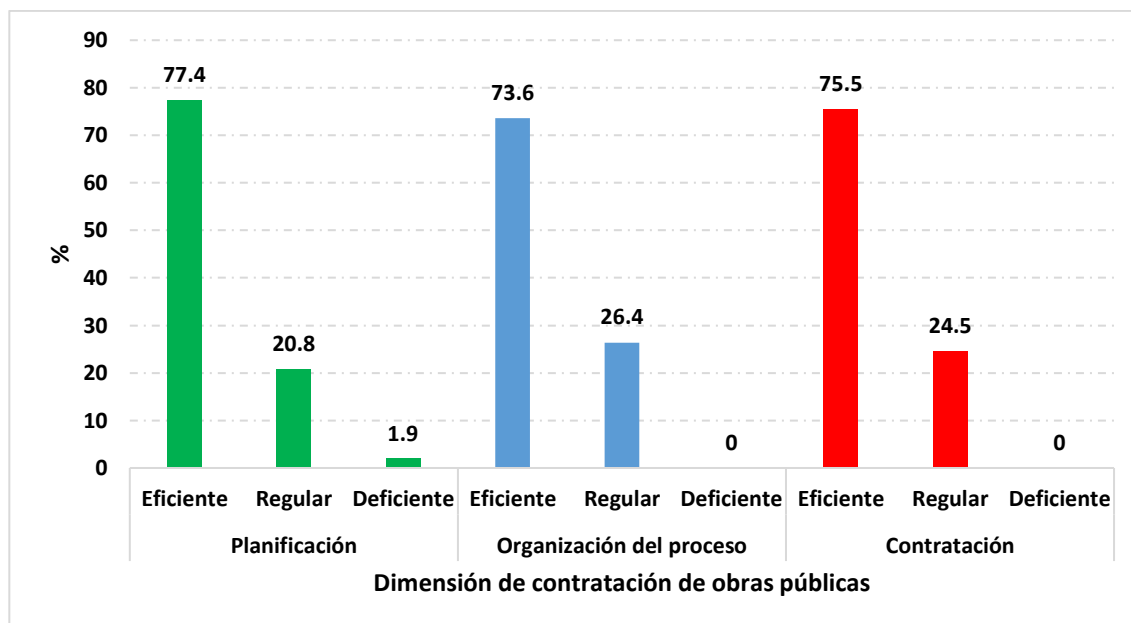

En la Tabla 6 y Figura 4, se evidencia que el 77.4%, se puede verificar que la dimensión de planificación para la contratación de obras públicas se verifica en un rango eficiente, el 20.8% pondera a la misma en un rango regular y el 1.9% la pondera en un rango deficiente, por lo que se puede decir que el proceso de planificación establece criterios eficientes, pero todavía hay lineamientos como la ejecución de actividades o acciones que realmente se adapten a un correcto diagnóstico.

Para la dimensión organización de procesos, el 73.6% de los encuestados valora a la misma en un rango eficiente, el 26.4% pondera a la misma en un rango regular, por lo que se puede decir que los procesos para las contrataciones de obras públicas están funcionando de manera eficiente, pero se tienen que tener diferentes criterios para cumplir cabalmente con la normativa.

Para la dimensión contratación, se verifica que un 75.5% de los encuestados valoran a la misma en un rango eficiente, el 24.5% la pondera en un rango regular, por lo que podemos decir que

los establecimientos de contratación son cumplidos, pero se tiene que realizar mayor control para lograr la excelencia.

4.3. Prueba de normalidad

Para poder encontrar la evidencia estadística a usar se ejecuta una prueba de normalidad que es elegida de acuerdo al tamaño de la muestra por ser mayor a 50, se ejecuta la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov.

Tabla 7

Prueba de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Estadístico	gl	Sig.
Requerimiento	0.111	53	0.099
Valor estimado y referencial	0.160	53	0.002
Método de contratación	0.186	53	0.000
Actuaciones preparatorias	0.150	53	0.004
Planificación	0.153	53	0.004
Organización de procesos	0.113	53	0.090
Contratación	0.122	53	0.047
Contratación de obras públicas	0.106	53	0.200

Nota. Información obtenida de la ejecución de los instrumentos.

En la Tabla 7, se analiza que de acuerdo a la distribución de los datos, se verifica que para la variable actuaciones preparatorias la significancia es menor al 5%, se verifica una distribución no normal, y la variable contratación de obras pública una distribución normal, por

ende, al relacionar las variables de investigación se ejecutara la prueba no paramétrica de Rho de Spearman.

Para el contraste de hipótesis específicas se relacionará las dimensiones de la variable 1 con la variable 2, especificando que para la relación entre el requerimiento y la contratación de obras públicas al verificar una distribución normal se ejecutará la prueba paramétrica de Pearson, para la correlación entre las dimensiones valor estimado y referencial, método de contratación al distribuirse de manera no normal se usará la prueba de Spearman.

4.4. Prueba de hipótesis

4.4.1. Prueba de hipótesis de investigación

Hi: Existe relación significativa entre las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.

Ho: No existe relación significativa entre las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.

Tabla 8

Correlación entre las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas.

		Contratación de obras públicas	
Actuaciones preparatorias	Correlación de Spearman		,887**
	Sig. (bilateral)		,000
		N	53

Nota. Datos usados de cuestionarios

Se observa que en la Tabla 8, de conformidad a la evidencia estadística ejecutada se encontró un índice de 0.887** y una significancia menor al 1%, por lo que se puede decir que entre las actuaciones preparatorias y la contratación de obras

públicas de una municipalidad provincial, 2022, hay una conexión muy alta y significativa, de manera que es aprobada la hipótesis de investigación, los resultados nos dan a entender que si la eficiencia en el cumplimiento de todos los parámetros de las actuaciones preparatorias son eficientes la contratación de obras podrá generar menos dificultades y establecerá parámetros que eviten retrasos.

4.4.2. Prueba de hipótesis específica 1

Hi: Se encuentra relación significativa entre los requerimientos de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.

Ho: Es inexistente la relación significativa entre los requerimientos de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.

Tabla 9

Correlación entre “Dimensión Requerimientos” de las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas.

Contratación de obras públicas		
	Correlación de Pearson	,818**
Dimensión: Requerimientos	Sig. (bilateral)	,000
	N	53

Nota. Datos usados de la ejecución de cuestionarios

Se observa en la Tabla 9, que de conformidad a la evidencia estadística se encontró un índice de relación de 0.818 y una significancia menor al 1%, por lo que puede afirmarse que la dimensión requerimientos tiene una conexión muy alta y significativa con la contratación de obras públicas, por lo que se puede decir que definir correctamente los requerimientos de las unidades podrá establecer parámetros que ayuden a que

los lineamientos de contratación de obras públicas no sufran retrasos y se contrate o adquiera lo necesario en base a una adecuada planificación.

4.4.3. Prueba de hipótesis específica 2

Hi: Se estima que hay una relación significativa entre el valor estimado y referencial de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.

Ho: Es ausente la relación significativa entre el valor estimado y referencial de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.

Tabla 10

Correlación entre “Dimensión entre el Valor estimado y referencial” de las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas.

		Contratación de obras públicas	
Dimensión: Valor estimado y referencial	Correlación de Spearman	,851**	
	Sig. (bilateral)	,000	
		N	53

Nota. Datos usados del desarrollo de los cuestionarios

Analizando la Tabla 10, que acorde a la evidencia estadística se detectó un índice de relación de 0.851 y una significancia menor al 1%, por lo que se puede decir que la dimensión entre el valor estimado y referencial tiene una relación muy elevada y significativa con la contratación de obras públicas, por lo que se puede decir que establecer dentro de los procesos de contratación y planificación índices correctos de mercado para que los valores estimados y referenciales tengan una eficiente directa con la contratación de obras públicas evitando posibles

desfalcos o actos de corrupción, ya que al establecer la realidad del valor de mercado las contrataciones se darán en base a la realidad.

4.4.4. Prueba de hipótesis específica 3

Hi: Se afirma una existente relación significativa entre el método de contratación de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.

Ho: No existe relación significativa entre el método de contratación de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.

Tabla 11

Correlación entre “Dimensión entre el Método de contratación” de las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas.

		Contratación de obras públicas	
Dimensión: Método de contratación	Correlación de Spearman		,702**
	Sig. (bilateral)		,000
		N	53

Nota. Datos usados de la ejecución de cuestionarios

Se observa la Tabla 11, que conforme a la prueba estadística se encontró un índice de relación de 0.702 y una significancia menor al 1%, por lo cual se podría declarar que la dimensión método de contratación contiene una conexión elevada y valiosa con la contratación de obras públicas, por lo que se puede decir que establecer un correcto método de contratación para cualquier establecimiento de los procesos de contratación de obras públicas, harán que la planificación, organización de procesos y cualquier otro que se requiera pueda verificar los parámetros de eficacia que se requiere.

V. DISCUSIÓN

Después de realizar los estudios de los datos, se plantea la discusión de resultados con el fin de verificar cuales son los planteamientos o coincidencias con otro tipo de investigaciones y teorías por lo que se puede decir que

Los datos hallados muestran que entre las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas de una municipalidad provincial, 2022, hay existencia de una relación elevada y significativa, con un índice de 0.887 y una significancia del 1%, por lo que se aprueba la hipótesis de investigación, los resultados nos dan a entender que si la eficiencia en el cumplimiento de todos los parámetros de las actuaciones preparatorias son eficientes la contratación de obras podrá generar menos dificultades y establecerá parámetros que eviten retrasos, los datos hallados se relacionan con la investigación de, Ramos (2019), quien analiza como las actuaciones preparatorias son lineamientos fundamentales para que los procesos de contrataciones el autor determino como objetivo encontrar la relación existente, a partir de un plano cuantitativo, con una toma de 30 funcionarios, sobre los que se han ejecutado dos cuestionarios eficaces y fiables, los efectos alcanzados, los efectos alcanzados arrojaron un índice de relación de 0.717 con una significancia menor al 1%, por lo cual se concluye que se afirma la presencia de una conexión significativa entre cómo se ejecutan de manera eficiente en las actuaciones preparatorias para poder establecer una mejor eficiencia en los procesos de contratación, los resultados relacionados dan consistencia a lo establecido por en la fundamentación de las actuaciones preparatorias ya que la Ley 30225, explica que el primer punto a establecer es la descripción del requerimientos ya que establece los requisitos de las áreas, desde los lineamientos de especificaciones técnicas para que se puedan cumplir con las finalidades públicas, verificando la homologación de los requerimientos para que la elaboración de los estamentos normativos no esté fuera de lo que establece la norma, tomando en cuenta los valores referenciales y estimados con el fin de que los procesos de selección cumpa con los

lineamientos requeridos para una transparente asignación de recursos presupuestarios.

Para después de tener en cuenta poder seleccionar el método de contratación más eficiente especificando los procedimientos de selección para poder cumplir con los lineamientos de licitaciones públicas ya que los concursos deben establecer los parámetros de transparencia para poder establecer una correcta definición del presupuesto público. Con referencia a la tabla 9, se halló un índice de relación de 0.818 y una significancia menor al 1%, por lo que se puede afirmar que la dimensión requerimientos tiene una conexión muy alta y significativa con la contratación de obras públicas, por lo que se puede decir que definir correctamente los requerimientos de las unidades podrá establecer parámetros que ayuden a que los lineamientos de contratación de obras públicas no sufran retrasos y se contrate o adquiera lo necesario en base a una adecuada planificación, los datos hallados se vinculan con la investigación de, Cruzado (2021) en su estudio establece como el formular adecuadamente los requerimientos genera eficiencia en la contratación pública de obras, planteando como propósito el establecer la relación entre los estamentos mencionados, desde una investigación básica, tomando en cuenta una muestra de 35 funcionarios, a los que se les aplicó dos formularios, los datos obtenidos nos ayudaron a verificar un índice de relación de 0.719 y una significancia de 0.000, por tanto, podemos afirmar que la formulación de los requerimientos es un lineamiento fundamental para que la eficiencia de la contratación de obras públicas se eficiente y eficaz en su ejecución, teniendo en cuenta a Rumín (2020), explica un análisis de como la formulación de los requerimientos establecen una relación en los procesos de contrataciones, determinando la conexión entre las variables de un punto de perspectiva cuantitativo, con una muestra de 35 administrativos, sobre los que se han ejecutado dos cuestionarios obteniendo como resultantes que se tiene un índice de 0.466 y una significancia menor al 5%, por lo que se concluye que a una óptima efectividad en los planteamientos de las actuaciones preparatorias para poder establecer la definición de requerimientos genera que las contrataciones públicas generen eficiencia

en los procesos, cumpliendo con lo expuesto por la Ley 30225, la cual establece que los requerimientos y procesos de observancia y formalismo obligatorios que se deben cumplir respecto a las contrataciones con el Estado en tanto la incidencia de estas contrataciones se refleja tanto en el sector público y privado, busca garantizar que las partes contratantes consigan el ejercicio de sus derechos y responsabilizarse de sus obligaciones asegurando la transparencia de sus actuaciones en beneficio de la sociedad

Fortaleciendo la administración de las adquisiciones en la contratación de obras públicas para que estén estrictamente relacionadas, que de tal manera que garanticen una efectiva prestación de servicios a la sociedad. Asimismo, se requiere que los planes y políticas del gobierno y de los organismos sean más estrictos y transparentes y que estén interconectados con los diversos programas y proyectos que transforman los planes y políticas en resultados para el bienestar de la comunidad. También, esta reforma se dirigió por la convicción de que la planificación del desarrollo fomenta las bases para el abordaje de los presupuestos anuales de las entidades, en base a ello la planificación de las adquisiciones sienta las bases para ejecutar el presupuesto.

En la tabla 10, se halló un índice de relación de 0.851 y una significancia menor al 1%, por lo que se puede decir que la dimensión entre el valor estimado y referencial tiene una relación muy alta y significativa con la contratación de obras públicas, por lo que se puede decir que establecer dentro de los procesos de contratación y planificación índices correctos de mercado para que los valores estimados y referenciales tengan una eficiente directa con la contratación de obras públicas evitando posibles desfalcos o actos de corrupción, ya que al establecer la realidad del valor de mercado las contrataciones se darán en base a la realidad, los datos hallados se vinculan con la investigación de, Vílchez et al (2020), quienes se evaluaron la observancia de los principios de eficiencia y eficacia en base al valor referencial y estimado, en cada uno de los expedientes seleccionados obteniendo como resultado que el nivel de desarrollo de eficiencia es de 72% constituyéndose en escala de medición como elevado

y en relación a la eficacia es degradado, por lo que resulta cuestionable el compromiso que realmente asume cada gestión en las diferentes etapas de encargatura en los que se inicia, continúa y concluye la obra en atención a que la repercusión de la ejecución de cada obra recae en la población,

En la Tabla 11, se halló un índice de relación de 0.702 y una significancia menor al 1%, por lo tanto, podemos afirmar que la dimensión método de contratación tiene una relación alta y significativa con la contratación de obras públicas, por lo que se puede decir que establecer un correcto método de contratación para cualquier establecimiento de los procesos de contratación de obras públicas, harán que la planificación, organización de procesos y cualquier otro que se requiera pueda verificar los parámetros de eficacia que se requiere, los datos hallados se relacionan con la investigación de, Álvarez (2020) quien explica desde la doctrina e interpretación jurídica de la normativa respecto a los métodos de contratación en base a su observancia y funcionamiento de la contratación pública, empleándose para ello el método de la interpretación hermenéutica en la confrontación de las normas de principios de transparencia y eficiencia de la contratación estatal sobre el contexto de la emergencia sanitaria; obteniendo como resultado que en dicho contexto se infringió totalmente la contratación como un medio de ejecución del presupuesto, que facilitaba la regulación y el uso de recursos en beneficio a la población en tanto se inobservo los principios de transparencia en contrataciones expuestas como fraudulentas y en las que sobreestimo precios ocasionando el aprovechamiento indebido de los recursos públicos con la afectación a la ciudadanía tomando en cuenta que ejecutar correctamente estos estamentos evitara los actos de corrupción y falta de control en las contrataciones públicas realizadas en el contexto de las contratación de obras públicas para no vulnerar el principio de transparencia como un principio fundamental en la adquisición de bienes cuyo beneficio resultante sería para la sociedad afectada en sobremanera.

VI. CONCLUSIONES

- Primera. Las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas de una municipalidad provincial, 2022, existe una relación muy elevada y significativa en el valor de $Rho= 0.887$, por lo que se puede decir que a una mejor eficiencia en las actuaciones preparatorias la eficiencia para la contratación pública de obras será mayor.
- Segunda. Los requerimientos de las actuaciones preparatorias y la contratación de obras públicas de una municipalidad provincial, 2022, hay una conexión elevada y significativa en el valor de $Rho= 0.818$, por ello se puede afirmar que a una óptima eficiencia en los requerimientos de las actuaciones preparatorias la eficiencia en la contratación pública de obras será mayor.
- Tercera. El valor estimado y referencial de las actuaciones preparatorias y la contratación pública de obras de una municipalidad provincial, 2022, existe una relación muy alta y significativa en el valor de $Rho= 0.851$, por lo que se puede afirmar que a una óptima eficiencia en la definición del valor estimado y referencial de las actuaciones preparatorias la eficiencia en la contratación públicas de obras será mayor.
- Cuarta. El método de contratación de las actuaciones preparatorias y la contratación pública de obras de una municipalidad provincial, 2022, existe una relación alta y significativa en el valor de $Rho= 0.702$, por lo que se puede afirmar que a una óptima eficiencia en la definición del valor estimado y referencial de las actuaciones preparatorias la eficiencia en la contratación de obras públicas será mayor.

VII. RECOMENDACIONES

- Primera. Al jefe de logística establecer parámetros de capacitación entorno a la ley de contrataciones para poder generar un índice de mayor eficiencia en la ejecución de las actuaciones preparatorias generando una mayor eficiencia en la definición de lineamientos en la contratación de obras públicas.
- Segunda. Al jefe de planeamiento y presupuesto establecer una distribución y verificación para que las unidades puedan plantear un diagnóstico adecuado para la formulación de los requerimientos.
- Tercera. Al jefe de la OCI, establecer parámetros de control interno en el integro de los procedimientos de contratación pública de obras para poder establecer una verificación del valor referencial y estimado con el fin de plantear mayores ejecuciones con el presupuesto justo.
- Cuarta. A los futuros investigadores tomar en consideración la presente investigación con el fin de poder plantear parámetros de mayor evaluación en los procesos y ahondar de manera cualitativa diferentes problemáticas.

REFERENCIAS

- Álvarez, M. (2020). *Public procurement in Ecuador around the health emergency*. *Revista digital de Ciencia, Tecnología e Innovación* ISSN 1390-9150. pp. 1089-1098. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/8298062.pdf>
- Arias, J., Ángel, M. y Miranda, M. (2016). *El protocolo de investigación III: la población de estudio*.
https://www.researchgate.net/publication/303086670_The_research_protocol_III_Study_population
- Bhandari, P. (2021). *An introduction to correlational research*.
<https://www.scribbr.com/methodology/correlational-research/>
- Caballero, A. (2017). *Hacia el mejoramiento de la compra pública en el ministerio de Defensa Nacional a través del acuerdo marco de precio de intendencia*.
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/790/JIA-spa-2017-Hacia_el_mejoramiento_de_la_compra_publica_en_el_Ministerio_de_Defensa_Nacional.pdf;jsessionid=701B170D195307F98272B518425ABA28?sequence=1
- Cabezas, E., Andrade, D. y Torres, J. (2018). *Introducción a la metodología de la investigación científica*.
<http://repositorio.espe.edu.ec/jspui/bitstream/21000/15424/1/Introduccion%20a%20la%20Metodologia%20de%20la%20investigacion%20cientifica.pdf>
- Carhuancho, L. (2018). *Análisis de la contratación pública en una institución del Estado, Lima 2018*.
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20367/Carhuancho_MLE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- CONCYTEC (2020). *Guía práctica para la formulación y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo (I+D)*.
http://www.untels.edu.pe/documentos/2020_09/2020.09.22_formuacionProyectos.pdf

- Cretu, C. y Bienkowska, E. (2018). *Public procurement guidance for practitioners, on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds*. ISBN 978-92-79-77536-9. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_en.pdf
- Cruzado, M. (2021). *Formulación del requerimiento en la contratación de obras públicas en el Gobierno Regional de La Libertad, 2020*. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/69220/Cruzado_DM-F-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Garay, C. (2020). *Técnicas e instrumentos para la recolección de datos*. <https://crubocas.up.ac.pa/sites/crubocas/files/2020-07/3%20M%C3%B3dulo%2C%20%2C%20EVIN%20300.pdf>
- Hernández, R. y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. <http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/handle/54000/1292>
- Hernández, Z. (2018). *Control simultaneo al inspector o supervisor de obras públicas ejecutadas por contrata*. https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2343/Zoila_Tesis_Maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ley N° 30225, *Ley de contrataciones del estado*. Decreto Supremo N°082-2019-EF. <https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0022/tuo-ley-30225.pdf>
- Macías, J., Barcos, I. y Burbano, C. (2021). *Analysis of public procurement in emergency situations. Impact of COVID-19*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000500027&script=sci_arttext
- Marinelli, M. y Antoniou, F. (2019). *Improving public works' value for money: a new procurement strategy*. https://www.researchgate.net/publication/333056310_Improving_public_works'_value_for_money_a_new_procurement_strategy

- Mata, L. (2019). *El enfoque cuantitativo de investigación*. <https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cuantitativo-de-investigacion/>
- Mendoza, M. y Susanivar, J. (2021). *Los actos preparatorios y su influencia en el proceso de contratación del servicio de alimentación del hospital de emergencias Villa el Salvador (Heves), en el periodo de enero a mayo 2020*. [https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/4780/M.Mendoza J.Susanivar Trabajo de Investigacion Maestria 2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/4780/M.Mendoza%20J.Susanivar%20Trabajo%20de%20Investigacion%20Maestria%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Moreno, E. (2017). *Metodología de investigación pautas para hacer tesis: Que es la validez en una investigación de tesis*. <https://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2017/06/que-es-la-validez-en-una-investigacion.html>
- Quero, M. (2010). *Confiableabilidad y coeficiente Alpha de Cronbach*. <https://www.redalyc.org/pdf/993/99315569010.pdf>
- Quispe, H., Mujica, Y., Constantina, M. y Mayuri, C. (2022). *Presupuesto participativo y gestión del gasto público*. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131446879&doi=10.31876%2frcs.v28i.38163&origin=inward&txGid=7bff747c339afd0391c94f59d839d769>
- Ramos, J. (2019). *Análisis de las actuaciones preparatorias en el procedimiento de contratación de la Oficina de Abastecimiento de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Miraflores, 2018*. [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39324/Ramos TJ..pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39324/Ramos_TJ..pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Ruíz, S. y Delgado, J. (2020). *El control interno en el proceso de contrataciones en las instituciones públicas. Ciencia Latina Revista Multidisciplinar*. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/159>
- Rumín, Y. (2020). *Formulación de requerimiento y el proceso de contratación de bienes y servicios en el hospital de Huaycán Ate 2019*.

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/56928/Rum%3%adn_SY-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sordo, A. (2021). *Recolección de datos: métodos, técnicas e instrumentos*.

<https://blog.hubspot.es/marketing/recoleccion-de-datos>

Vílchez, M., Collazos, M., Heredia, F. y Sotomayor, G. (2020). *Evaluación de la eficiencia y eficacia en la contratación de obras mediante licitación pública en el gobierno regional Lambayeque, 2017-2019*.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000300253

Villamizar, J., Delgado J. y Bayona, C. (2018). *Principios de igualdad, libre competencia y selección objetiva en la contratación estatal*.

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/lux_praxis/article/download/7041/6211/17215

Viscarra, O. (2021). *Evolución histórica de la contratación pública en el Ecuador y su vinculación con la planificación nacional*.

<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7865/1/T3403-MDCP-Viscarra-Evolucion.pdf>

ANEXOS

Anexo 01: Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES E INDICADORES				
Problema General	Objetivo Específico	Hipótesis General	VARIABLE: ACTOS PREPARATORIOS				
			Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escalas	Niveles y Rangos
¿Cuál es la relación que existe entre las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022?	Determinar la relación que existe entre las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.	Existe relación significativa entre las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.	Requerimiento	- Especificaciones Técnicas - TDR - Expedientes - Requisitos - Finalidad - Obligaciones	1, 2, 3, 4, 5, 6	Escala de Likert: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi Nunca (2), Nunca (1)	Eficiente Regular Deficiente
Problema Específico 1	Objetivo Específico 1	Hipótesis Específica 1	Valor Estimado y Referencial	- Indagaciones - Revisión - Componentes - Pluralidad - Maximización - Antigüedad de - Monto - Monto - Precio Unitario - Verificación - Presupuesto - Plazos	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17		
¿Cuál es la relación que existe entre los requerimientos en las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022?	Determinar la relación que existe entre los requerimientos de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.	Existe relación significativa entre los requerimientos de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.					
Problema Específico 2	Objetivo Específico 2	Hipótesis Específica 2	Método de Contratación	- Suma Alzada, Precios Unitarios, Modalidad Mixta,	18, 19		
¿Cuál es la relación que existe entre el valor	Determinar la relación que existe entre el valor	Existe relación significativa entre el valor estimado y					

estimado y referencial de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022?	estimado y referencias de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.	referencias de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.		Tarifas Honorarios. - Contratación de Llave en Mano			
Problema Específico 3	Objetivo Específico 3	Hipótesis Específica 3	VARIABLE: CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
¿Cuál es la relación que existe entre el método de contratación de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022?	Determinar la relación que existe entre el método de contratación de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.	Existe relación significativa entre el método de contratación de las actuaciones preparatorias y contratación de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.	Planificación	- PAC - Presupuesto - Especificaciones - TDR - Certificación	20, 21, 22, 23, 24	Escala de Likert: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi Nunca (2), Nunca (1)	Eficiente Regular Deficiente
			Organización del Proceso	- Concurrencia - Buena Pro de Solicitudes de Apelación - Consentimiento de Proceso de Anulación	25, 26, 27, 28, 29		
			Contratación	- Tiempo establecido - Adicional de Obra de Ampliación de Plazo - Actas - Obras - Convenios	30, 31, 32, 33, 34, 35		

Anexo 02: Operacionalización de variables

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición
Variable 1: Actuaciones Preparatorias	Según la Ley 30225, son las actividades establecidas cuando las áreas usuarias requieren un bien, servicio o ejecución de alguna obra, elaborando requerimientos para poder establecer los términos de referencia, en base a los expedientes técnicos y requisitos para establecer el fin público, tomando en cuenta que las contrataciones deben ser orientados a cumplir con los lineamientos de valor estima y referencial descrita por el área de contrataciones.	Es la ejecución de un cuestionario válido y confiable, el cual estuvo construido tomando en cuenta los indicadores y dimensiones de la presente investigación, tomando datos de la valoración de la muestra participante.	Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Especificaciones Técnicas - TDR - Expedientes - Requisitos - Finalidad - Obligaciones 	Ordinal tipo Likert Opciones de Respuesta: Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca Niveles de escala: Eficiente Regular Deficiente
			Valor Estimado y Referencial	<ul style="list-style-type: none"> - Indagaciones - Revisión - Componentes - Pluralidad - Maximización - Antigüedad del Monto - Precio Unitario - Verificación - Presupuesto - Plazos 	
			Método de Contratación	<ul style="list-style-type: none"> - Suma alzada, Precios Unitarios, Modalidad Mixta, Tarifas y Honorarios - Contratación de Llave en Mano 	

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición
Variable 2: Contratación de Obras Públicas	Son los procesos de contratación que las entidades públicas realizan para que una empresa privada que cuente con los requerimientos del rubro, para poder responder a los lineamientos de planificación, organización del proceso para que ellos puedan ejecutar la obra. (Marianelli y Antoniou, 2019).	Es la ejecución de un cuestionario válido y confiable, el cual estuvo construido tomando en cuenta los indicadores y dimensiones de la presente investigación, tomando datos de la valoración de la muestra participante.	Planificación	<ul style="list-style-type: none"> - PAC - Presupuesto - Especificaciones - TDR - Certificación 	Ordinal tipo Likert Opciones de Respuesta: Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca Niveles de escala: Eficiente Regular Deficiente
			Organización del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Concurrencia - Buena Pro - Solicitudes de Apelación - Consentimiento - Proceso de Anulación 	
			Contratación	<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo establecido - Adicional de Obra - Ampliación de Plazo - Actas - Obras - Convenios 	

Anexo 03: Cuestionario actuaciones preparatorias

Instrucciones: El presente cuestionario que tiene como finalidad adquirir o recabar información de acuerdo a la apreciación del funcionario con respecto a las preguntas elaboradas correspondiente a las actuaciones preparatorias.

Responda usted con veracidad, las respuestas servirán para nuestra investigación que se realiza con el fin de proponer una mejora.

Marca con (X) tu respuesta de acuerdo a tu opinión.

A continuación, se le pide marcar con un aspa X para cada una de las afirmaciones en la siguiente tabla señalando según la siguiente escala valorativa:

1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4= Casi siempre, 5 = Siempre

ÍTEMS O PREGUNTAS	ESCALA DE VALORACIÓN				
	N	CN	AV	CS	S
DIMENSIÓN: Requerimiento					
1. Las especificaciones técnicas planteadas se adecuan al cumplimiento de expectativas de los requerimientos de cada unidad					
2. Los términos de referencia son descritos en base a criterios de la realidad					
3. Los expedientes técnicos de obra contemplan todos los requisitos exigidos por la normativa vigente					
4. Los requisitos de calificación de los procedimientos de selección guardan relación con el objeto de contratación.					
5. La elaboración de los requerimientos en los procedimientos de selección establecen y se alinean con la finalidad pública para el logro de objetivos institucionales.					
6. Los procedimientos establecen criterios correctos de obligatoriedad de levantamiento de las observaciones dadas en los procesos de selección.					

DIMENSIÓN: Valor estimado y referencial					
7. La indagación de mercado para determinar el valor estimado se realiza siguiendo la normativa vigente.					
8. Se revisa continuamente la información existente sobre adquisiciones referentes al objeto de contratación.					
9. El valor comprende todos los componentes o rubros aplicables al mercado específico.					
10. Existe pluralidad de marcas y postores.					
11. Los procedimientos de selección se realizan para maximizar el valor de los recursos públicos.					
12. Crees en la veracidad de la actualización de los valores referenciales presentados.					
13. En el caso de ejecución de obras el valor referencial corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra.					
14. Se analizan eficientemente los precios unitarios para determinar las mejores propuestas.					
15. Se verifican los requerimientos para establecer correctos procedimientos de selección					
16. Se determinan una correcta definición del presupuesto planteado para la determinación del valor referencial.					
17. Se respeta los plazos para la presentación de propuestas.					

DIMENSIÓN: Sistema y modalidad de contratación					
18. Las contrataciones mediante suma alzada, precios unitarios, Modalidad mixta, tarifas y porcentaje establecen criterios para una eficiente obtención del bien o servicio.					
19. Las contrataciones bajo la modalidad de llave en mano y/o concurso oferta cuentan con los estamentos o lineamientos para determinar una eficiencia en la verificación del control del gasto público.					

<i>Medición de la variable actuaciones preparatorias</i>	
Técnica	Encuesta
Instrumento	Cuestionario
Autor Original	Rebaza Merino, Anita Emilia
Autor(a)	Salazar Moreno, Jesús Enrique
Ámbito de aplicación	Funcionario de una municipalidad provincial, 2022.
Muestra	53 funcionarios de una municipalidad provincial, 2022.
Tiempo de aplicación	40 minutos
Administración	Directa e individual
Objetivo	Determinar la relación que existe entre las actuaciones preparatorias y las contrataciones de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.
Dimensiones	Requerimiento, valor estimado y referencial y método de contratación.
Evalúa	Escala de Likert (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre

Anexo 04: Cuestionario contratación de obras públicas

Instrucciones: El presente cuestionario que tiene como finalidad adquirir o recabar información de acuerdo a la apreciación del funcionario con respecto a las preguntas elaboradas correspondiente contratación de obras públicas.

Responda usted con veracidad, las respuestas servirán para nuestra investigación que se realiza con el fin de proponer una mejora.

Marca con (X) tu respuesta de acuerdo a tu opinión.

A continuación, se le pide marcar con un aspa X para cada una de las afirmaciones en la siguiente tabla señalando según la siguiente escala valorativa:

1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4= Casi siempre, 5 = Siempre

PREGUNTA	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	A VECES	CASI NUNCA	NUNCA
DIMENSIÓN: Planificación					
1. El Requerimiento cuenta con el documento del Plan Anual de Contrataciones.					
2. Presenta Expediente Técnico de obra visado y aprobado					
3. Las especificaciones técnicas y términos de referencia están de acorde a lo solicitado.					
4. Los precios del Expediente Técnico están de acorde al mercado actual.					
5. El Certificado de disponibilidad presupuestal se aprobó mediante los procedimientos enmarcados en la entidad					
6. El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren					
DIMENSIÓN: Organización del proceso					
7. Se utiliza todos los medios de propagación de publicación a fin de que los proveedores puedan tener conocimiento de la convocatoria del procedimiento de selección.					
8. En el registro de participantes se aplica la libertad de concurrencia					

9. El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica a través del SEACE, el mismo día de su realización					
10. En el expediente no existe un proceso de Recurso de Apelación					
11. Se publica el consentimiento de la Buena Pro en el SEACE					
12. El proceso se cancela cuando no se perfecciona el contrato					
DIMENSIÓN: Contratación					
13. Ejecución de la obra dentro del plazo previsto en el calendario de avance de obra.					
14. En el expediente se encuentra adicionales de obra					
15. En el expediente se encuentra ampliaciones de plazo.					
16. Acta de Recepción de Obra dando cumplimiento a lo establecido en el contrato.					
17. Se llega a la Liquidación de la obra debidamente sustentada					
18. El expediente sin solicitud da inicio a Arbitraje					

Medición de la variable contratación de obras públicas	
Técnica	Encuesta
Instrumento	Cuestionario
Autor Original	Chalco Sánchez, Rudy Angélica
Autor(a)	Salazar Moreno, Jesús Enrique
Ámbito de aplicación	Funcionario de una municipalidad provincial, 2022.
Muestra	53 funcionarios de una municipalidad provincial, 2022.
Tiempo de aplicación	40 minutos
Administración	Directa e individual
Objetivo	Determinar la relación que existe entre las actuaciones preparatorias y las contrataciones de obras públicas en una municipalidad provincial, 2022.
Dimensiones	Planificación, Organización del Proceso, Contratación.
Evalúa	Escala de Likert (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para evaluar las Actuaciones preparatorias.

DIRIGIDO A: Servidores civiles de una Municipalidad Provincial.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dr. Yache Cuenca Eduardo Javier.

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.

VALORACIÓN:

ALTO	MEDIO	BAJO
-----------------	-------	------



FIRMA DEL EVALUADOR

DNI: 41645161

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para evaluar la contratación de obras públicas.


DIRIGIDO A: Servidores civiles de una Municipalidad Provincial.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dr. Yache Cuenca Eduardo Javier.

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.

VALORACIÓN:

ALTO	MEDIO	BAJO
-----------------	-------	------



FIRMA DEL EVALUADOR

DNI: 41645161

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para evaluar el nivel de actuaciones preparatorias

DIRIGIDO A: Servidores civiles de una municipalidad provincial

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Ms. Sanchez Rosales, Carlos Alberto

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Maestro Gestión PÚBLICA

VALORACIÓN:

ALTO	MEDIO	BAJO
-----------------	-------	------



Ms. Ing. Carlos A. Sánchez Rosales
GERENTE GENERAL
FIRMA DEL EVALUADOR
DNI: 47404819

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para evaluar el nivel de contratación de obras públicas

DIRIGIDO A: Servidores civiles de una municipalidad provincial

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Ms. Sanchez Rosales, Carlos Alberto

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Maestro Gestión PÚBLICA

VALORACIÓN:

ALTO	MEDIO	BAJO
-----------------	-------	------



Ms. Ing. Carlos A. Sánchez Rosales
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FIRMA DEL EVALUADOR

DNI: 47404819

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para evaluar el nivel actuaciones preparatorias


DIRIGIDO A: Servidores civiles de una municipalidad provincial

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Ms. Torres Solano, Betsabe

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Maestro Gestión PÚBLICA

VALORACIÓN:

ALTO	MEDIO	BAJO
-----------------	-------	------


.....
Mg. Econ. Betsabe Torres Solano
CELL 1945

FIRMA DEL EVALUADOR

FIRMA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para evaluar la contratación de obras públicas


DIRIGIDO A: Servidores civiles de una municipalidad provincial

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Ms. Torres Solano, Betsabe

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Maestra Gestión PÚBLICA

VALORACIÓN:

ALTO	MEDIO	BAJO
-----------------	-------	------



Mg. Econ. Betsabe Torres Solano
CELL. 1945

FIRMA DEL EVALUADOR

FIRMA

Anexo 06: Confiabilidad

Cuestionario actuaciones preparatorias

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	15	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	15	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,879	23

Cuestionario contratación de obras públicas

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	15	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	15	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,927	22

Anexo 07: Base de datos prueba piloto

N°	P1	P2	P3	P4	P5	P6	D1	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	D2	P18	P19	D4
E1	5	5	4	3	4	4	25	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	51	5	5	10
E2	5	3	4	2	3	4	21	5	4	3	3	5	4	3	5	3	4	5	44	4	3	7
E3	5	4	5	5	5	5	29	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	52	4	5	9
E4	3	4	3	3	3	4	20	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	38	3	4	7
E5	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	10
E6	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	4	8
E7	4	4	5	4	5	5	27	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	4	5	9
E8	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	4	5	9
E9	4	4	4	4	4	5	25	4	3	3	3	5	5	5	5	3	5	4	45	3	3	6
E10	5	5	5	5	5	5	30	5	1	1	5	4	5	5	4	4	5	5	44	1	1	2
E11	4	5	5	5	3	5	27	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	52	5	5	10
E12	4	4	4	3	4	5	24	4	4	4	3	5	4	5	4	4	5	4	46	4	4	8
E13	5	5	4	4	4	4	26	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	47	4	4	8
E14	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	54	5	5	10
E15	5	3	5	4	4	3	24	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	35	3	3	6

N°	P1	P2	P3	P4	P5	P6	D1	P7	P8	P9	P10	P11	P12	D2	P13	P14	P15	P16	P17	P18	D3
E1	4	4	4	5	5	5	27	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	30
E2	4	3	3	3	3	3	19	2	3	4	3	4	4	20	4	3	4	3	4	3	21
E3	5	5	4	5	4	4	27	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	4	4	5	27
E4	5	5	4	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
E5	4	5	4	4	5	5	27	5	5	5	4	5	4	28	4	4	5	5	5	5	28
E6	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
E7	5	3	5	3	3	3	22	3	3	4	3	3	4	20	4	3	4	2	3	3	19
E8	5	5	5	4	5	3	27	5	5	4	4	3	4	25	5	5	4	4	4	4	26
E9	5	5	5	4	4	4	27	4	4	3	4	5	4	24	4	3	3	3	4	4	21
E10	5	4	5	4	4	4	26	4	4	5	4	5	4	26	4	4	5	4	3	2	22
E11	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
E12	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	4	4	28
E13	3	3	3	4	4	3	20	3	4	5	4	3	4	23	3	4	5	3	3	5	23
E14	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
E15	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30

Anexo 08: Base de datos actuaciones preparatorias

N°	P1	P2	P3	P4	P5	P6	D1	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	D2	P18	P19	D3	V1
E1	3	3	3	4	2	2	17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2	2	4	43
E2	4	4	3	4	4	3	22	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	37	3	4	7	66
E3	3	4	2	5	4	4	22	4	3	3	3	4	3	3	4	4	5	5	41	4	4	8	71
E4	3	3	3	4	2	3	18	3	3	2	2	3	3	2	2	1	4	3	28	3	3	6	52
E5	3	3	3	3	2	3	17	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	26	2	2	4	47
E6	2	3	3	3	2	3	16	2	2	3	3	4	3	3	3	2	2	3	30	3	3	6	52
E7	4	3	3	2	2	2	16	2	2	2	3	3	3	3	2	1	2	2	25	2	2	4	45
E8	3	3	3	4	4	4	21	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	4	4	8	72
E9	2	5	2	4	1	3	17	3	3	2	3	3	3	3	5	1	3	3	32	1	1	2	51
E10	5	5	4	3	4	4	25	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	51	5	5	10	86
E11	5	3	4	2	3	4	21	5	4	3	3	5	4	3	5	3	4	5	44	4	3	7	72
E12	5	4	5	5	5	5	29	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	52	4	5	9	90
E13	3	4	3	3	3	4	20	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	38	3	4	7	65
E14	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	10	95
E15	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	4	8	76
E16	4	4	5	4	5	5	27	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	4	5	9	90
E17	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	4	5	9	93
E18	4	4	4	4	4	5	25	4	3	3	3	5	5	5	5	3	5	4	45	3	3	6	76
E19	5	5	5	5	5	5	30	5	1	1	5	4	5	5	4	4	5	5	44	1	1	2	76
E20	4	5	5	5	3	5	27	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	52	5	5	10	89
E21	4	4	4	3	4	5	24	4	4	4	3	5	4	5	4	4	5	4	46	4	4	8	78
E22	5	5	4	4	4	4	26	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	47	4	4	8	81
E23	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	54	5	5	10	94
E24	5	3	5	4	4	3	24	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	35	3	3	6	65
E25	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	10	95
E26	5	4	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	10	94
E27	4	4	4	3	4	4	23	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	46	4	4	8	77

E28	5	5	4	4	4	4	26	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	51	4	5	9	86
E29	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	10	95
E30	3	4	2	3	2	5	19	5	4	4	4	5	3	5	4	4	5	5	48	4	4	8	75
E31	3	4	3	4	4	4	22	5	3	3	3	4	4	3	4	4	4	5	42	3	3	6	70
E32	3	4	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	4	8	75
E33	5	4	4	4	4	5	26	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	48	4	5	9	83
E34	3	4	4	3	3	3	20	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	35	4	3	7	62
E35	5	4	5	4	4	5	27	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	50	5	5	10	87
E36	4	4	4	5	4	5	26	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	48	4	5	9	83
E37	4	5	4	4	3	5	25	5	3	4	4	5	3	4	5	3	5	5	46	3	4	7	78
E38	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	52	3	3	6	88
E39	4	5	4	5	5	5	28	4	3	5	5	5	3	5	5	3	5	5	48	5	5	10	86
E40	5	4	4	4	4	5	26	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	51	5	5	10	87
E41	4	5	5	5	5	5	29	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3	3	49	4	4	8	86
E42	5	5	5	4	2	5	26	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	54	4	5	9	89
E43	5	5	5	5	3	5	28	5	5	5	5	4	5	5	4	3	5	5	51	5	5	10	89
E44	3	3	4	4	4	5	23	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	52	3	5	8	83
E45	4	3	5	5	5	5	27	4	5	5	4	4	4	3	3	3	4	4	43	4	3	7	77
E46	4	4	4	4	3	5	24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	53	4	4	8	85
E47	5	5	4	5	4	5	28	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	45	4	5	9	82
E48	3	4	5	5	2	5	24	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	3	46	3	3	6	76
E49	5	4	3	3	1	4	20	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	51	5	4	9	80
E50	5	5	4	5	2	4	25	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	4	50	4	4	8	83
E51	4	4	5	5	4	3	25	4	3	3	3	4	5	4	5	5	5	5	46	3	4	7	78
E52	5	5	5	4	4	4	27	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	53	5	5	10	90
E53	5	5	4	4	4	5	27	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	51	3	5	8	86

Anexo 09: Base de datos la contratación de obras públicas

N°	P1	P2	P3	P4	P5	P6	D1	P7	P8	P9	P10	P11	P12	D2	P13	P14	P15	P16	P17	P18	D3	V2
E1	3	3	2	3	2	4	17	2	4	2	5	3	3	19	3	3	3	3	3	2	17	53
E2	3	4	4	3	4	4	22	2	4	4	4	2	4	20	3	4	4	4	4	3	22	64
E3	4	4	4	3	4	1	20	2	2	4	5	4	4	21	3	4	5	4	4	2	22	63
E4	3	3	4	2	4	2	18	3	4	3	4	3	4	21	4	4	3	3	4	2	20	59
E5	3	3	3	3	2	2	16	3	3	3	4	3	3	19	3	3	3	2	3	3	17	52
E6	3	3	2	3	3	2	16	3	4	3	5	3	3	21	4	4	3	3	3	3	20	57
E7	3	2	2	2	2	2	13	2	3	3	4	1	2	15	2	3	2	2	3	2	14	42
E8	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	72
E9	3	3	3	3	4	3	19	3	4	3	4	3	3	20	3	3	3	3	2	2	16	55
E10	4	4	5	4	4	5	26	4	5	5	4	4	5	27	5	4	5	5	4	5	28	81
E11	3	4	3	3	3	3	19	4	3	5	3	5	4	24	5	4	5	4	4	5	27	70
E12	4	4	4	5	5	5	27	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	30	86
E13	4	3	3	3	3	3	19	2	3	4	3	4	4	20	4	3	4	3	4	3	21	60
E14	5	5	4	5	4	4	27	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	4	4	5	27	83
E15	5	5	4	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	74
E16	4	5	4	4	5	5	27	5	5	5	4	5	4	28	4	4	5	5	5	5	28	83
E17	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	89
E18	5	3	5	3	3	3	22	3	3	4	3	3	4	20	4	3	4	2	3	3	19	61
E19	5	5	5	4	5	3	27	5	5	4	4	3	4	25	5	5	4	4	4	4	26	78
E20	5	5	5	4	4	4	27	4	4	3	4	5	4	24	4	3	3	3	4	4	21	72
E21	5	4	5	4	4	4	26	4	4	5	4	5	4	26	4	4	5	4	3	2	22	74
E22	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	72
E23	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	4	4	28	88
E24	3	3	3	4	4	3	20	3	4	5	4	3	4	23	3	4	5	3	3	5	23	66
E25	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	90
E26	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	90
E27	5	5	4	5	4	4	27	4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	4	4	4	24	76
E28	5	4	5	4	5	3	26	3	4	4	4	5	4	24	4	4	4	4	4	5	25	75
E29	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	90

E30	5	3	3	3	4	4	22	3	3	4	3	3	3	19	4	5	4	4	4	4	25	66
E31	4	4	4	3	4	3	22	3	3	4	3	4	3	20	3	4	4	4	3	3	21	63
E32	4	4	4	4	5	4	25	5	5	5	4	5	5	29	5	5	5	5	5	5	30	84
E33	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	4	25	73
E34	3	3	4	3	4	3	20	4	4	3	3	3	4	21	3	3	3	4	4	4	21	62
E35	4	4	5	5	5	5	28	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5	5	5	5	30	86
E36	5	4	4	4	4	4	25	4	4	5	4	4	4	25	4	4	5	4	4	4	25	75
E37	5	3	5	4	4	4	25	4	4	5	4	4	4	25	4	4	5	4	4	5	26	76
E38	5	4	5	4	5	5	28	5	5	5	4	5	5	29	5	5	5	5	5	5	30	87
E39	5	5	5	4	5	5	29	4	4	5	4	5	5	27	4	5	5	3	4	5	26	82
E40	5	4	4	4	5	5	27	4	4	5	4	4	5	26	5	4	5	4	5	5	28	81
E41	5	4	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	5	30	4	5	5	4	5	5	28	87
E42	5	5	5	5	4	4	28	5	5	4	5	5	5	29	5	5	5	4	5	5	29	86
E43	4	4	4	4	4	5	25	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	4	5	4	28	83
E44	4	5	5	5	4	5	28	5	5	3	5	4	3	25	4	4	4	5	5	4	26	79
E45	5	5	5	5	4	5	29	4	4	4	3	4	4	23	4	5	5	4	4	3	25	77
E46	3	3	4	4	3	4	21	4	4	4	4	5	5	26	5	5	5	5	5	5	30	77
E47	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	5	2	3	23	2	3	3	4	4	4	20	67
E48	5	5	5	5	4	3	27	4	3	3	3	3	4	20	4	4	3	5	5	4	25	72
E49	4	4	5	4	3	3	23	5	5	5	4	4	4	27	4	4	4	5	5	4	26	76
E50	3	5	3	4	5	5	25	5	4	4	4	4	4	25	4	5	5	5	4	3	26	76
E51	4	4	5	5	3	5	26	5	5	3	4	4	3	24	3	3	4	5	5	1	21	71
E52	5	4	5	4	5	5	28	5	5	5	5	5	4	29	4	5	4	5	5	5	28	85
E53	4	4	4	4	5	5	26	5	5	3	5	4	5	27	4	5	5	5	4	4	27	80



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, EDWARDS JESUS AGUIRRE ESPINOZA, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis titulada: "Actuaciones Preparatorias y Contratación de Obras públicas en una Municipalidad Provincial – 2022", cuyo autor es SALAZAR MORENO JESUS ENRIQUE, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 12.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

TRUJILLO, 23 de Diciembre del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
EDWARDS JESUS AGUIRRE ESPINOZA DNI: 23854868 ORCID: 0000-0002-5514-6707	Firmado electrónicamente por: EDWARDSAE el 09- 01-2023 15:03:15

Código documento Trilce: TRI - 0499985
